

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

~~~~~  
Lavori di costruzione Case Popolari in Brindisi CEP -  
Lotto 13 Bis - Legge 21/4/1962, n°195 - Es. 1963/64 -  
Importo a base d'asta ..... L. 169.975.000.=  
IMPRESA: Ing. Vincenzo GRAVILI.=

=====

RELAZIONE SULLE RISERVE

In merito alla riserva dell'Impresa il sottoscritto  
Direttore dei Lavori fa presente di aver applicata la  
penale per ritardata ultimazione in quanto i lavori  
furono dichiarati ultimati dopo la scadenza del tem-  
po utile contrattuale.=

In effetti l'Impresa inizialmente condusse i lavori  
con la dovuta regolarità, ma successivamente rallen-  
tò il ritmo adducendo come scusante che la mancanza  
delle canalizzazioni idriche e fognanti induceva la  
Impresa per ragioni economiche, ad impostare l'orga-  
nizzazione di cantiere in maniera più lenta.=

Sta di fatto che i lavori vennero ultimati in ritar-  
do mentre potevano essere ultimati in tempo salvo la  
esecuzione delle opere connesse con gli allacciamenti.=

In conclusione, pertanto, in linea di diritto il  
sottoscritto Direttore dei Lavori è del parere che

la penale debba essere confermata.=

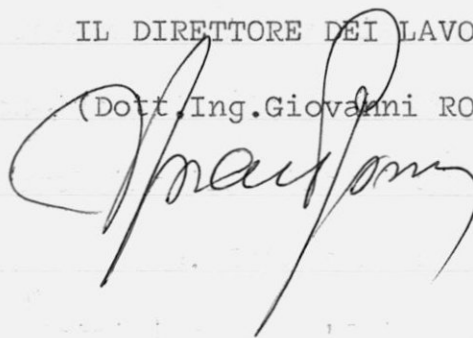
In linea di fatto e di equità il sottoscritto non può fare a meno di far presente che il ritardo non è stato pregiudizievole all'Amministrazione in quanto sia per la mancanza dei servizi sia, soprattutto, per l'entrata in vigore delle nuove norme sull'assegnazione, gli alloggi non potevano essere utilizzati subito.

L'immissione degli assegnatari, infatti è avvenuta nel Febbraio 1967.=

Brindisi, li 31/7/1967

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

A large, stylized handwritten signature in dark ink, likely belonging to Giovanni Roma, is written over the typed name.
