

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in
BRINDISI-Quartiere C.E.P.-Area B-c/154-BR.Alloggi
N° 42

IMPRESA : Ing.RUGGERO LECCISI-Brindisi

Importo a base d'asta.....L. 221.192.600

Importo netto del ribasso dell'6,86%...L. 206.018.788

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantasette il giorno sedici
del mese di ottobre nel Cantiere dei lavori suddetti.

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei
Lavori unitamente all'Impresa Ing.Ruggiero LECCISI

VISTO il contratto n.4769 del 9/7/1966 registrato a
Brindisi il 12/7/1966 al n.1277 Mod.1 :

VISTO il verbale di consegna in data 14/7/1966, che
fissava per il giorno 8 luglio 1967 il termine
per l'ultimazione dei lavori :

VISTO il verbale di sospensione dei lavori in data
3/7/1967 :

CONSIDERATO, che sono venute a cessare le cause che
avevano determinato la sospensione dei lavori.=


Il sottoscritto ha convenuto che i lavori si possono

riprendere.=

L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori, che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni sei: pertanto l'ultimazione definitiva dei lavori dovrà avvenire il giorno 21 ottobre 1967.=


Del che si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

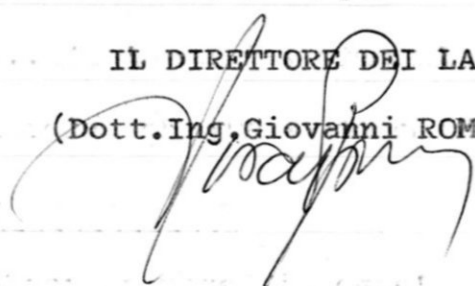

VISTO :



IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

