

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Legge 30/12/1960 n° 1676

Lavori di completamento attrezzature area alle abitazioni per lavoratori
agricoli dipendenti in BRINDISI Quartiere "LA ROSA 2"

Impresa CATANIA RANIERO & PASANO

5° STATO^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 5/9/1970 19

CONTRATTO in data 4/9/1969 n° 5271 approvato reg. a Brindisi il 5/9/1969

al n° 1738 ed atto aggiuntivo n° 5322 del 15/6/1970 reg. a Brindisi in

data 23/6/1970 al N. 1150 Mod. I

Importo del progetto a base d'asta L. 11.280.000=

Importo del contratto depurato dal ribasso in
 ragione del 2,75 per cento L. 10.969.800=

Perizia suppletiva al netto 5.000.000=

Fondo a disposizione dell'Amministrazione L. 3.051.800=

del quale impegnato	Per espropriazione L.	
	» mag. lav. impreved.	
	» lav. ad economia »	<u>2.075.000=</u>
	» sorvegli. e dir. »	<u>976.800=</u>
	TOTALE somma impegn. L.	<u>3.051.800=</u>

Data della consegna . . . 8/9/1969

Data dell'incominciamento dei lavori . . . 8/9/1969

Scadenza del tempo utile per l'ultim. dei lavori 3/7/1970

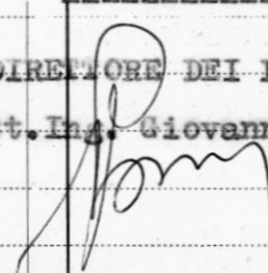
I lavori rimasero sospesi per gg. 96
 e prorogati per . . . 60

Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . . . 10/9/1970

Giorni impiegati in più .

» » meno .

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	10	Scavo a sezione ampia mc.	1.210,03	1.000=	1.210.030,00	
2	1	" " " ristretta "	307,47	1.320=	405.860,04	
3	7	Tubazione fogna Ø 150 ml.	483,95	1.320=	638.814,00	
4	8	Pozzetti d'ispezione n°	34	4.400=	149.600,00	
5	9	Chiusini per pozzetti Kg.	1.236,90	275=	340.147,50	
6	3	Cordoni calcari ml.	926,92	1.980=	1.835.301,60	
7	2	Basole calcare mq.	747,22	2.750=	2.054.855,00	
8	4	Massetto "	2.414,31	715=	1.726.231,65	
9	5	Pietrini "	2.414,31	1.100=	2.655.741,00	
10	NP3	Cordoncini per aiuole ml.	1.879,18	1.650=	3.100.647,00	
11	NP12	Impianto idrico "	551,90	2.000=	1.103.800,00	
12	NP1	Calcestruzzo a 200 mc.	34,74	9.350=	324.819,00	
13	NP7	Riparazione pluviali n°	40	2.300=	92.000,00	
Sommano					£ 15.637.846,79	
a detrarre il ribasso d'asta del 2,75 % "					430.040,78	
Restano nette.....					£ 15.207.806,01	
					=====	
					IL DIRETTORE DEI LAVORI	
					(Dott. Ing. Giovanni ROMA)	
						
					VISTO:	
					IL PRESIDENTE	
					(Grazia Conte U.G. VALLARINO)	
					
