

GESTIONE CASE PER LAVORATORI  
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----Cceg-----

- Lavori per opere di ripristino e com-  
pletamento alla Palazzina di Case per Lavoratori in  
S. Pietro Vernotico - Via Pola - Cant. n°6173/R

IMPRESA: MIACOLA Vito - BRINDISI -

Importo contrattuale . . . . . L. 2.835.780.=

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PREMESSA :

PERIZIA DI PROGETTO in data 16.6.1964 per l'ammonta-  
re di L.3.138.075.= di cui L.2.878.966,40 per lavori  
e L.259.108,60 per spese generali, redatto dall'Uf-  
ficie Tecnica dell'Istituto Autonomo per le Case Po-  
polari della Provincia di Brindisi ed approvato con  
delibera n.6 del 30.6.1964 del Consiglio di Ammini-  
strazione dell'I.A.C.P., Gestioni Speciali GESCAL  
per gli importi suddetti.

SOMME AUTORIZZATE :

a) Perizia di progetto L. 2.878.966.=

CONTRATTO in data 7.1.65 n.4509 registrato a Brindi-  
si il 13.1.1965 n.75 mod.I con il quale i lavori di  
che trattasi venivano affidati all'Impresa MIACOLA  
Vito per l'importo di L.2.835.780.=

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI: I lavori vennero consegnati all'Impresa il 18.1.65 come risulta dal relativo verbale in pari data.

TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI: i lavori dovevano essere ultimati entro il 17.4.65. Senonchè in data 26.2.65 i lavori venivano sospesi con regolare verbale di giorni 30 onde consentire la stagionatura del solaio dopo la gettata del medesimo. Infatti i lavori venivano ripresi in data 26.3.65 come risulta dal verbale in pari data e la nuova data di ultimazione dei lavori veniva fissata per il giorno 15.5.1965.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: è stata accertata il giorno 15.5.65 come risulta dal verbale in pari data e quindi in tempo utile.

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni della Direzione Lavori .

ASSICURAZIONE OPERAI: la Impresa ha assicurato i suoi operai presso l'INAIL di Brindisi con polizza n.13713/3 con decorrenza continuativa.

STATO FINALE DEI LAVORI: redatto in data 23.5.66 dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori è di nette L.2.623.824,78.

Poichè sono stati già pagati n.3 acconti per comples-

sive L.2.485.000, il credito dell'Impresa resta in L.138.824.= (diconsi lire centotrentottomilaottocentoventiquattro).

TUTTO CIO' PREMESSO

Il sottoscritto Direttore Tecnico dell' IACP nella visita effettuata il giorno 24.5.1966.

RICONOSCIUTO che i lavori furono eseguiti in conformità delle previsioni del progetto con i materiali richiesti, con le dimensioni prescritte e conformi alle prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni della Direzione dei Lavori;

VISTO che gli atti contabili sono stati compilati a norma del Regolamento 25.5.1895, n.350 e che i prezzi adottati sono quelli di contratto;

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;

CONSIDERATO che l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai ;

CONSIDERATO che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed agli ordini dati dalla Direzione dei Lavori;

C E R T I F I C A

che i lavori sopra menzionati sono stati regolarmente eseguiti, liquida secondo le risultanze del conto finale in L.2.623.824 l'importo dei lavori e poi-

chè all'Impresa sono state versate in acconto lire 2.485.000.


**D I C H I A R A**

pagabile all'Impresa MIACOLA VITO - BRINDISI, la somma di L.138.824=(diconsi lire centotrentottomilaottocentoventiquattro) a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori di che trattasi salvo la superiore approvazione del presente atto.

BRINDISI, li 25.5.1966.


**L'IMPRESA**

(Miacola Vito)



**IL DIRETTORE TECNICO IACP**

(Dr. Ing. Giovanni ROMA)

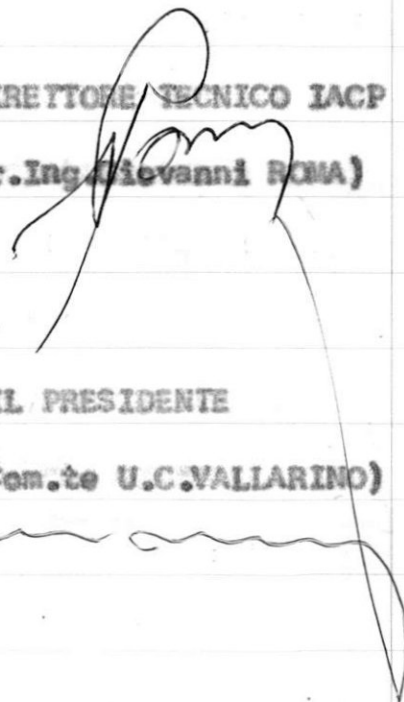

**Visto:**



**IL PRESIDENTE**

(Gr. Uff. Con. te U.C. VALLARINO)

