

COMUNE DI FASANO
provincia di BRINDISI
SCHEMA MONTAGGIO IMPALCATURA
"PIMUS D.lgs 81 del 09/04/2008"

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI
E.R.P. "LOTTO 16 VIA P. NENNI" - "LOTTI 22 E 23 VIA M.
PACUVIO" NEL COMUNE DI FASANO

TAVOLA 2/3

_ Schemi di montaggio impalcature esterne (per i primi due impalcati) -
prospetto scala 1:100

L'impalcatura non è soggetta a progettazione obbligatoria in quanto verrà
montata secondo schemi autorizzati dal costruttore ed avrà altezza inferiore
a 20 metri


COMMITTENTE: I.A.C.P.

ditta esecutrice:

VITALE FRANCESCO


via Circumvalazione Sud - Est
72013 Ceglie Messapica (Br)
c.f. VTL FNC 57D30 C424J

PROSPETTO SCHEMA DI MONTAGGIO IMPALCATURE
LATO A (LOTTO 16 - LOTTO 22 - LOTTO 23) scala 1:100

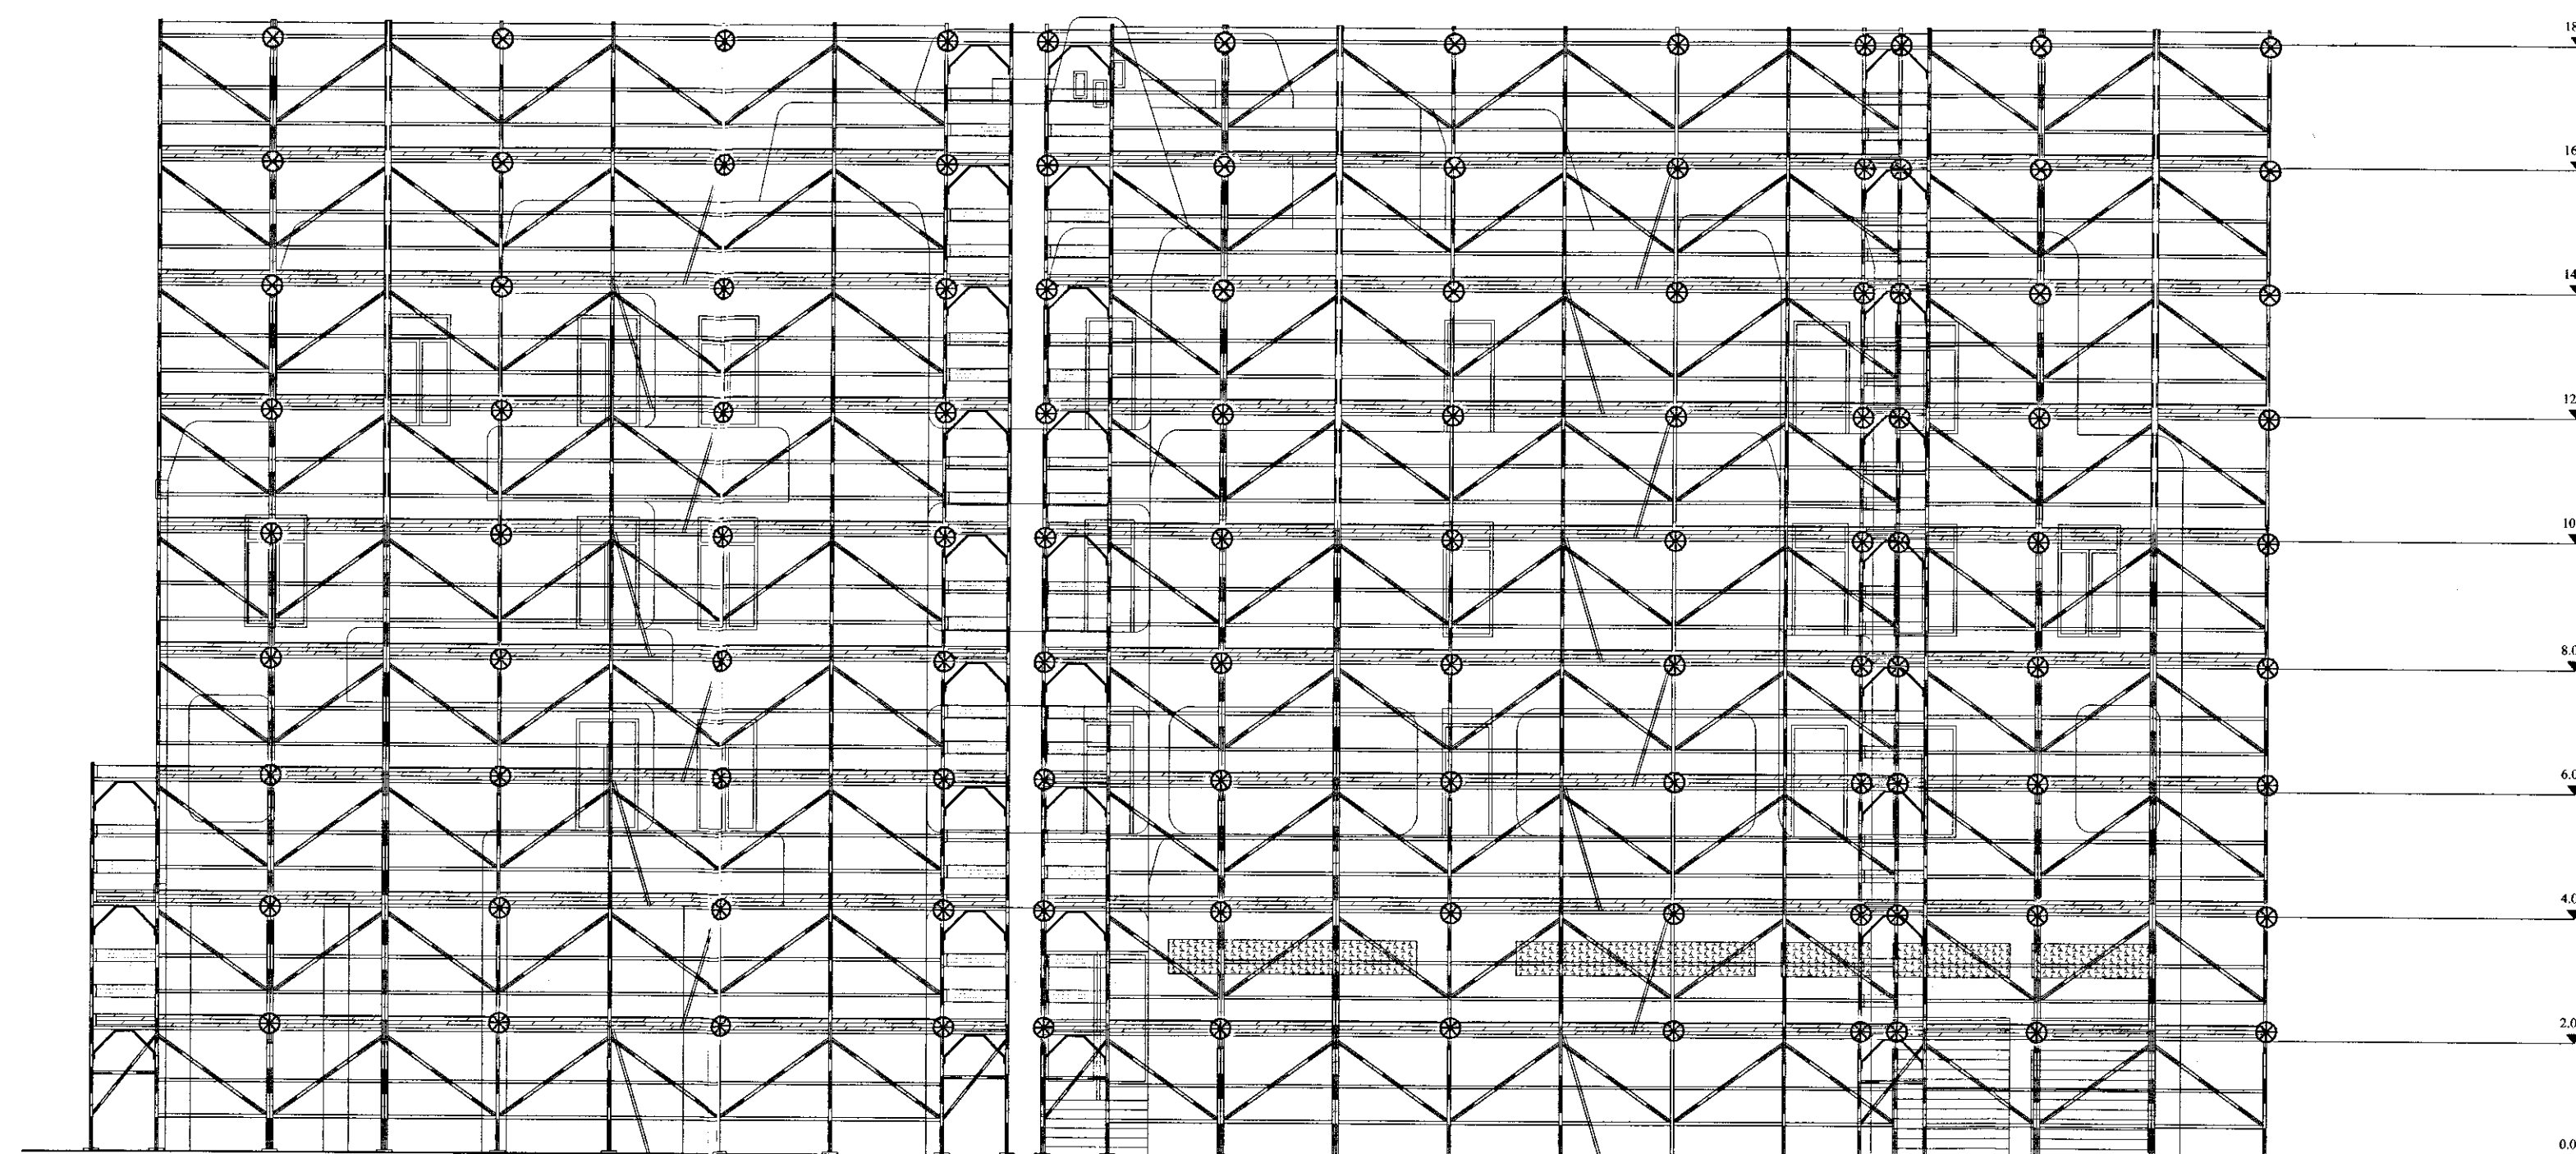


SCHEMA DI MONTAGGIO DI UN PONTEGGIO A TELAI PREFABBRICATI CON L'UTILIZZO DI UN
DOPPIO CORDINO (EN 355) PER I PRIMI DUE IMPALCATI

1

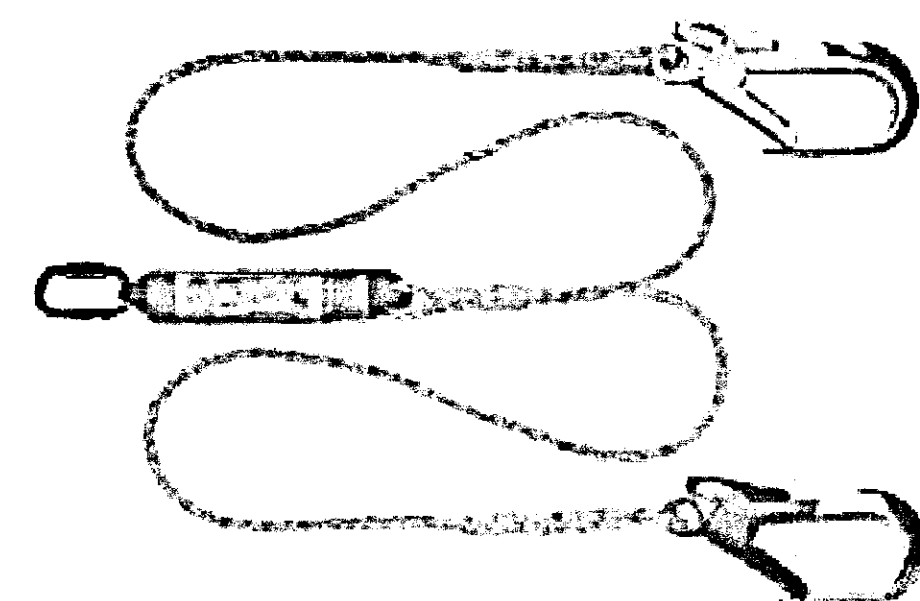


DPI anticaduta: doppio cordino con dissipatore da 200 cm
dotato di moschettone per la connessione con l'imbraco e
doppia pinza con sistema di chiusura a "doppio dito" per
l'ancoraggio sul ponteggio

2

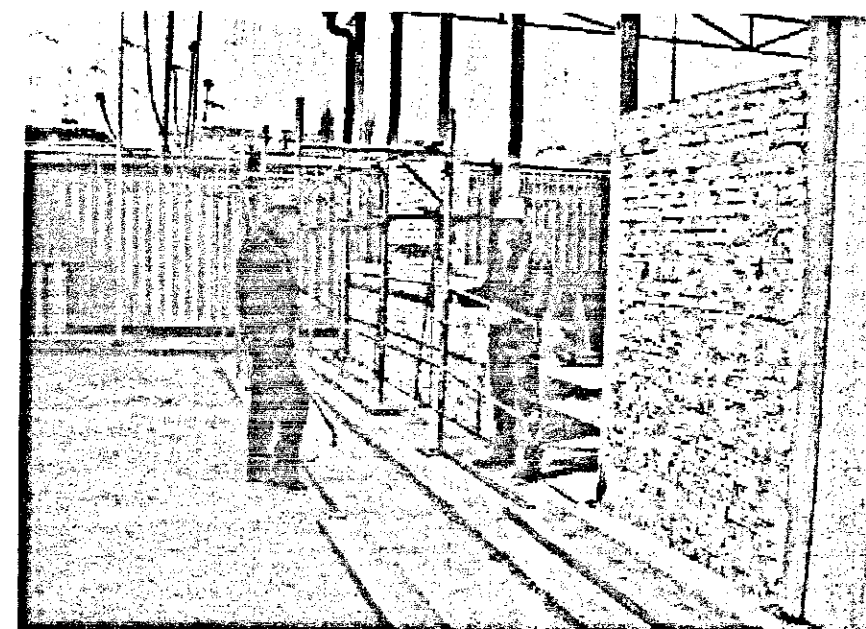


Giunti in prossimità del punto dove è previsto che sarà
posizionata la botola che permetterà di salire sui piani
superiori, saranno predisposti i correnti orizzontali pronti
per accogliere il telaio successivo.

3

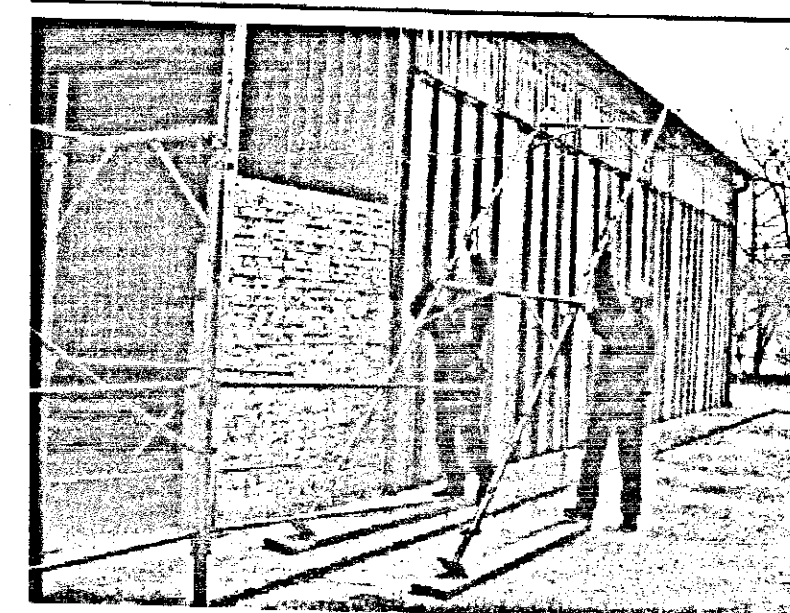


Due operatori con uno sforzo fisico contenuto e
perfettamente coerente con la normativa che regola la
movimentazione manuale dei carichi, possono procedere a
innalzare i due telai preassemblati a terra.

4

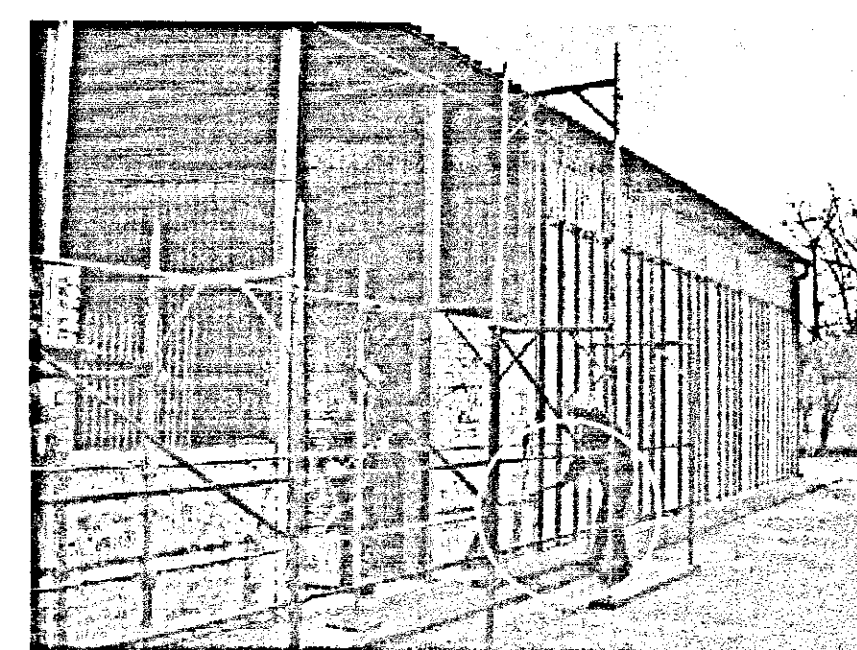


Durante la fase di innalzamento gli operatori non dovranno
mai abbandonare la presa sui telai per controllare
correttamente la posizione verticale.

5

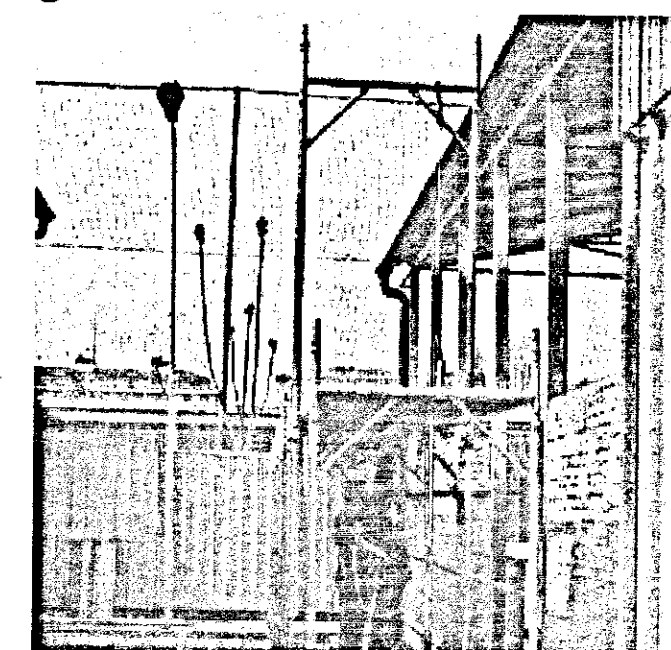

Si completa l'impalcato.

6

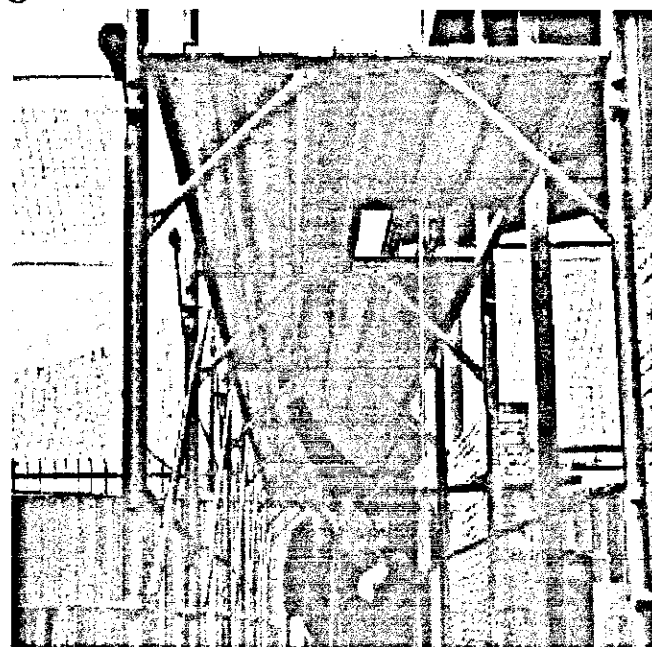


E' fondamentale controllare che tutte la tavole
dell'impalcato siano correttamente bloccate con lo
spinnotto di fermo.

7




E' possibile posizionare la scaletta in
prossimità della botola.

8

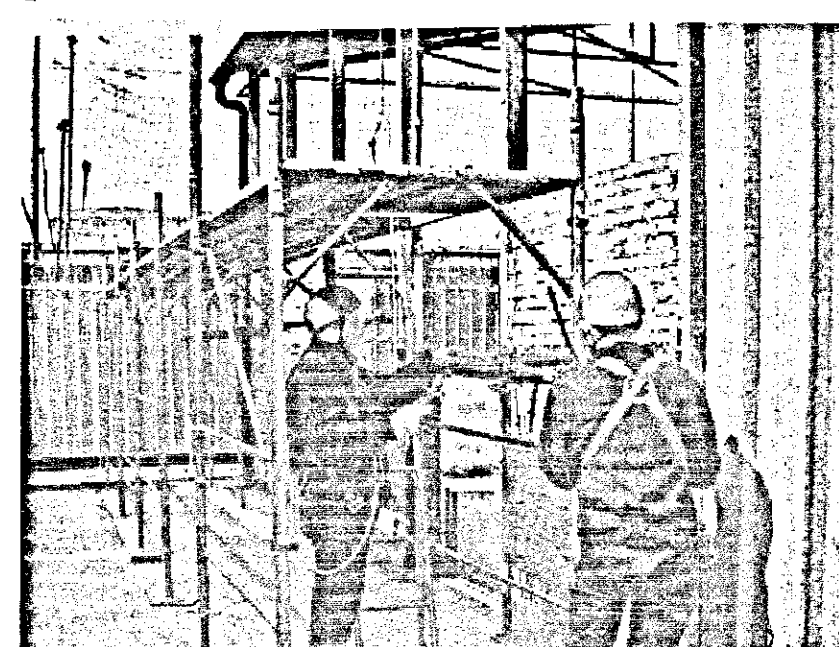


Prima di salire sull'impalcato, è necessario predisporre un
ancoraggio temporaneo che contrasti il periodo di
ribaltamento dell'intera struttura in caso di caduta
dell'operatore. Questa è l'unica lavorazione supplementare
necessaria rispetto a quanto previsto tradizionalmente delle
attività di montaggio del ponteggio.

9

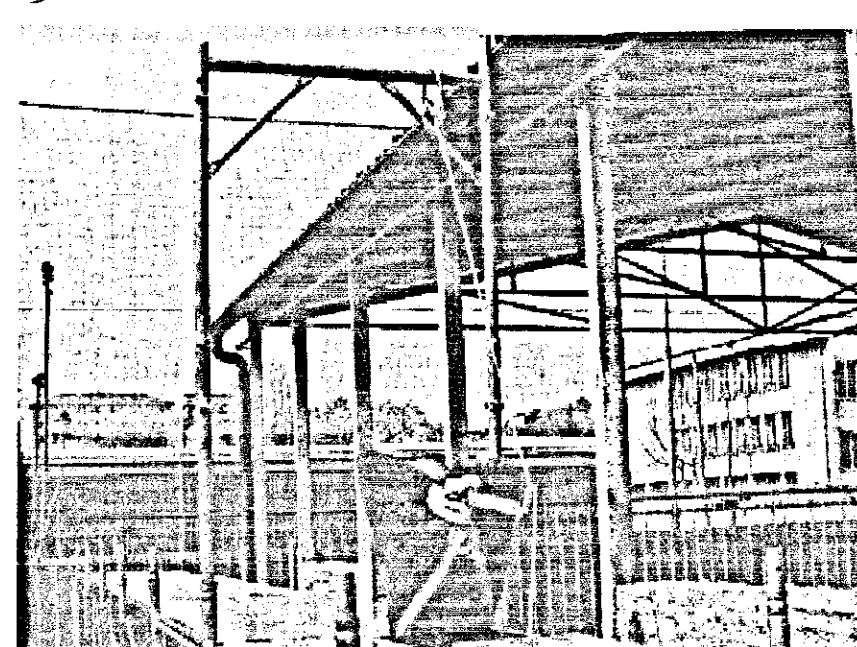

Ora l'operatore può salire la scaletta, prima di sbarcare,
provvedere alla propria messa in sicurezza fissando il DPI
all'imbracatura di sicurezza.

10

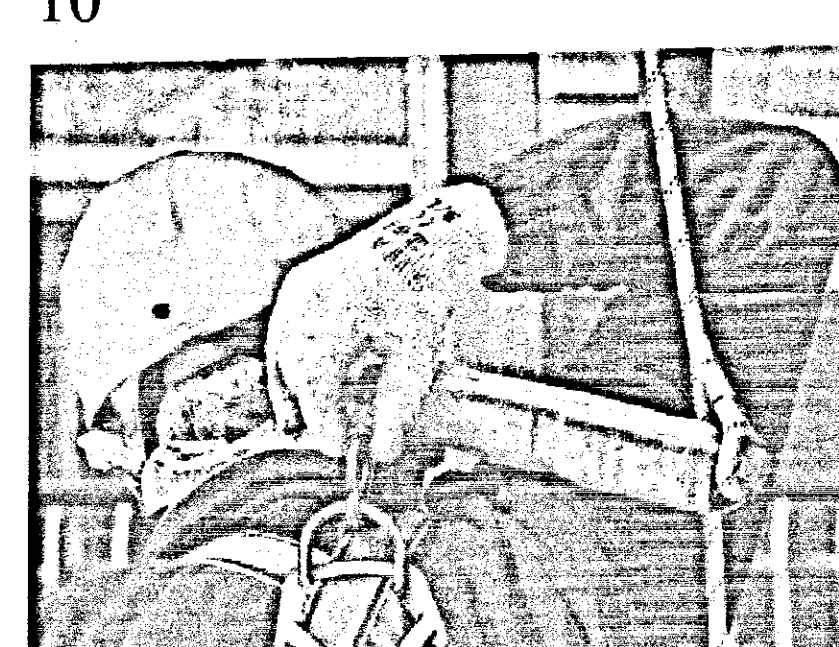

Assicurarsi che la ghiera del connettore sia ben chiusa.

11


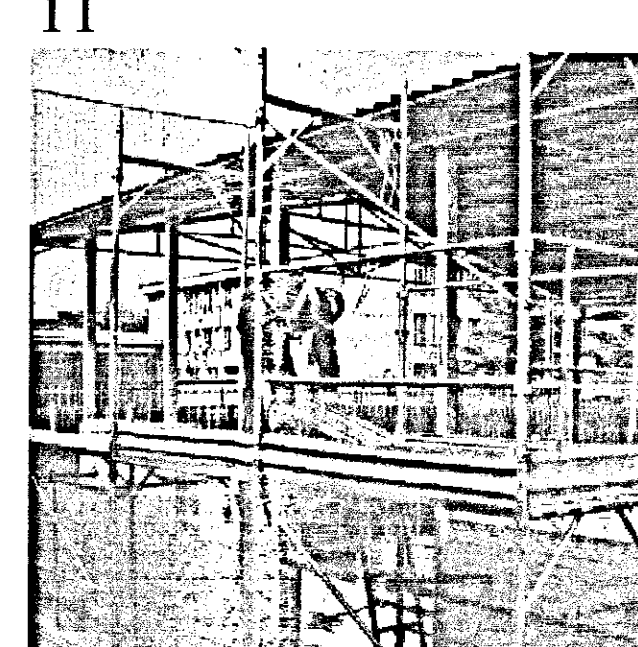


Tavola fermapiEDE esterna.

12

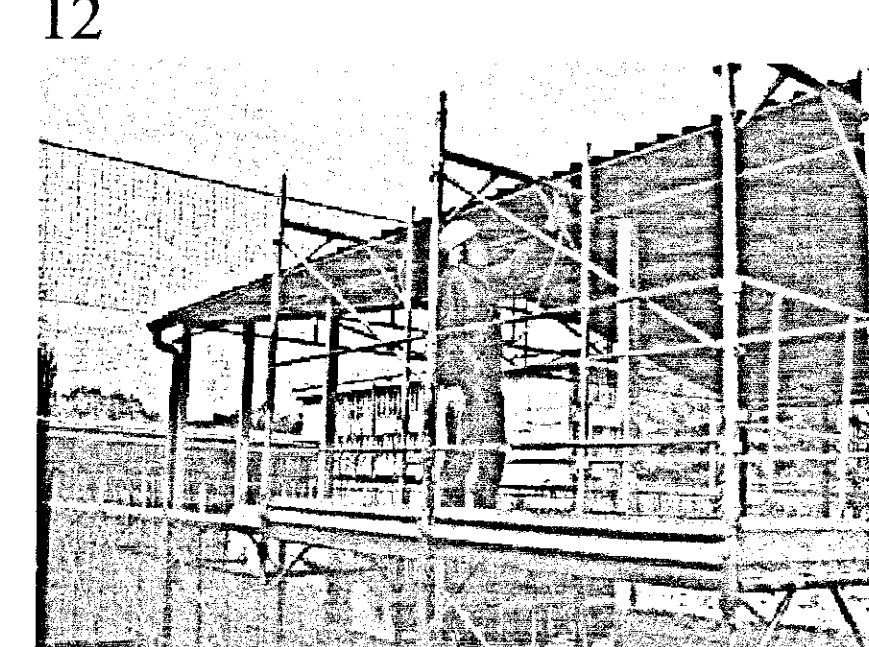

Dopo aver completato il campo con tuttigli elementi previsti
(correnti esterni e interni, diagonali), l'operatore sposta il
secondo connettore posizionando in corrispondenza del
primo ed è pronto per proseguire fino al completamento.
