

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di case per lavoratori in Brindisi - Commenda Ovest -

Area A - Cantiere n° 153/RM.

Impresa CAV. Giuseppe CARPARELLI

STATO ^(a) dei lavori eseguiti a tutto il 19
2° d'avanzamento 18 - XI 66

CONTRATTO in data 7/7/1966 N° 4764 approvato xxxxx Registrato a Brindisi il 12/7/1966

al n° 1275 Mod. I

data N.

Importo del progetto a base d'asta L.

251.054.000

Data della consegna 13/7/1966

Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione
del 8,20 per cento

230.467.572

Data dell'incominciamento
dei lavori 13/7/1966

Fondo a disposizione dell'Amministrazione

Scadenza del tempo utile
per l'ultimaz. dei lavori 7/7/1967

Per espropriazione L.

I lavori rimasero sospesi o
prorogati per

» mag. lavori impreved. »

Per cui la nuova scadenza
del tempo utile è

» lavori ad economia »

» sorveglianza e dir. »

Giorni impiegati in più


TOTALE somma impegnata L.

, , meno

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
I	2	Scavo ristretto con mezzi meccanici mc.	2,541,82	990=	2.516.401 80	
2	1	Scavo ristretto a mano "	145,21	1,320=	191.677 20	
3	34	Calcestruzzo a Kg. 150 "	256,95	7,500=	1.927.125 ==	
4	32	" " " 300 "	560,==	13,500=	7.560.000 ==	
5	38	" " " "elev?"	22,88	15,500=	354.640 ==	
6	66	Ferro omogeneo per c.a. Kg.	32,000==	150=	4.800.000 ==	
7	15	Muratura tutta tufo mc.	60==	6,600=	396.000 ==	
		Sommato lavori a misura				17.745.844 =
		B) LAVORI A FORFAIT				
8	11	C.S.A. RUSTICO :				
		39% x 48% x 206.683.280 =				38.691.110 02
		Totale lavori a misura e forfait				56.436.954 02
		a dedurre il ribasso dell'8,20%				4.627.830 20
		Restano nette lire				51.809.123 79
						=====

Il Direttore dei lavori
(Dott. Ing. Giovanni Roma)

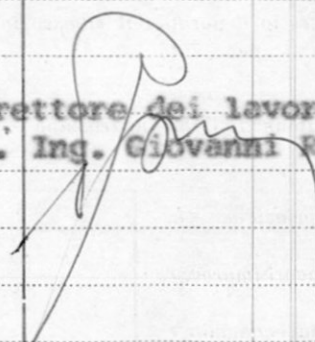

Visto :

Il Presidente
(Gr. Uff. Com.te U.G.VALLARINO)

