

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di installazione di impianti di autoclave alle Case per Lavoratori
(GESCAL) in Brindisi - Cantieri 153/BR e 154/BR

Impresa C.I.R. di Parisi Francesco

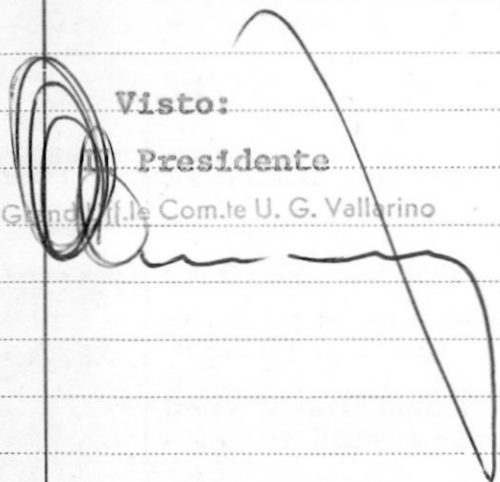
2° STATO^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 31 Agosto 1970

CONTRATTO in data 4/9/1969 n° 5272 approvato registrato a Brindisi il 5/9/1969
 al n° 1739 Mod. I

data N.

Importo del progetto L.		5.500.000=	Data della consegna . .	13/10/1969
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>5,50</u> per cento . . L.		5.197.500=	Data dell'incomincia- mento dei lavori . . .	13/10/1969
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . L.			Scadenza del tempo utile per l'ultim. dei lavori	26/11/1969
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg .	290
	» mag. lav. impreved.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . .	12/9/1970
	» lav. ad economia »			
	» sorvegli. e dir. »		Giorni impiegati in più .	
TOTALE somma impegn. L.			» » meno .	

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	14	Materiali a piè d'opera 30% x 5.500.000			1.650.000=	
2	14	Esecuzione lavori 85% x 30% x 5.500.000			1.402.500=	
3	14	Ultimazione lavori 50% x 20% x 5.500.000			550.000=	
		sommano			3.602.500=	
		a dedurre il ribasso d'asta del 5,50%			198.137,50	
		restano			3.404.362,50	
Visto:  Presidente Grandi U. G. Vallarino					Il Direttore dei Lavori Dott. Ing. Giovanni Romo 	
