

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di Case per Lavoratori in Brindisi - Quartiere

S. ELIA - GESCAL - Lotto B e Legge 14.2.1963, n. 60 - s/ 1266/1963

Impresa CORRADO Pier Marcello - SRIA -

5° STATO ^(a) d'Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 28 / 3 / 1969

CONTRATTO in data 27.3.1968 n.5163 ~~approvato~~ registrato a Brindisi il 4.4.1968
al n. 683 - Mod. I

data _____ N. _____

Importo del progetto **a. base d'asta** . L. 531.330.133,00

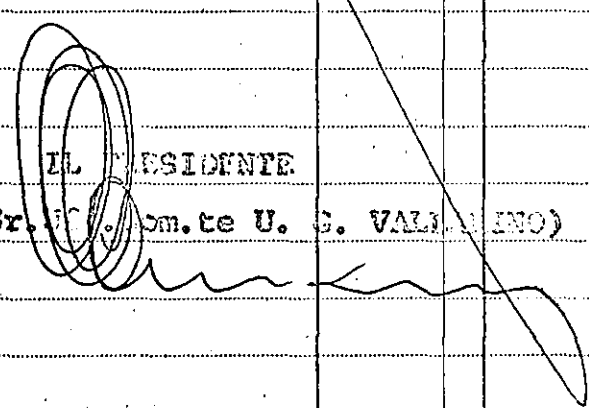

Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione
 del 7,20 per cento L. 493.074.363,00

Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . . L. 14.142.067,00

del quale impegnato	Per espropriazione L.	<u>---</u>
	» mag. lavori impreved. »	<u>10.782.067,00</u>
	» lavori ad economia »	<u>3.360.000,00</u>
	» sorveglianza e dir. »	<u>---</u>
TOTALE somma impegnata L.		<u>14.142.067,00</u>

Data della consegna . . .	<u>28.6.68</u>
Data dell'incominciamento dei lavori	<u>10.7.68</u>
Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	<u>3.8.69</u>
I lavori rimasero sospesi o prorogati per . . .	<u>---</u>
Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . . .	<u>---</u>
Giorni impiegati in più . . .	<u>---</u>
» » meno . . .	<u>---</u>

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
A) - LAVORI A MISURA						
1	1	Scavo di terra a mano mc.	1.916,81	1370,-	2.530.189,19	
2	2	" " " meccanico "	2.275,82	980,-	2.253.061,40	
3	33	Calcestruzzo a Kg.200 "	134,00	9950,-	1.353.900,-	
4	3	Scavo di sbancamento "	403,50	900,-	363.150,-	
5	32	Calcestruzzo a Kg.300 "	1.445,29	12500,-	19.510.315,-	
6	36	Calcestruzzo a Kg.300 "	95,24	15500,-	1.476.220,-	
7	36	Ferro omogeneo Kg.	59,629,11	150,-	8.944.236,65	
SOMMANO LAVORI A MISURA.....					52.079.952,50	
8	11	C.S.A.-RUSTICO E.448.336.609x48%:50%		6.181.579.392,07		
9	11	C.S.A.-TRAM.E INT.448.336.609x38%:35%		12.553.425,15		
10	11	C.S.A.-PAVIMENTI 448.336.609x10%:35%		15.601.781,31		
11	11	C.S.A.-IMPIANTIE.448.336.609x32%:52%		20.932.153,00		
12	11	C.S.A.-INFISEI E.448.336.609x12%:23%		16.174.600,61		
SOMMANO LAVORI A FORFAIT.....					67.333.249,54	
SOMMANO LAVORI A MISURA E FORFAIT.....					119.413.202,04	
. DA DEDURRE IL RIBASSO DEL 7,20%.....					11.406.277,21	
RESTANO NETTE.....					107.996.924,83	
VISTO:  IL PRESIDENTE (Gr. U. G. Valentiniano)					 IL DIRETTORE (Dot. U. G. Valentiniano)	
