

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di abitazioni per lavoratori
agricoli dipendenti in CAGLIE MESSAPICO - Legge
30.12.1960 n°1676 - Esercizi 1967 e 1968

IMPRESA: Geom.Giovanni SCHIAVONE - Pozze di Gracco

Importo lordo a base d'asta.....L.108.600.000.==

Importo netto del ribasso 8,15%.. " 99.749.100.==

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N°2

L'anno millenovecentosettanta il giorno ventidue
del mese di Maggio nel Cantiere dei lavori suddetti=
Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROJA, Direttore dei
Lavori:

VISTO il contratto n°5214 del 7.11.1968 registrato
a Brindisi l'8.11.1968 al n°2041 - Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 29.11.1968;

VISTO il verbale di sospensione del 9.12.1968;

VISTO il verbale di ripresa del 18.3.1969 che fissa
va la nuova scadenza dei lavori per il 2 Marzo
1970;

VISTO il verbale di proroga del 18.3.1970 che sposta
ulteriormente la scadenza dei lavori per il 31
Maggio 1970;


CONSIDERATO CHE è in corso di elaborazione una perizia suppletiva di variante e miglioramento, dello importo complessivo di L.6.901.700.= di cui Lire L.5.955.000.= per lavori al netto, L.356.700.= per spese generali e L.600.000.= per maggiori spese per allacciamenti.=

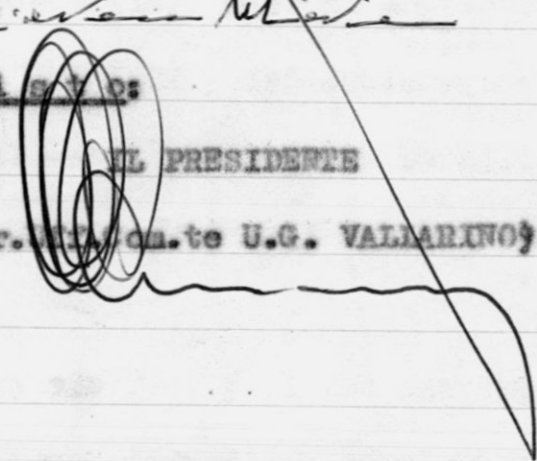
Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i lavori medesimi che verranno ripresi non appena sarà approvata la suddetta perizia.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi rimanendo ancora disponibili giorni dieci.=

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

; L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom.Giovannino SCHIAVONE)(Dott.Ing.Giovanni ROMA)


Visto:

IL PRESIDENTE
(Gr.  ca.te U.G. VALMARINO)

