



Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4090

del 09-12-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	30596	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 2 (04.02-2.02.01.09.003)	Gest.	RESIDUI/2016
MESSA IN SIC. NON STRUTT. SC. ELEM. - ITIS A. RIGHI - CONTR. STATALE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Servizi Tecnici, LL.PP., Ambiente		nr.	228 del 17-07-2018
numero 1072/2014 del 09-08-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Delibera CIPE n.6/2012 - Programma straordinario stralcio interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, prevenzione e riduzione rischio connesso alla vulnerabilità elementi anche non strutturali - Istituto ex ITIS							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio	PREVISIONE ASSESTATA		61.079,42	62.959,43	
Programma	02	Altri ordini di Istruzione	PRECEDENTI PAGAMENTI		29.298,21	29.298,21	
Titolo	2	Spese in conto capitale	PRESENTE IMPORTO		4.916,16	4.916,16	
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	TOTALE PAGATO		34.214,37		
3o Livello	01	Beni materiali	DISPONIBILITA' RESIDUA		26.865,05	28.745,06	
4o Livello	09	Beni immobili					
5o Livello	003	Fabbricati ad uso scolastico					
SIOPE	2020109003						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 4) CONTRIBUTI REGIONALI					Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 4.916,16 dicendosi QUATTROMILANOVECENTOSIEDICI/16							
Per : Delibera CIPE n.6/2012 - Programma straordinario stralcio interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, prevenzione e riduzione rischio connesso alla vulnerabilità elementi anche non strutturali - Istituto ex ITIS							

CREDITORE (Codice: 1298)				
CADINVEST S.R.L. P.Iva 01934460716		VIA SESTRIERE 2 71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.
1	Cig:66494389D1 ACCONTO Fatt.n. 4/EL del 28/05/2018 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ISTITUTO SCOLASTICO A. RIGHI-VIA XXV APRILE. DETERMINA N. 650/86 DEL 18/08/2016 CONTR. APPALTO REP. 185 DEL 12/10/16 REG. 12/10/16 AL N. 2673 SERIE 1T-CAPITOLO 30596 IMPEG Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 4.029,64 *Ritenuta Netto da Pagare:	4.916,16 886,52 4.029,64	 4.029,64	 886,52
(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE		
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCO DI NAPOLI (IT 57 D 01010 78382 100000001381) - CIN:D - ABI:01010 - CAB:78382 - C/C:100000001381 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Set. Finanziario
Dot. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATI DA 4080 A 4081

MANDATO N. _____ DEL 9/11/2018 CAP. 30586 BIL. _____

CODICE BILANCIO: _____

IMPEGNO N. 1073 / 1072 LIQUIDAZIONE N. _____

~~IMPEGNO~~

CIG DET. 66484388D1 (10) CUP DET. 336E12000670001, (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 1191/228 del 09/08/2018

SETTORE _____ IMPONIBILE € 26050,16

4029,64 22020,52

886,52 4866,52

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 5731,04

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 31781,20

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 5366-5367

CREDITORE: COD.N. (1298) CADINUS

(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI / _ NO _)

PARTIVA IVA: IT _____ (11)

CODICE FISCALE _____ (16)

() FATTURA N. 4161 DEL 28/06/2018

PROT. ENTRATA N. _____ DEL _ / _ / _ STAMPATA _ SI / _ NO _

IMPORTO € _____ IMPON. _____ IVA () _____

CIG FATT. _____ (10) CUP FATT. _____ (15)

SALDO FATTURA _ SI / _ NO _

ACCONTO FATTURA _ SI / _ NO _ PER € _____

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDETERMINATO _ SI / _ NO _

SCISSIONE SI / _ NO _ (SPESE ESENTI/ESCLUSE _ SI / _ NO _) (BOLLO _ SI / _ NO _)

EQUITALIA SI / _ NO _ (A) DICHIARAZ. DURC SCADENZA 20/02/2020 (A)

TRACCIABILITA' _ SI / _ NO _ (A) (A) -ALLEGATA ALLA DETER. DI LIQUIDAZ. COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT 57 (2) / D (L) / 01010 (5) / _ _ _ (5) / _ _ _ 1381 (12) _ SI / _ NO _

DESCRIZIONE : ISTITUTO ITIS AUGUSTO RIGHI

SIOPE: 2109 5^ LIVELLO _____



CITTA' DI CERIGNOLA

Settore Servizi Tecnici, Lavori Pubblici Ambiente

Prot.n° 24255

Cerignola,

4 NOV. 2019

OGGETTO: Delibera CIPE n. 6/2012 – Programma straordinario stralcio interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, prevenzione e riduzione rischio connesso alla vulnerabilità elementi anche non strutturali – Istituto ex ITIS Augusto Righi – Liquidazione rata finale lavori a favore Impresa Cadinvest Srl - **CIG 66494389D1**.

Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio
SEDE

Invito la S.V. a voler disporre il pagamento di complessivi € 31.781,20 a favore dell'impresa Cadinvest Srl, a titolo di rata finale dei lavori per la messa in sicurezza dell'Istituto scolastico ex ITIS Augusto Righi - **CIG 66494389D1 – CUP J36E12000670001**, ed alla relativa fattura emessa dalla stessa impresa n. 4/EL del 28/06/2018, identificativo Sdi n. 108578880, acquisita al prot.gen. n. 19265 del 29/06/2018.

Il suddetto importo dovrà essere corrisposto mediante bonifico sul c/c bancario comunicato dall'interessato, ai sensi dell'art.3, comma 7 della L.136/2010. Il relativo mandato di pagamento dovrà essere emesso in duplice esemplare, ai fini della rendicontazione delle spese al MIT – attraverso il Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche, sede coordinata di Bari, Ente finanziatore dell'opera.

La suddetta spesa di complessivi € 31.781,20, così come disposto con determinazione dirigenziale n. 1191/228 del 09/08/2018 di approvazione delle risultanze di collaudo, trova imputazione all'intervento 4.02-2.02.01.09.003, cap. 30596, a valere per € 4.916,16 sull'impegno 1035_2014 sub 3 RE 2016 liquidaz. 1072 del 09/08/2018 e per € 26.865,04 impegno 1035-2014 sub 2 RE 2017, liquidazione 1073, con carico sulla 3^ erogazione di € 62.499,98 effettuata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Direzione Gen. per l'Edilizia Statale a saldo del finanziamento assegnato per la realizzazione dell'opera (cap.E 40267-2014 accert.66).

P. Abaniti

Il Dirigente del Settore
arch. Michele Principe

Si Allega:

- dupe;
- fattura elettronica;
- comunicazione ex art.3, comma 7, legge 139/2012 e s.m. e i.

02/07/2018

Versione 1.0

Notifica Esito Committente

Identificativo Sdi: **108578880**

Riferimento Fattura

Numero Fattura: **4/EL**

Anno Fattura: **2018**

Posizione Fattura: **1**

Esito: **EC01** (Accettazione)

Descrizione: **Fattura accettata**

Message Id Committente: **001**

Per. 19265 del 29.6.2018

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT04030410288**
Progressivo di invio: **ALB1502903**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01934460716**
Codice fiscale: **01934460716**
Denominazione: **CADINVEST S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA SESTRIERE**
Numero civico: **2**
CAP: **71042**
Comune: **CERIGNOLA**
Provincia: **FG**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **FG**
Numero di iscrizione: **157699**
Capitale sociale: **118500.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0885422125**
Fax: **0885422125**
E-mail: **donato.calice@cadinvest.it**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **00362170714**
Denominazione: **Comune di Cerignola**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA DELLA REPUBBLICA**
Numero civico: **SN**
CAP: **71042**
Comune: **CERIGNOLA**
Provincia: **FG**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02046570426**
Denominazione: **Namirial SPA**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-06-28** (28 Giugno 2018)
Numero documento: **4/EL**
Importo totale documento: **31781.20**
Causale: **LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ISTITUTO SCOLASTICO A. RIGHI-VIA XXV APRILE. DETERMINA N. 650/86 DEL 18/08/2016 CONTR. APPALTO REP. 185 DEL 12/10/16 REG. 12/10/16 AL N. 2673 SERIE 1T-CAPITOLO 30596 IMPEG**
Causale: **NO 1035-2014 RE 2017 SUB. 2 E SUB 3-RATA FINALE DEI LAVORI. CUP J36E12000670001**
CIG 66494389D1

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo ordine di acquisto: **DETERMINA 650/86**
Data ordine di acquisto: **2016-08-18** (18 Agosto 2016)
Codice commessa/convenzione: **CAP.30596-IMP.1035-2014 RE 2017 SUB 2 E SUB 3**
Codice Unitario Progetto (CUP): **J36E12000670001**
Codice Identificativo Gara (CIG): **66494389D1**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo contratto: **REP. 185**
Data contratto: **2016-10-12** (12 Ottobre 2016)
Codice Unitario Progetto (CUP): **J36E12000670001**
Codice Identificativo Gara (CIG): **66494389D1**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura*Nr. linea: 1*

Descrizione bene/servizio: **LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ISTITUTO SCOLASTICO A. RIGHI-VIA XXV APRILE. DETERMINA N. 650/86 DEL 18/08/2016 CONTR. APPALTO REP. 185 DEL 12/10/16 REG. 12/10/16 AL N. 2673 SERIE 1T-CAPITOLO 30596 IMPEGNO 1035-2014 RE 2017 SUB. 2 E SUB 3-RATA FINALE DEI LAVORI. CUP J36E12000670001 CIG 66494389D1**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **N**
Valore unitario: **26050.16**
Valore totale: **26050.16**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **26050.16**
Totale imposta: **5731.04**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **ART. 17 TER DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **CADINVEST SRL**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2018-06-28** (28 Giugno 2018)
Data scadenza pagamento: **2018-06-28** (28 Giugno 2018)
Importo: **26050.16**
Codice IBAN: **IT57D0101078382100000001381**
Codice ABI: **01010**
Codice CAB: **78382**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Image.pdf**

Formato: **PDF**

Descrizione: **FATTURA 4/EL**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Cadinvest S.r.l.

Via Sestriere n°2 - 71042 Cerignola (Fg)
Iscr. Registro Imprese C.C.I.A.A. di Foggia n. 01934460716
Capitale sociale sottoscritto e i.v.: € 118.500,00

Spett.le COMUNE DI CERIGNOLA
Settore Lavori Pubblici, Manutenzione

OGGETTO: Comunicazione di attivazione o utilizzo di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010.

In relazione all'appalto dei lavori avente per oggetto "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL' ISTITUTO SCOLASTICO RIGHI A CERIGNOLA (FG)", affidati da codesto Ente , al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n.136/2010,

SI COMUNICA

la precedente sussistenza di un conto corrente dedicato utilizzato per la gestione dei movimenti finanziari relativi agli appalti pubblici, essendo destinato a tale funzione, presso il Banco di Napoli – Filiale di Cerignola con i seguenti dati identificativi del conto corrente:


- codice IBAN IT57D0101078382100000001381.

Intestataria del conto è la sottoscritta Società e il soggetto delegato ad operare sullo stesso è:

- ing. Donato Calice, nato il 02/01/1949 a Cerignola ed ivi residente in Via M. SS. Ausiliatrice n. 163, C.F.: CLC DNT 49A02 C514I;

SI SEGNA LA


che anche per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con il vostro Ente ci si avvarrà – fatte salve le eventuali modifiche successive, debitamente comunicate, – del medesimo conto corrente dedicato, senza necessità di formulare apposite comunicazioni per ciascuna commessa.

Il Legale Rappresentante


Scadenza 02-01-2023
Diritti 5.42

AT 1331847

IPZS 244 - OFFICINA C.V. ROMA

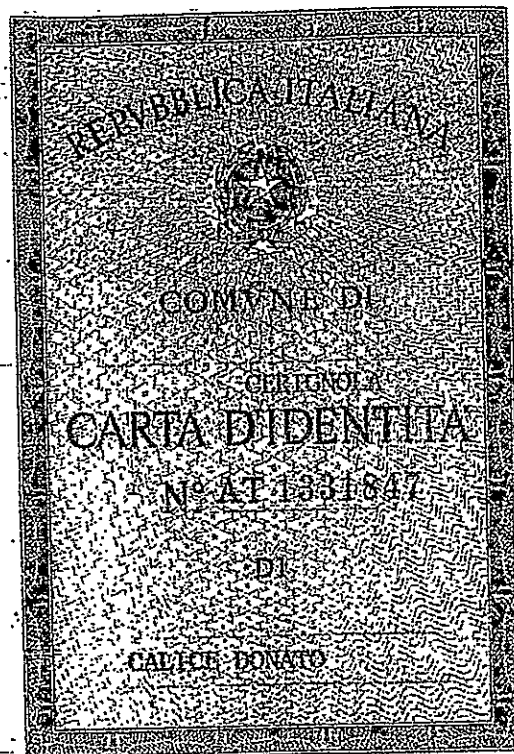

Cognome **CALICE**
Nome **DONATO**
nato il **02-01-1949**
(atto n. **36** P. **1** S. **A 1949**)
a **CERIGNOLA (FG)**
a **Italiana**
Cittadinanza **CERIGNOLA (FG)**
Residenza **LE MARIA S.S. AUSILIATRICE 163**
Via **CONIUGATO**
Stato civile **OMESSA: L. 127/97 ART. 2**
Professione

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **180**
Capelli **Castani**
Occhi **Verdi**
Segni particolari **NESSUNO**

	
Firma del titolare CERIGNOLA 09-07-2012	
Impronta del dito indice sinistro	IL SINDACO L'Ufficiale Anagrafe DELEGATO SINIZI DI PIETRO

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_17764431	Data richiesta	25/10/2019	Scadenza validità	22/02/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CADINVEST - S.R.L.
Codice fiscale	01934460716
Sede legale	VIA SESTRIERE 2 CERIGNOLA FG 71042

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201900003782204

Identificativo Pagamento: FATT.2019

Importo: 26050,16 €

Codice Fiscale: 01934460716

Data Inserimento: 09/12/2019 - 16:45

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto Reg. Gen. N. 1191

In data **09-08-2018**

Atto Reg. Sett. N. 228

In data **17-07-2018**

OGGETTO: Delibera CIPE n.6/2012 - Programma straordinario stralcio interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, prevenzione e riduzione rischio connesso alla vulnerabilità elementi anche non strutturali - Istituto ex ITIS Augusto Righi - Approvazione atto di collaudo tecnico-amministrativo - Omologazione spesa progettuale.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **diciassette** del mese di **luglio**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI TECNICI LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

LAVORI PUBBLICI

Izzillo Ing. Clorindo, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

«Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti MIT - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata - sede coordinata di Bari, al fine di prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità di elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici, ha disposto sopralluogo presso l'edificio sede dell'istituto scolastico "ITIS - Augusto Righi" di Via XXV Aprile, effettuato da proprio Tecnico rilevatore in data 18.09.2009, durante il quale sono state riscontrate problematiche riportate nella predisposta scheda di rilevamento.

Con delibera C.I.P.E. n. 6 del 20/01/2012 pubblicata sulla G.U.R.I. n.88 del 14/04/2012, è stata disposta, tra l'altro, l'assegnazione di risorse per la realizzazione del "Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici - II Stralcio".

Il citato MIT Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche, con nota prot.7493 del 04/07/2012 acquisita al protocollo n.16014 del 06/07/2012, ha trasmesso lo schema di convenzione relativo al Programma di cui sopra, nell'ambito del quale è compreso l'intervento finalizzato alla messa in sicurezza dell'edificio sede dell'Istituto scolastico "ITIS - Augusto Righi" in XXV Aprile - CUP: J36E12000670001.

In data 29/10/2012, presso il competente Ufficio del Provveditorato, si è proceduto alla sottoscrizione della "Convenzione" regolante i rapporti fra Stato ed Ente.

Con nota Ministeriale prot.n.7214 del 06/05/2014, acquisita al prot.n.11363 del 15/05/2014, la Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali-Div.1^, ha trasmesso la detta "Convenzione", iscritta al n.19369 del 21.11.2013, comunicando che l'Ufficio Centrale di Bilancio del Ministero dell'Economia e Finanze, ha vistato col n.175 del 9.1.2014 il Decreto prot.n.19707 del 22/11/2013 di approvazione della stessa Convenzione e impegno a favore del Comune di Cerignola dell'importo di € 643.800,00 finalizzato alla realizzazione dell'intervento in argomento (cod.n. 00612PUG135).

La spesa progettuale di complessivi € 643.800,00 è stata imputata al capitolo 30596 bilancio 2014, correlato al finanziamento statale assegnato dal MIT come dal citato Decreto ed al capitolo di entrata 40267, bilancio 2014, accert. 66.

Con determinazione dirigenziale n.63/18 del 10.02.2015 è stato incaricato della progettazione esecutiva, sicurezza in fase di progettazione, direzione, coordinamento della sicurezza in fase d'esecuzione, alla misura e contabilità dei lavori l'arch. Vincenzo Russo (CIG Z57130B217), tecnico esterno alla struttura comunale, in possesso dei requisiti richiesti per l'espletamento dell'incarico. In data 25/02/2015 il professionista ha sottoscritto apposito disciplinare di incarico.

Il citato professionista, ad espletamento dell'incarico, ha trasmesso il progetto per la messa in sicurezza dell'edificio scolastico ex ITIS Augusto Righi, il quale - data la valenza storica artistica dell'immobile di età superiore a 50 anni - è stato sottoposto all'esame della Soprintendenza territorialmente competente per l'acquisizione dell'autorizzazione, ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 42/2004.

La Soprintendenza alle Belle Arti e Paesaggio per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, con sede in Bari, giusta nota n.7254 del 17.11.2015, acquisita al prot.n.31425 del 25/11/2015, si è favorevolmente espressa sul progetto.

Con delibera n.370 del 30/12/2015 la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo, adeguato nei termini di cui al parere della Soprintendenza, il quale è stato sottoposto al definitivo parere del competente Provveditorato, in osservanza dell'art.3, comma 1, della citata "Convenzione".

Con pec del 16/03/2016 è stato acquisito il parere favorevole rilasciato dal C.T.A. del competente Provveditorato, giusto voto n.19 reso nell'adunanza dell'11.02.2016. In relazione ad alcune precisazioni esposte dal CTA è stato rimodulato il quadro economico di spesa.

I lavori, giusta determinazione dirigenziale del Settore Lavori Pubblici n.650/86 del 18/08/2016 e successivo contratto di appalto repertorio n.185 del 12/10/2016, registrato a Cerignola in data 12/10/2016 col n.2673 Serie 1T, sono stati definitivamente aggiudicati alla ditta Cadinvest srl (codice fiscale e partita IVA:01934460716), per il prezzo di € 322.184,29 al netto del ribasso offerto del 22,500% sulla base d'asta di € 415.721,66, oltre a € 68.112,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e per un totale complessivo di contratto per lavori pari a € 390.296,59, oltre iva come dovuta.

In relazione al risultato di gara, con la citata D.D. n.650/86 del 18/08/2016 è stato rideterminato il quadro economico, secondo le risultanze in essa riportate.

I lavori sono stati consegnati in data 18/10/2016, come da verbale in atti, e regolarmente iniziati in pari data. La durata degli stessi è stata stabilita in 180gg, come da CSA e contratto.

Con determinazione dirigenziale n.194/34 del 27/02/2017 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva finalizzata alla risoluzione delle emerse nuove contingenze e criticità, dettagliatamente riportate nella stessa determinazione e negli elaborati di perizia, redatti dal direttore dei lavori, arch. Vincenzo Russo, su autorizzazione del RUP.

Per effetto della suddetta variante, che ha previsto primariamente lavorazioni diverse impreviste ed imprevedibili in fase progettuale ed in parte lavori di miglioramento delle caratteristiche costruttive e di finitura, l'importo dei lavori è stato rideterminato in € 396.026,15 al netto del ribasso d'asta del 22,50% (applicato sull'importo computato di € 511.001,48), mentre gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso in € 77.613,03 stabilendo, pertanto, in € 473.639,17 il nuovo importo contrattuale, con l'incremento di € 83.342,58 che ha trovato copertura con la parziale utilizzazione delle economie di gara (voce "imprevisti").

Per la redazione della perizia di variante e suppletiva all'arch.Vincenzo Russo sono stati riconosciuti compensi professionali pari ad € 13.500,00, oltre contributo cnpaia ed IVA, con prelievo della spesa dalla voce imprevisti del quadro economico di progetto.

Sulla perizia è stato acquisito il parere favorevole della competente Soprintendenza ABAP-FG, giusta autorizzazione prot.n.3008 del 24/04/2017, e del Provveditorato Interregionale

per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise la Puglia e la Basilicata - sede coordinata di Bari, giusto voto favorevole n°54 reso nell'Adunanza del 29/06/2017 dal proprio C.T.A. comunicato con nota prot.n.6931 del 02/08/2017.

La spesa progettuale è rimasta confermata in complessivi € 643.800,00, secondo il seguente Q.E. analitico di perizia approvato con la citata D.D. n.194/34/2017:

LAVORI	Come da Precisazioni CTA	Post gara d'appalto	Perizia di variante e suppletiva
A LAVORI			
a1.importo dei lavori al netto del ribasso del 22,50%	415.721,66	322.184,29	396.026,15
a2.Oneri di sicurezza	68.112,30	68.112,30	77.613,02
TOTALE LAVORI	483.833,96	390.296,59	473.639,17
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b1.Iva sui Lavori (22%)	106.443,47	85.865,25	104.200,62
b2.Spese per pubblicità bando di gara	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Imprevisti (comprensivi di IVA)	8.837,57	122.953,16	
b3. Contributo Anac	225,00	225,00	225,00
b4. Progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	31.368,22	31.368,22	44.868,22
b5. calcoli strutturali consolidamento solai, deposito Genio Civile			3.152,60
b6. collaudo	3.000,00	3.000,00	3.000,00
b7. CNPAIA AL 4%	1.254,73	1.254,73	2.040,83
b8.Iva AL 22% su spese tecniche e cnpaia al 4%	7.837,05	7.837,05	11.673,56
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	159.966,04	253.503,41	170.160,83
TOTALE QUADRO ECONOMICO	643.800,00	643.800,00	643.800,00

Con determinazione dirigenziale n.1071/101 del 13/09/2017 è stato conferito all'ing.Nicola Rizzo -CF.RZZNCL69D23C514U, P.IVA:02389870714, l'incarico per la redazione della relazione di calcolo degli interventi di consolidamento estradosale dei solai di copertura del 1° Piano (calpestio del sottotetto ala SUD), previsti con la intervenuta variante, (CIG:Z731FE07AA) e all'arch.Matteo Morra -CF.MRRMTT64T27C514J, P.IVA:03455820716- l'incarico per il collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e definitivo (CIG: Z661FE0815).

Sul "progetto esecutivo strutturale degli interventi di consolidamento del solaio del sottotetto", redatto dal citato ing.Nicola Rizzo, è stata ottenuta l'autorizzazione sismica registrata in data 06/11/2017 da parte del preposto Ufficio Edilizia sismica della Provincia di Foggia ed acquisita agli atti in data 13.11.2017 al prot.n.33132.

In relazione alla variante è stato stipulato con l'Appaltatrice Cadinvesr S.r.l. opportuno contratto aggiuntivo, rep. n.195 del 20/11/2017, registrato a Cerignola in data 22/11/2017 al n.2401 Serie 1T.

L'ing. Nicola Rizzo con nota acquisita al protocollo n.36619 del 14/12/2017, ad adempimenti ultimati, ha trasmesso la documentazione relativa al suddetto "progetto esecutivo strutturale degli interventi di consolidamento del solaio del sottotetto dell'edificio ex ITIS Augusto Righi".

La D.L., con verbale del 24/01/2018, acquisito agli atti il 30/01/2018 al prot.n.3003, ha certificato l'avvenuta ultimazione dei lavori in pari data, fatta eccezione per alcune lavorazioni e forniture di piccola entità non incidenti sulla funzionalità, per la realizzazione delle quali è stato concesso il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art.199, comma 2, del DPR 207 del 5/10/2010.

La ultimazione, pertanto, è stata considerata avvenuta nei termini contrattuali fissati al 24/01/2018, tenuto conto della intervenuta sospensione in attesa dell'acquisizione del parere della Soprintendenza ABAP e del competente Provveditorato sulla variante e della proroga concessa con la variante stessa.

Il verbale di ripresa lavori del 6.12.2017 è stato firmato dall'appaltatrice Cadinvest Srl con riserva.

L'arch. Vincenzo Russo, in qualità di Direttore Lavori, con nota acquisita al prot.n.6387 del 26/02/2018, ha proceduto a trasmettere gli atti di contabilità finale, Relazione sul Conto Finale, relazione riservata, relazione tecnico-scientifica (art.250 DPR 207/2010).

L'importo delle lavorazioni contrattuali riportato nello Stato Finale è di € 396.026,15 per lavori, al netto del ribasso d'asta del 22,50%, ed € 77.613,02 per oneri della sicurezza, per un totale di € 473.639,17.

Tenuto conto degli acconti corrisposti in corso d'opera per € 447.589,01, come da certificati di pagamento in atti, è stato certificato a favore dell'appaltatrice, Cadinvest Srl, il credito residuo di € 26.050,16, oltre iva.

Lo stato finale dei lavori è stato sottoscritto dall'Appaltatrice in data 21.02.2018 con riserva, confermando le riserve iscritte sul verbale di ripresa dei lavori del 06/12/2017 ed esplicitate sul registro di contabilità in data 20.12.2017, avanzando richiesta di indennità derivanti dal prolungamento della sospensione dei lavori oltre i termini previsti dall'art.160 del DPR 207/2010.

Il Direttore dei lavori in merito alla riserva formulata dall'Appaltatrice, con relazione riservata del 23/02/2018, redatta ai sensi dell'art.200 del DPR n.207 del 5/10/2010, con motivate controdeduzioni ha manifestato al Responsabile del procedimento che le richieste dell'Appaltatrice, in considerazione delle richiamate disposizioni legislative relative alla sospensione e ripresa dei lavori - proroghe e tempo per la ultimazione dei lavori (art.158 e art.159 del DPR n.207/2010), sono da ritenersi non accettabili.

Con Pec del 28/02/2018, acquisita al prot. n.6759 del 01/03/2018, l'Appaltatrice ha inoltre richiesto gli interessi legali e moratori per ritardato pagamento del corrispettivo di cui al 2° SAL, secondo il calcolo nella stessa riportato.

Con determinazione dirigenziale n. 445/85 del 14/03/2018 si è proceduto:

- alla presa d'atto dello stato finale dei lavori secondo le annotazioni contabili nelle stesso riportate dal Direttore dei Lavori, unitamente agli atti di contabilità finale, alla relazione sullo stato finale e relazione riservata;

- a respingere, a termini delle disposizioni normative nella stessa richiamate e in linea con il parere del Direttore dei

lavori espresso nella "riservata", la richiesta di indennizzo avanzata dall'Appaltatrice in relazione alle riserve formulate;

- a rinviare la richiesta dell'Appaltatrice degli interessi legali e moratori per ritardato pagamento del corrispettivo di cui al 2° SAL, rappresentando che il ritardo non è attribuibile ad inerzia di questa Amministrazione ma dettato dai tempi di attesa di accredito da parte dell'Ente Finanziatore (MIT) della seconda rata (pari al 45%) del contributo assegnato, effettuata previa validazione della certificazione di cui alla 1^ rendicontazione delle spese allo stesso documentate, come richiesto da "convenzione".

L'arch.Matteo Morra, concluse le operazioni di collaudo, ha redatto in data 18/06/2018 l'atto unico di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori, relazione riservata sulla riserva della impresa Appaltatrice ed il verbale di visita di collaudo, trasmessi con nota acquisita in pari data al prot. n.18312.

Il citato professionista con l'atto di collaudo dichiara che i "lavori per la messa in sicurezza e prevenzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, dell'istituto scolastico 'ITIS-Augusto Righi' di Via XXV Aprile" sono stati eseguiti dall'impresa Cadinvest Srl a perfetta regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e ordini e disposizioni impartite dalla Direzione Lavori e dal RUP e, quindi, li ha dichiarati collaudabili.

Con il medesimo atto il collaudatore, eseguita opportuna revisione tecnico-contabile dei documenti e non avendo riscontrato errori, conferma come da S.F. in € 473.639,17 l'importo dei lavori eseguiti contrattualmente, di cui € 396.026,15 per lavori al netto del ribasso del 22,50% ed € 77.613,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e certifica in € 26.050,16, oltre IVA al 22% pari ad € 5.731,04 e, quindi, in complessivi € 31.781,20, il credito finale liquido ed esigibile dell'Impresa, tenuto conto dei n.3 certificati di acconto alla stessa corrisposti in corso d'opera per complessivi € 447.589, emessi: - in data 23.12.2016 per € 154.757,39;

- in data 06.03.2017 per € 167.816,93;

- in data 29.01.2018 per € 125.014,69.

In merito alla riserva formulata dall'impresa esecutrice per il riconoscimento di indennità derivante dal prolungamento della sospensione dei lavori oltre i termini previsti dall'art.160 del DPR 207/2010, il collaudatore, con relazione riservata, ritenendo la stessa non accoglibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.107 (commi 1, 2) del D.Lgs 50 del 18/04/2016 e s. m. e i., che riprende quanto riportato all'art.159 del DPR n.207/2017, ha respinto la riserva, il tutto come meglio specificato nella stessa relazione.

In merito alla richiesta della Ditta per il riconoscimento di interessi legali e moratori, per ritardato pagamento del corrispettivo di cui al 2° SAL, il RUP, sulla base di quanto riportato nell'invito a gara per l'affidamento dei lavori e considerato che il ritardo non è attribuibile ad inerzia di questa Amministrazione ma dettato dai tempi di attesa di accredito da parte dell'Ente Finanziatore (MIT) della seconda rata (pari al 45%) del contributo assegnato, necessario per effettuare il relativo pagamento, ritiene non accoglibile la richiesta stessa.

Per l'esecuzione dei lavori non sono occorse occupazioni permanenti o temporanee; nel corso dei lavori non sono stati prodotti danni diretti e/o indiretti a persone e cose.

L'Impresa ha firmato l'atto di collaudo senza alcuna riserva.

L'Appaltatrice Cadinvest S.r.l., ai fini della liquidazione della rata finale dei lavori, come da risultanze dello stato finale e atto di collaudo, ha emesso la fattura n.4/EL del 28/06/2018, acquisita al protocollo n.19265 del 29/06/2018 sdi 108578880, dell'importo di € 26.050,16,oltre iva al 22% pari ad € 5.731,04 e per complessivi € 31.781,20.

E' stata verificata la regolarità contributiva ed assicurativa dell'Appaltatrice nei confronti degli Enti Previdenziali, come da DURC in atti, ed acquisita opportuna dichiarazione dei flussi finanziari rilasciata dalla stessa ai sensi dell'art.3 comma 7 della L.136/2010.

L'Impresa no ha ceduto i suoi crediti derivanti dal contratto in oggetto

Ciò stante, si ritiene opportuno procedere:

- all'approvazione dell'atto di collaudo ed alla presa d'atto della "relazione riservata del collaudatore sulla riserva dell'impresa", redatti nelle risultanze sopra dette dall'arch. Matteo Morra;

- al riconoscimento del credito liquido ed esigibile a favore dell'impresa Cadinvest srl dell'importo di € 26.050,16,oltre iva al 22% pari ad € 5.731,04 e per complessivi € 31.781,20, a titolo di rata finale lavori contrattuali ed a saldo della fattura n. 4/EL del 28/06/2018, che trova capienza alle specifiche voci di quadro economico di progetto ed imputazione al capitolo 30596, codice bilancio 4.02-2.02.01.09.003, a valere per € 4.916,16 sull'impegno n.1035-2014 sub 3 RE 2016, e per € 26.865,04 all'impegno 1035-2014 sub 2 RE 2017.

La fattura rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto, si procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore dell'importo imponibile della stessa, mentre la somma corrispondente all'Iva, verrà versata all'Erario con le modalità previste dalla legge.

Tenuto conto delle singole voci di spesa che hanno concorso alla realizzazione dell'intervento, di cui ai relativi provvedimenti di liquidazione già adottati in relazione alle fatture esibite, nonché del presente atto, la spesa progettuale viene accertata ed omologata in complessivi € 641.919,98, finanziata con fondi Ministeriali.

LAVORI	Come da Precisazioni CTA	Post gara d'appalto	Perizia di variante e suppletiva	Stato finale e collaudo
A LAVORI				
a1.importo dei lavori al netto del ribasso del 22,50%	415.721,66	322.184,29	396.026,15	396.026,15
a2.Oneri di sicurezza	68.112,30	68.112,30	77.613,02	77.613,02
TOTALE LAVORI	483.833,96	390.296,59	473.639,17	473.639,17
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
b1.Iva sui Lavori (22%)	106.443,47	85.865,25	104.200,62	104.200,62
b2.Spese per pubblicità bando di gara	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Imprevisti (comprensivi di IVA)	8.837,57	122.953,16	0,00	0,00

b3. Contributo Anac	225,00	225,00	225,00	225,00
b4. Progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	31.368,22	31.368,22	44.868,22	44.868,22
b5. calcoli strutturali consolidamento solai, deposito Genio Civile			3.152,60	3.000,00
b6. collaudo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
b7. CNPAIA AL 4%	1.254,73	1.254,73	2.040,83	2.034,72
b8.Iva AL 22% su spese tecniche e cnpaia al 4%	7.837,05	7.837,05	11.673,56	10.952,25
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	159.966,04	253.503,41	170.160,83	168.280,81
TOTALE spese progettuali omologate	643.800,00	643.800,00	643.800,00	641.919,98
economia				1.880,02
Tot.				643.800,00

Dato atto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in conto contributo assegnato ha già erogato la complessiva somma di € 579.420,00 pari al 90% del contributo stesso e che, a termini dell'art.6 della succitata "Convenzione" regolante i rapporti fra Stato ed Ente, verrà inoltrata opportuna richiesta per l'erogazione a saldo contributo, sino alla concorrenza della spesa come sopra accertata ed omologata, necessaria per effettuare i pagamenti di cui ai provvedimenti di liquidazione adottati.

A termini del citato art.6 della "Convenzione", il saldo del contributo sarà effettuato dal MIT, con l'approvazione degli atti di collaudo, relazione Stato-Ente, e previa acquisizione del parere sull'ammissibilità della spesa, da rendersi a cura del competente Provveditorato.

Dato atto che all'intervento è stato attribuito il CUP: J36E12000670001; ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex Art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12 novembre 2010, n.187 convertito con modificazioni nella legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", all'attività inerente l'affidamento dei lavori è stato attribuito il CIG: 66494389D1.»

Visto il D.Lgs. 163/2006 ed il D.P.R. 207/2010;

Visto il D.Lgs. n.50 del 18/04/2016;

Visti gli adempimenti ex artt. 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, si dispone la pubblicazione del presente atto nella sezione del link "Amministrazione trasparente", sotto sezione "bandi di gara e contratti";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di adozione del Piano Economico di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 06/06/2017, prot.n. 102/Gab., con il quale si ridefinisce e si affida all'ing. Clorindo Izzillo, la Dirigenza del Settore Servizi Tecnici Lavori Pubblici - Ambiente comprendente i Servizi Lavori Pubblici, Manutenzione, Ambiente e Verde Pubblico;

Visto il decreto del Sindaco dell'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018;

D E T E R M I N A

1) la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di approvare, su parere favorevole del Responsabile del procedimento, ing. Clorindo Izzillo, il collaudo tecnico - amministrativo, redatto dall'arch. Matteo Morra, relativo ai lavori per la "Messa in sicurezza e prevenzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, dell'istituto scolastico 'ITIS - Augusto Righi' di Via XXV Aprile", eseguiti dall'impresa appaltatrice Cadinvest S.r.l., in virtù del contratto di appalto rep.n.185 del 12/10/2016, registrato a Cerignola in data 12/10/2016 col n.2673 Serie 1T, e successivo contratto aggiuntivo, rep.n.195 del 20/11/2017, registrato a Cerignola in data 22/11/2017 al n.2401 Serie 1T;

3) di dare atto che il collaudatore

- ha certificato che i lavori sono stati eseguiti dall'impresa Cadinvest S.r.l. in conformità alle norme contrattuali e previsioni di progetto e varianti, nonché alle speciali disposizioni impartite dalla Direzione lavori e dal RUP, rientranti nei limiti discrezionali agli stessi consentiti per la piena sicurezza e funzionalità dell'opera;

- eseguita opportuna e puntuale revisione tecnico-contabile dei documenti e lavori e non avendo riscontrato errori o manchevolezze da parte dell'Appaltatrice, ha confermato come da S.F. in € 473.639,17 l'importo dei lavori eseguiti contrattualmente, di cui

€ 396.026,15 per lavori al netto del ribasso del 22,50% ed € 77.613,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e certifica in € 26.050,16, oltre IVA al 22% pari ad € 5.731,04 e, quindi, in complessivi € 31.781,20, il credito finale liquido ed esigibile dell'Impresa, tenuto conto dei n.3 certificati di acconto alla stessa corrisposti in corso d'opera per complessivi € 447.589;

- ha respinto, ai sensi e per gli effetti dell'art.107 (commi 1, 2) del D.Lgs 50 del 18/04/2016 e s. m. e i., che riprende quanto riportato all'art.159 del DPR n.207/2017, la riserva dell'Appaltatrice apposta sul verbale di ripresa lavori in data 06/12/2017, esplicitata in data 20.12.2017 sul registro di contabilità e confermata in data 21/02/2018 sullo stato finale dei lavori, come meglio specificato nella "relazione riservata del collaudatore sulla riserva dell'impresa", condivisa dal RUP e della quale si prende interamente atto;

4) di dare atto che l'Impresa Cadinvest S.r.l.,

- ha firmato senza alcuna riserva l'atto di collaudo tecnico amministrativo dei lavori;

- è in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali, come da DURC acquisito agli atti d'ufficio;

- non ha ceduto i suoi crediti derivanti dal contratto in oggetto;

5) di autorizzare lo svincolo delle polizze fideiussorie prestate dalla ditta esecutrice dei lavori a garanzia degli obblighi contrattuali, di cui al citato contratto rep.n.185/2016 e atto aggiuntivo rep n.195/2017;

6) di rigettare la richiesta dell'Appaltatrice relativa al riconoscimento di interessi legali e moratori per ritardato pagamento del corrispettivo di cui al 2° SAL;

7) di liquidare a favore dell'impresa Cadinvest S.r.l. il credito liquido ed esigibile dell'importo di € 26.050,16, oltre iva al 22% pari ad € 5.731,04 e per complessivi € 31.781,20, a titolo di rata finale lavori contrattuali ed a saldo della fattura n. 4/EL del 28/06/2018, acquisita al protocollo n.19265 del 29/06/2018 sdi 108578880, specificando che all'effettivo pagamento si provvederà ad avvenuta relativa erogazione da effettuarsi dal Ministero dell'Interno, finanziatore dell'opera;

8) di dare atto che la complessiva spesa di € 31.781,20, necessaria per la liquidazione a favore dell'Appaltatrice della rata finale dei lavori, trova imputazione, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n.4/2 al D. Lgs. 118/2011, al capitolo 30596, cod. bilancio 4.02-2.02.01.09.003, a valere per € 4.916,16 sull'impegno n.1035-2014 sub 3 RE 2016, e per € 26.865,04 all'impegno 1035-2014 sub 2 RE 2017;

9) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2018, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

10) di liquidare la detta spesa di € 26.178,21 al suddetto capitolo ed impegno, imputandola al bilancio 2018;

11) di approvare il quadro economico definitivo, così come dettagliatamente riportato in premessa, che accerta in complessivi € 641.919,98 la spesa per la realizzazione dell'intervento in oggetto, finanziata con i fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, autorizzando il Servizio Risorse Finanziarie a procedere ad effettuare le conseguenti operazioni contabili necessarie alla riduzione dei relativi impegni, pari alla economia riscontrata di € 1.880,02 rispetto al contributo assegnato di € 643.800,00, ad avvenuta definitiva ammissione ed omologazione delle spese da parte dello stesso MIT;

12) di dare opportuna comunicazione del presente atto, unitamente alla documentazione probante della spesa, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attraverso la competente Struttura del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise la Puglia e la Basilicata - sede coordinata di Bari, nei termini di cui alla citata "Convenzione", ai fini della rendicontazione e definitiva omologazione delle spese;

13) di dare atto che la redazione del presente atto è stata assegnata alla Sig.ra Battaglino Anna, in servizio presso l'Ufficio Lavori Pubblici.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Izzillo Ing. Clorindo

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 31.781,20 (CIG. 66494389D1) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Delibera CIPE n.6/2012 - Programma straordinario st n. 1072 del 09-08-2018 CIG 66494389D1	
Su Impegno N° 3 sub n° 3 del 24-02-2017 a Residuo 2016 approvato con Atto n. 194 D.D. Reg. Gen. N. del 27-02-2017 avente per oggetto Delibera CIPE n.6/2012 - Programma straordinario stralcio interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, prevenzione e riduzione rischio connesso alla vulnerabilità elementi anche non strutturali - Istituto ex ITIS	
Missione Programma 5° livello 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	
Capitolo	30596 Articolo
MESSA IN SIC. NON STRUTT. SC. ELEM. - ITIS A. RIGHI - CONTR. STATALE	
Causale	Delibera CIPE n.6/2012 - Programma straordinario stralcio interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, prevenzione e riduzione rischio connesso alla vulnerabilità elementi anche non strutturali - Istituto ex ITIS
Importo	€ 4.916,16
Beneficiario	1298 CADINVEST S.R.L.
Quietanza BONIFICO BANCO DI NAPOLI (IT 57 D 01010 78382 100000001381) IBAN IT57D0101078382100000001381	

Delibera CIPE n.6/2012 - Programma straordinario st n. 1073 del 09-08-2018 CIG 66494389D1	
Su Impegno N° 2 sub n° 2 del 27-07-2016 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 650 AREA AMM. TECNICA del 18-08-2016 avente per oggetto Lavori di "messa in sicurezza e alla prevenzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, nell' istituto scolastico A. Righi" . CUP: J36E12000670001 CIG: 66494389D1.	
Missione Programma 5° livello 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	
Capitolo	30596 Articolo
MESSA IN SIC. NON STRUTT. SC. ELEM. - ITIS A. RIGHI - CONTR. STATALE	
Causale	Delibera CIPE n.6/2012 - Programma straordinario stralcio interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, prevenzione e riduzione rischio connesso alla vulnerabilità elementi anche non strutturali - Istituto ex ITIS
Importo	€ 26.865,04
Beneficiario	1298 CADINVEST S.R.L.
Quietanza BONIFICO BANCO DI NAPOLI (IT 57 D 01010 78382 100000001381) IBAN IT57D0101078382100000001381	

Cerignola, lì 09-08-18

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **11-08-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **24345** del **10-08-18** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **09-08-18**.

Dal Palazzo di Città, **09-08-18**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
--

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **11-08-18** al **25-08-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **27-08-18**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.
