



Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1474

del 11-04-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	34436	Art	0	Codice bilancio	Miss. 09 Prog. 02 Titolo 2 (09 02-2 02 01 09 003)	Gest.	RESIDUI/2008
RISTRUTTURAZIONI E REALIZZAZIONI ATTIVITA' SOCIO-AMBIENTALE ARREDO URBANO							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 380	del. 31-03-2017
numero 350/2008		del 30-03-2017		Immed. Eseguibile/Esecutiva			
Adeguamento e ristrutturazione dell'area sportiva della scuola secondaria di 1° grado "G.Pavoncelli" - 2° stato di avanzamento lavori e parcella professionale - Liquidazione corrispettivi.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		PREVISIONE ASSESTATA		145.243,72	145.243,72
Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		PRECEDENTI PAGAMENTI		40.773,75	40.773,75
Titolo	2	Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO		33.655,94	33.655,94
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO		74.429,69	
3o Livello	01	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA		70.814,03	70.814,03
4o Livello	09	Beni immobili					
5o Livello	003	Fabbricati ad uso scolastico					
SIOPE	2020109003						
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero	C.U.P. J39D16000200007
IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 33.655,94 dicensi TRENTATREMILASEICENTOCINQUANTACINQUE/94							
Per : Adeguamento e ristrutturazione dell'area sportiva della scuola secondaria di 1 grado G.Pavoncelli - 2 stato di avanzamento lavori e parcella professionale Liquidazione corrispettivi.Pagamento fattura Pugliese Costruzioni e Servizi srl							

CREDITORE (Codice: 16746)				
PUGLIESE COSTRUZIONE E SERVIZI SRL		VIA PIETRO MASCAGNI 44		
Cod.Fis. 03923810711 / P.Iva 03923810711		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:6643821E84 SALDO Fatt.n. 1/E del 24/03/2017 LAVORI DI RECUPERO DELLE AREE SPORTIVE DELLA SCUOLA DI I GRADO PAVONCELLI LIQ. 2 SAL Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 30.596,31 *Ritenuta 10%	33.655,94		2115
		3.059,63		
	Netto da Pagare:	30.596,31	30.596,31	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	3.059,63	
MODALITA' DI PAGAMENTO	Bonifico Credito Coop di canosa Loconia(IT 47 C 08606 78380 000000001327) - CIN: C - ABI: 08606 - CAB: 78380 - C/C: 000000001327			
	IBAN: IT47C0860678380000000001327			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugnicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1676 DEL 11/04/17 CAP. 34436 BIL. 2008

IMPEGNO N. 4580/5 LIQUIDAZIONE N. 350

IMPONIBILE € 30596,31
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 3059,63
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 33.655,94
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1101

CREDITORE: COD.N. (16746) 11 PRASSA PUGLIESE EDILIZIONE
E SERVIZI SRL

PAGAMENTO FATTURA N. 1/E DEL 24/03/2017

PROT. ENTRATA N. 9107 DEL 27.03.2017

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

LAVORI DI RICOVERO AREA SPORTIVA SCUOLA PAVONCECH' 2° SAT

TOTALE FATTURA € 33.655,94

CIG: 6643821E84 CUP: 33PD16 00020007

SIOPE: 2115

DOCUMENTI: Delibera N. 685/18 del 02/04/2016

Determ. N. 2205/221 del 23/12/2016

(Liquidazione) Determ. N. 380/76 del 31/03/2017



CITTA' DI CERIGNOLA

Settore Amministrativo Area Tecnica – Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione

Prot. n° 9906

Cerignola, 4-4-2017

OGGETTO: Lavori di recupero delle aree sportive della Scuola Media di 1° grado “G. Pavoncelli” di Cerignola. Liquidazione 2° SAL - CIG 6643821E84.

Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio
SEDE

Invito la S.V. a voler disporre il pagamento di complessivi € 33.655,94 a favore dell'impresa Pugliese Costruzioni e Servizi Srl, disposto con determinazione dirigenziale n. 380/76 del 31/03/2017, a titolo di corrispettivo per di recupero delle aree sportive della Scuola Media di 1° grado “G. Pavoncelli” di Cerignola, Liquidazione 2° SAL, come di seguito specificato:

- € 33.655,94, così come da fattura n. 1/E del 24/03/2017, identificativo Sdl n. 66600676, acquisita al prot. n. 9147 del 27/03/2017, Scuola Media di 1° grado “G. Pavoncelli” - CIG 6643821E84 – CUP J39D16000200007.

Il suddetto importo dovrà essere corrisposto mediante bonifico sul c/c bancario comunicato dall'interessato, ai sensi dell'art.3, comma 7 della L.136/2010.

La suddetta spesa di complessivi € 33.655,94 trova imputazione sul capitolo 34436 – residui passivi 2008 - impegno n. 4580 sub 5, liquidazione 350, giusta D.D. 380/76 del 31/03/2017.



Il Dirigente del Settore
Ing. Clorindo Izzillo

Si Allega:
dure;
fattura elettronica;
comunicazione ex art.3, comma 7, legge 139/2012 e s.m. e i.

Versione 1.0

Notifica Esito Committente

Identificativo SdI: 66600676

Riferimento Fattura

Numero Fattura: 1/E

Anno Fattura: 2017

Posizione Fattura: 1

Esito: **EC01** (Accettazione)

Descrizione: **Fattura accettata**

Message Id Committente: 001

Prot. n. 9147 del 28-3-2017

IL DIRIGENTE
SERVIZIO FISCALI E IMPOSTE
Ing. Corrado IZZELLO



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT04030410288**
 Progressivo di invio: **ALB946154**
 Formato Trasmissione: **FPA12**
 Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03923810711**
 Codice fiscale: **03923810711**
 Denominazione: **PUGLIESE COSTRUZIONI E SERVIZI S.R.L.**
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA PIETRO MASCAGNI**
 Numero civico: **44**
 CAP: **71042**
 Comune: **CERIGNOLA**
 Provincia: **FG**
 Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0885417489**
 Fax: **0885417489**
 E-mail: **info@pugliesecostruzioni.com**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00362170714**
 Denominazione: **Comune di Cerignola**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA DELLA REPUBBLICA**
 Numero civico: **1**
 CAP: **71042**
 Comune: **CERIGNOLA**
 Provincia: **FG**
 Nazione: **IT**



Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02046570426**
 Denominazione: **Namirial SPA**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-03-24** (24 Marzo 2017)
Numero documento: **1/E**
Importo totale documento: **33655.94**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo contratto: **N.441**
Data contratto: **2016-09-23** (23 Settembre 2016)
Codice Unitario Progetto (CUP): **J39D16000200007**
Codice Identificativo Gara (CIG): **6643821E84**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura*Nr. linea: 1*

Descrizione bene/servizio: **LAVORI DI RECUPERO DELLE AREE SPORTIVE DELLA SCUOLA DI I GRADO 'PAVONCELLI'-LIQ. 2° SAL. CAPITOLO 34436 IMPEGNO 4580 SUB 5 RE. 2008 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 685/98 DEL 02/09/2016 E DETERMINA N. 1205/221 DEL 23.12.2016 CUP J39D1639D16000200007 CIG 6643821E84**
Valore unitario: **30596.31**
Valore totale: **30596.31**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **30596.31**
Totale imposta: **3059.63**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **OPERAZIONE SOGGETTA ALLO SPLIT PAYMENT ART. 17 TER DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2017-03-24** (24 Marzo 2017)
Termini di pagamento (in giorni): **30**
Data scadenza pagamento: **2017-04-22** (22 Aprile 2017)
Importo: **30596.31**
Codice IBAN: **IT47C086067838000000001327**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_7010039	Data richiesta	31/03/2017	Scadenza validità	29/07/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PUGLIESE COSTRUZIONI E SERVIZI SRL
Codice fiscale	03923810711
Sede legale	VIA PIETRO MASCAGNI, 44 71042 CERIGNOLA (FG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



x. 26/12/2016

TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI
(art. 7, comma 1, lettera a, del D.L. 12/11/2010 n. 187)



Comune di Cerignola

Piazza della Repubblica, n. 1

71042 CERIGNOLA

OGGETTO: Appalto dei lavori di recupero delle aree sportive della Scuola secondaria di 1° grado "G. Pavoncelli" – contratto di appalto n. 441 del 23 settembre 2016. – Comunicazione resa ai sensi dell'art. 3, comma 7, Legge 13/08/2010, n. 136

Il sottoscritto: **PUGLIESE GIROLAMO**, nato a Cerignola il 2 marzo 1964 e residente a Cerignola in Viale G. Di Vittorio, n. 88, C.F.: PGL GLM 64C02 C514L, nella qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della Società **PUGLIESE COSTRUZIONI E SERVIZI S.r.l.**, con sede in Cerignola alla via Pietro Mascagni, n. 44, C.F. e P. IVA 03923810711, mail: info@pugliesecostruzioni.co. – pec.: pugliesecostruzionisrl@pec.it.

DICHIARA

che in relazione ai lavori in oggetto, il proprio conto corrente dedicato a commesse pubbliche, per gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ex legge n. 136/2010 s.m.i. è il seguente:

Istituto Bancario: **Banca di Credito Cooperativo di Canosa – Loconia Srl** sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti tramite bonifico bancario, così come previsto dalla L. 136/2010.

Filiale di CERIGNOLA:

COD. IBAN

I	T	4	7	C	0	8	6	0	6	7	8	3	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

I seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) delegati ad operare sul conto corrente dedicato:

a) Sig. **PUGLIESE GIROLAMO**, nato a Cerignola il 2 marzo 1964 e residente a Cerignola in Viale G. Di Vittorio, n. 88, C.F.: PGL GLM 64C02 C514L, operante in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della predetta Società.

Eventuali successive variazioni saranno comunicate alla Stazione Appaltante con le stesse modalità.

Di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi, previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Di essere informato, a norma dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è presentata.

Cerignola, primo dicembre 2016.

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE



Pugliese Costruzioni e Servizi Srl

Via P. Mascagni, 44

71042 CERIGNOLA (FG)

P.IVA: 03023810711


Si allega copia documento di identità

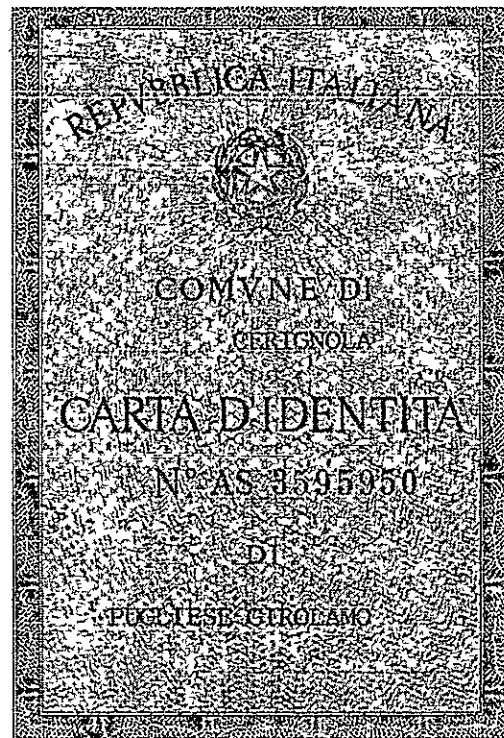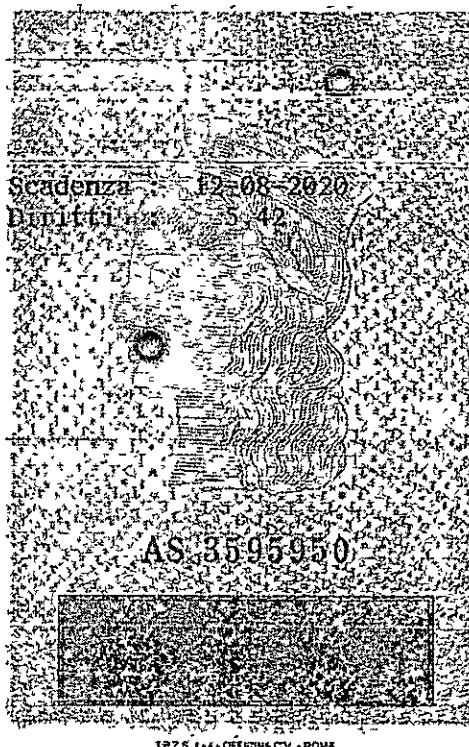

Cognome PUGLIESE
 Nome GIROLAMO
 nato il 02-03-1964
 (atto n° 00285 p.1 s.1 1964)
 a CERIGNOLA (FG)
 Cittadinanza Italiana
 Residenza CERIGNOLA (FG)
 Via LE DI VITTORIO GIUSEPPE 83 I.2
 Stato civile CONIUGATO
 Professione OMESSA - L. 127/97 ART. 2

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 176
 Capelli Brizzolati
 Occhi Castani
 Segni particolari NESSUNO

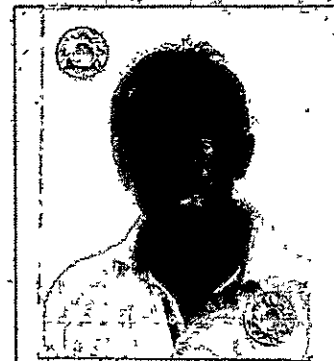

Firma del titolare [Signature]
CERIGNOLA il 12-08-2010

Impronta del dito
indice sinistro

Ufficio Anagrafe
 Istruttore Amministrativo
SINISI don Francesco



REPUBBLICA ITALIANA
 MINISTERO DELLE FINANZE

CODICE FISCALE PGLGLM64C02C514L

COGNOME PUGLIESE
 NOME GIROLAMO
 LUOGO DI NASCITA CERIGNOLA
 PROVINCIA FG DATA DI NASCITA 02/03/64

1993

Ministero delle Finanze



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto N.380/76

In data 31-03-17

OGGETTO: Adeguamento e ristrutturazione dell'area sportiva della scuola secondaria di 1° grado "G.Pavoncelli" - 2° stato di avanzamento lavori e parcella professionale - Liquidazione corrispettivi.

Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 31-03-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di marzo, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**LL.PP. - MANUTENZIONI -
AMBIENTE - VERDE PUBBLICO**

OO.PP.-MANUTENZIONE

Izzillo Ing. Clorindo, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 375 del 16/12/2014 è stata programmata la spesa di € 85.000,00 per la manutenzione e riattamento dello spazio sportivo ubicato all'interno dell'aria della Scuola Media "G. Pavoncelli" per renderlo fruibile sia agli alunni della scuola che alla collettività, mirando altresì all'obiettivo di rifunionalizzare un'area a scopo di socializzazione e prevenire fenomeni di devianza minorile.

Con determinazione dirigenziale n. 112/18 del 20/02/2015, data la ormai constatata carenza di personale interno alla struttura ed in attuazione della citata delibera G.C.n.375/2014, si è provveduto ad incaricare l'Arch. Fedele Antonio Rosaria, con studio in foggia al Viale 1° Maggio n.20, della progettazione definitiva ed esecutiva, direzioni lavori, misure e contabilità, rilievi topografici, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e certificazione di regolare esecuzione dell'intervento di "Recupero di due spazi d'attività esistenti nell'area della Scuola Media Pavoncelli.

In data 26 marzo 2015, acquisita al protocollo n.7333, l'arch. Fedele Antonio Rosania ha trasmesso il progetto in oggetto che veniva approvato con atto della Giunta comunale n. 272 del 23/10/2015.

La spesa progettuale di € 85.000,00 è stata imputata al capitolo 34436 dei RR.PP. 2008 - imp. n. 4580 e l'intervento è inserito nel Piano Triennale dei LL.PP. 2015-2017, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.198 del 30/07/2015.

Considerato che l'importo dei lavori per la realizzazione dell'intervento in argomento è inferiore alla soglia di cui all'art. 37 del D. Lgs. 50/2016 (€ 150.000,00), con determinazione dirigenziale n.504/53 del 04/07/2016 si è proceduto all'indizione della gara di appalto, individuando nella procedura negoziata il procedimento di scelta del contraente, di cui all'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50 del 18/04/2016, con il sistema di aggiudicazione di cui all'art.95 dello stesso D.Lgs n.50/2016.

L'invito di gara, prot. n. 19105 del 05/07/2016, è stato diramato in pari data via pec a n. 17 Ditte. Con ordine di servizio del 19/10/2016 è stata costituita la Commissione di gara.

Entro il termine fissato per la ricezione delle offerte (ore 12,00 del 18/07/2016) è pervenuto un solo plico contenente la documentazione e l'offerta della Ditta Pugliese Costruzioni e Servizi Srl.

Con determinazione dirigenziale n. 685/98 del 02/09/2016, preso atto della regolarità della procedura di gara - CUP: J39D16000200007 CIG: 6643821E84 - si è proceduto ad approvare il verbale di gara del 19/07/2016 ed aggiudicare definitivamente i lavori alla ditta Pugliese Costruzioni

e Servizi srl -con sede in Cerignola alla Via P. Mascagni n. 44 - per il prezzo di € 58.641,85, al netto del ribasso offerto del 7,825% (sconto di € 4,978,27) sulla base d'asta soggetta a ribasso di € 63.620,12, oltre € 886,42 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e, quindi, per l'importo di € 59.528,27, oltre IVA al 10% pari ad € 5.952,83.

Tra la citata aggiudicataria e l'Amministrazione è stato stipulato, per scrittura privata, il relativo contratto di appalto repertorio n.441 del 23/09/2016, registrato a Cerignola in data 30/09/2016 al n. 1035 S.3^a aa.pp.

I lavori sono stati consegnati in data 13/10/2016, giusto verbale in atti, e regolarmente e concretamente iniziati in pari data.

In fase esecutiva dei lavori sono emerse delle criticità per la risoluzione delle quali, su parere del RUP, il Direttore dei lavori ha proceduto alla redazione di apposita perizia di variante e suppletiva, contenuta nell'importo complessivo del finanziamento assunto per la realizzazione dell'opera.

La variante tecnica, approvata con determinazione dirigenziale n.1205/221 del 23/12/2016, più onerosa rispetto alla iniziale progettazione, ha previsto la revisione del progetto, senza alterarne l'importazione originaria, per il recupero e l'ottimale distribuzione delle somme a disposizione da destinare ai lavori a corpo.

Per effetto della stessa l'importo per lavori è stato rideterminato in € 61.953,82 al netto del ribasso d'asta del 7,825% (applicato sull'importo computato di 67.213,26), mentre gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso sono rimasti confermati in € 886,42 stabilendo, pertanto, in € 62.840,24 il nuovo importo contrattuale, che ha trovato copertura attraverso la parziale utilizzazione delle economie di gara (riportate nella voce "imprevisti").

La ditta aggiudicataria dei lavori, Pugliese Costruzioni e Servizi Srl, con la sottoscrizione dell'atto di sottomissione, datato 30 novembre 2016, ha accettato l'esecuzione dei lavori di perizia agli stessi patti e condizioni previsti nel contratto principale repertorio n. 441 stipulato in data 23/09/2016 nonché ai nuovi prezzi individuati e concordati sulla base dei prezzi elementari del citato contratto, tra la Stazione Appaltante/D.L. e l'impresa, assoggettati anch'essi al ribasso contrattuale.

Il termine per la esecuzione dei lavori è stato prorogato di 10 giorni, fatte salve eventuali sospensioni dei lavori.

Il quadro economico di perizia ha confermato la spesa progettuale di € 85.000,00, come di seguito ridefinita, e

trova imputazione al capitolo 34436, cod. bilancio 09.02-2.02.01.09.000, impegno 4580:

	Pre-gara €	Post-gara €	Variante €
Lavori			
lavori	54.452,22		
Incidenza manodopera	9.167,90		
A. Lavori	63.620,12	58.641,85	61.953,82
costi diretti sicurezza	580,78	580,78	
costi indiretti sicurezza	305,64	305,64	
C) COSTI PER ATTUAZIONE SICUREZZA	886,42	886,42	886,42
	64.506,54	59.528,27	62.840,24
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA sui lavori 10% di (A+B)	6.450,65	5.952,83	6.284,02
spese tecniche			
Progettazione esecutiva. Direzione lavori, misure e contabilità. Rilievi topografici. Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.	9.500,00	9.500,00	10.950,00
Certificato di regolare esecuzione	650,00	650,00	650,00
CNPAIA 4% di d2 + d3	406,00	406,00	464,00
IVA su spese tecniche E CNPAIA 22%	2.322,32	2.322,32	2.654,08
incentivo RUP	1.161,12	1.161,12	1.157,65
per lavori a fattura ed imprevisti	3,37	5.479,47	0,00
D) IN UNO A DISPOSIZIONE	20.493,46	25.471,73	22.159,75
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL PROGETTO	85.000,00	85.000,00	85.000,00

Ciò stante, il direttore dei lavori, arch. Fedele A. Rosania, ha trasmesso, con nota acquisita in data 23/03/2017 al prot. n. 9020, il 2° ed ultimo stato di avanzamento dei lavori, eseguiti a tutto il 09/03/2017 dalla ditta aggiudicataria, "Pugliese Costruzioni e Servizi Srl", per il complessivo importo netto di € 62.840,24, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 886,43, nonché il relativo certificato di pagamento n.2, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, ing. Clorindo Izzillo, con il quale, dedotti le ritenute di legge e l'acconto di cui al 1° SAL, è stato accertato e riconosciuto a favore della predetta Ditta appaltatrice il credito di € 30.596,31, oltre Iva nella misura come dovuta del 10% pari ad € 3.059,63 e, quindi, di complessivi € 33.655,94.

Unitamente allo stato di avanzamento il professionista ha altresì trasmesso la parcella inerente gli onorari per la direzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità dei lavori in argomento, maturati con la emissione del detto 2° ed ultimo SAL, dell'importo di € 3.000,00, oltre Cassa previdenziale 4% ed iva al 22% e, quindi per un importo complessivo di € 3.806,40.

Considerata la regolarità degli atti, si ritiene di procedere all'approvazione:

- del 2° ed ultimo stato di avanzamento lavori e relativo certificato di pagamento;
- della parcella professionale a tutto il 2° ed ultimo SAL;

con contestuale riconoscimento dei crediti di seguito liquidabili a favore:

- dell'impresa "Pugliese Costruzioni e Servizi Srl", dell'accertato credito di complessivi € 33.655,94, iva al 10% compresa, a titolo di corrispettivo 2° SAL, che trova capienza al finanziamento assunto per la realizzazione dell'opera ed imputazione al capitolo 34436 dei RR.PP. 2008, imp. n. 4580 sub 5;
- dell'arch. Fedele Antonio Rosania, dell'importo di € 3.806,40, contributo cnpaia 4% ed iva al 22% compresi, che trovano altresì imputazione al capitolo 34436 dei RR.PP. 2008, imp. n. 4580 sub 4 liquidazione 71.

Al progetto in argomento, è stato assegnato il seguente CUP: J39D16000200007; ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex Art.3 L. n.136 dell'13 agosto 2010, recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12/11/2010, n.187 convertito con modificazioni nella legge n.217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", all'attività inerente l'esecuzione dei lavori è stato assegnato il codice CIG:6643821E84 mentre a quella relativa le prestazioni tecnico-professionali il CIG:Z491321D03.»

Visto il D. Lgs. 50 del 18/04/2016;

Ai sensi dell'artt. 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, si dispone la pubblicazione del presente atto, nella sezione del link "*Amministrazione trasparente*", sotto sezione "bandi di gara e contratti";

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità

finanziaria" che prevede che : "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 21/03/2016, prot. n. 60/Gab., con il quale si affida all'ing. Clorindo Izzillo, la Dirigenza del Settore comprendente i Servizi Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente e Verde Pubblico;

Visto il decreto del Sindaco del 18/09/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquichio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

Visto il decreto del Sindaco del 03/08/2016, prot. n. 169/GAB., con il quale il Dirigente del Settore Risorse Umane - Servizi Demografici - Sviluppo Economico, Valentino dott.ssa Maria Concetta, sostituisce temporaneamente il Segretario Generale, nonché Dirigente del Settore Segreteria Affari Generali, Claudione dott.ssa Rosaria, in ferie dal 16/08/2016 al 02/09/2016;

D E T E R M I N A

1) la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di approvare il 2° stato di avanzamento dei lavori di recupero delle aree sportive della scuola secondaria della scuola secondaria G. Pavoncelli - CUP: J39D16000200007 CIG: 6643821E84 - emesso dal direttore dei lavori, arch. Fedele Antonio Rosania, per il complessivo importo netto di € 62.840,24, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 886,43, ed eseguiti a tutto il 30/11/2016 dall'appaltatrice "Pugliese Costruzioni e Servizi Srl", in dipendenza del contratto di appalto stipulato in data 23/09/2016 repertorio n.441 e successivo atto di sottomissione approvato con determinazione n.1205/221 del 23.12.1026, nonché il relativo certificato di pagamento n.2, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, ing. Clorindo Izzillo, con il quale, dedotti le ritenute di legge e l'acconto di cui al 1° SAL, è stato accertato e riconosciuto a favore della predetta Appaltatrice il credito di € 30.596,31, oltre Iva nella misura come dovuta del 10% pari ad € 3.059,63 e, quindi, di complessivi € 33.655,94;

3) di approvare la parcella esibita dall'arch.Fedele Antonio Rosania inerente gli onorari per la direzione, coordinamento della sicurezza, misura e contabilità dei lavori in argomento, maturati con la emissione del detto 1°SAL, pari ad € 3.000,00, oltre Cassa previdenziale 4% ed iva al 22% e, quindi, per un importo complessivo di € 3.806,40;

4) di liquidare gli accertati crediti a favore degli aventi causa di cui in seguito:

- dell'impresa Pugliese Costruzioni e Servizi Srl di € 33.655,94, iva compresa, a titolo di corrispettivo 2° SAL CIG:6643821E84, giusta fattura elettronica n.1/E del 24.03.2017, acquisita al prot.n. 9147 del 27/03/2017-file n.66600676;
- del professionista Arch. Fedele Antonio Rosania di € 3.806,40, contributo cnpaia 4% ed iva al 22% compresi, a titolo di competenze per direzione, coordinamento sicurezza, misura e contabilità dei lavori maturati al 1°SAL - Z491321D03, giusta fattura elettronica n.02PA/2017 del 30.03.2017, acquisita al prot.n.9614 del 30/03/2017 - file n. 67005546;

5) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2017, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

6) di dare atto che la spesa di complessivi € 37.462,34 trova imputazione sul capitolo 34436, cod.bilancio 09.02-2.02.01.09.000, RE 2008, imp.n.4580, a valere quanto ad € 33.655,94 sub 5, e ad € 3.806,40 sul medesimo capitolo 34436 dei RR.PP.2008, imp.n.4580 sub 4 liquidazione 71;

7) di liquidare la spesa di € 33.655,94, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n.4/2 al D. Lgs. 118/2011, al suddetto capitolo ed impegni, imputandola al bilancio 2017;

8) di dare atto che la redazione del presente atto è stata assegnata alla sig.ra Battaglino Anna, in servizio presso l'Ufficio Lavori Pubblici.

**CITTÀ DI CERIGNOLA**

(Provincia di Foggia)

Piazza della Repubblica N. 1

71042 – Cerignola

Partita Iva e C.F. 00362170714

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA**

Atto N. 380/76

In data 31-03-17

OGGETTO: Adeguamento e ristrutturazione dell'area sportiva della scuola secondaria di 1° grado "G.Pavoncelli" - 2° stato di avanzamento lavori e parcella professionale - Liquidazione corrispettivi.

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 33.655,94 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione
33.655,94	09.02-2.02.01.09.003	34436/	2008	350	31-12-2008

Cerignola, li 31-03-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Izzillo Ing. Clorindo

Copia conforme all'originale, **31-03-17**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **01-04-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **9746** del **31-03-17** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **31-03-17**.

Dal Palazzo di Città, **31-03-17**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **01-04-17** al **15-04-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **17-04-17**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Rosaria

PUGLIESE COSTRUZIONI E SERVIZI S.R.L.
VIA PIETRO MASCAGNI,44

71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva 03923810711 C.F. 03923810711
Codice 16746

Spett.le
Comune di Cerignola

PIAZZA DELLA REPUBBLICA,1
71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 1/E del 24-03-2017

Protocollo 9147 del 27-03-17

Pag. 1 di 1

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	LAVORI DI RECUPERO DELLE AREE SPORTIVE DELLA SCUOLA DI I GRADO 'PAVONCELLI'-LIQ. 2Â° SAL. CAPITOLO 34436 IMPEGNO 4580 SUB 5 RE. 2008 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 685/98 DEL 02/09/2016 E DETERMINA N. 1205/221 DEL 23.12.2016 CUP J39D1639D16000200007 CIG 6643821E84			30.596,310000		30.596,31	10

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	30.596,31
----------------	-------	----------	------------------	-----------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		10	30.596,31	3.059,63 S

Imponibile	30.596,31
Imposta	3.059,63
Totale	33.655,94
Iva Vs. carico art.17-ter	-3.059,63
Netto a pagare	30.596,31

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
22-04-2017

IBAN
IT47C086067838000000001327



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto N.1205/221

In data 23-12-16

OGGETTO: Adeguamento e ristrutturazione dell'area sportiva della scuola secondaria di 1° grado "G.Pavoncelli" - Approvazione perizia di variante e suppletiva, 1° stato di avanzamento lavori e parcella professionale - Liquidazione corrispettivi.

Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 23-12-2016
Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemilasedici, il giorno ventitre del mese di
dicembre, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**LL.PP. - MANUTENZIONI -
AMBIENTE - VERDE PUBBLICO**

OO.PP.-MANUTENZIONE

Izzillo Ing. Clorindo, responsabile del Settore, ha adottato
la seguente determinazione:

«Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 375 del 16/12/2014 si programmava la spesa di € 85.000,00 per la manutenzione e riattamento dello spazio sportivo ubicato all'interno dell'aria della Scuola Media "G. Pavoncelli" per renderlo fruibile sia agli alunni della scuola che alla collettività, mirando altresì all'obiettivo di rifunionalizzare un'area a scopo di socializzazione e prevenire fenomeni di devianza minorile.

Con determinazione dirigenziale n. 112/18 del 20/02/2015, data la ormai constatata carenza di personale interno alla struttura ed in attuazione della citata delibera G.C. n.375/2014, si è provveduto ad incaricare l'Arch. Fedele Antonio Rosaria, con studio in foggia al Viale 1° Maggio n. 20, della progettazione definitiva ed esecutiva, direzioni lavori, misure e contabilità, rilievi topografici, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e certificazione di regolare esecuzione dell'intervento di "Recupero di due spazi d'attività esistenti nell'area della Scuola Media Pavoncelli.

In data 26 marzo 2015, acquisita al protocollo n.7333, l'arch. Fedele Antonio Rosania ha trasmesso il progetto in oggetto che veniva approvato con atto della Giunta comunale n. 272 del 23/10/2015.

La spesa progettuale di € 85.000,00 è stata imputata al capitolo 34436 dei RR.PP. 2008 - imp. n. 4580/sub 4 e l'intervento è inserito nel Piano Triennale dei LL.PP. 2015-2017, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.198 del 30/07/2015.

Considerato che l'importo dei lavori per la realizzazione dell'intervento in argomento è inferiore alla soglia di cui all'art. 37 del D. Lgs. 50/2016 (€ 150.000,00), con determinazione dirigenziale n.504/53 del 04/07/2016 si è proceduto all'indizione della gara di appalto, individuando nella procedura negoziata il procedimento di scelta del contraente, di cui all'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50 del 18/04/2016, con il sistema di aggiudicazione di cui all'art.95 dello stesso D.Lgs n.50/2016.

L'invito di gara, prot. n. 19105 del 05/07/2016, è stato diramato in pari data via pec a n. 17 Ditte. Con ordine di servizio del 19/10/2016 è stata costituita la Commissione di gara.

Entro il termine fissato per la ricezione delle offerte (ore 12,00 del 18/07/2016) è pervenuto un solo plico contenente la documentazione e l'offerta della Ditta Pugliese Costruzioni e Servizi Srl.

Con determinazione dirigenziale n. 685/98 del 02/09/2016, preso atto della regolarità della procedura di gara - CUP: J39D16000200007 CIG: 6643821E84 - si è proceduto ad approvare il verbale di gara del 19/07/2016 ed aggiudicare definitivamente i lavori alla ditta Pugliese Costruzioni

e Servizi srl -con sede in Cerignola alla Via P. Mascagni n. 44 - per il prezzo di € 58.641,85, al netto del ribasso offerto del 7,825% (sconto di € 4,978,27) sulla base d'asta soggetta a ribasso di € 63.620,12, oltre € 886,42 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e, quindi, per l'importo di € 59.528,27, oltre IVA al 10% pari ad € 5.952,83.

Tra la citata aggiudicataria e l'Amministrazione è stato stipulato, per scrittura privata, il relativo contratto di appalto repertorio n.441 del 23/09/2016, registrato a Cerignola in data 30/09/2016 al n. 1035 S.3^ aa.pp.

I lavori sono stati consegnati in data 13/10/2016, giusto verbale in atti, e regolarmente e concretamente iniziati in pari data.

In fase esecutiva dei lavori sono emerse delle criticità in merito alla sostituzione della pavimentazione sportiva esistente sulla pista di atletica e sull'area del campo di basket nonché dalla constatazione del motivo di pericolo, per l'incolumità degli alunni durante lo svolgimento dell'attività sportiva, creati: dalla tubazione di adduzione del gas allocata sulla muratura di mattoni posta a ridosso della pista di salto in lungo; dal cassone di metallo con spigoli vivi nel quale è posizionato il contatore di misurazione del gas metano, collegato alla suddetta tubazione; da pali della illuminazione posti a ridosso del parapetto della recinzione.

In relazione, per la risoluzione di queste problematiche, ricorrendo i presupposti di cui al comma 1 dell'art. 149 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, la Direzione lavori, sentito per le vie brevi ed avendo ricevuto adeguata autorizzazione dall'ing. Clorindo Izzillo, Responsabile del Procedimento del progetto, ha proceduto alla redazione di apposita perizia di variante e suppletiva, contenuta nell'importo complessivo del finanziamento assunto per la realizzazione dell'opera.

Il Direttore dei lavori, arch. Fedele Rosania, con nota acquisita in data 30/11/2016 al prot. n. 35353, ha provveduto a trasmettere la variante tecnica al progetto - determinata dalle motivazioni di cui innanzi e dettagliatamente riportate nella relazione tecnica- la quale prevede due tipologie di intervento: la prima inerente a modifiche indispensabili all'esecuzione di categorie di lavoro per la pratica dell'attività sportiva; la seconda l'esecuzione di categorie di lavori finalizzate alla migliore gestione in sicurezza della pratica dell'attività sportiva.

Per la realizzazione della variante, più onerosa di quella inizialmente adottata nella progettazione, si è reso necessario procedere a revisionare il progetto, senza alterarne l'importazione originaria, per il recupero e l'ottimale distribuzione delle somme a disposizione da destinare ai lavori a corpo.

La stessa si compone dei seguenti elaborati tecnico-amministrativi, debitamente vistati dal RUP:

- R.01 Elenco atti tecnico-amministrativi ed elaborati grafici;
- R.02 Relazione tecnico illustrativa;
- R.03 Computo metrico estimativo e Q.E. di spesa;
- R.04 Quadro comparativo di spesa;
- R.05 Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
- Abvar.01 Stato futuro - Planimetria generale sc 1:200;
- Abvar.02 Stato futuro - Particolari costruttivi sc 1:200.

La variante ridetermina l'importo per lavori in € 61.953,82 al netto del ribasso d'asta del 7,825% (applicato sull'importo computato di 67.213,26), mentre conferma gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso in € 886,42 stabilendo, pertanto, in € 62.840,24 il nuovo importo contrattuale, con l'incremento (rispetto all'originario di € 59.528,27) di € 3.311,97 pari al 5,56% e, quindi, nei limiti previsti dalla vigente normativa, che trova copertura attraverso la parziale utilizzazione delle economie di gara (riportate nella voce "imprevisti").

Con la sottoscrizione dell'atto di sottomissione la ditta aggiudicataria dei lavori, Pugliese Costruzioni e Servizi Srl, dichiara e si obbliga di accettare l'esecuzione dei lavori di perizia agli stessi patti e condizioni previsti nel contratto principale repertorio n. 441 stipulato in data 23/09/2016 ed prezzi unitari in esso contemplati (con modifica di alcune voci in più ed in meno o azzerate, per le sole quantità) nonché ai nuovi prezzi individuati e concordati sulla base dei prezzi elementari del citato contratto, tra la Stazione Appaltante/D.L. e l'impresa, assoggettati anch'essi al ribasso contrattuale del 7,825%.

Il termine per la esecuzione dei lavori, già fissato al 28/12/2016, per effetto della variante in argomento, viene prorogato al 03/01/2017, fatte salve eventuali sospensioni dei lavori.

Il quadro economico di perizia conferma la spesa progettuale di € 85.000,00, come di seguito definita, e trova imputazione al capitolo 34436, cod. bilancio 09.02-2.02.01.09.000, impegno 4580:

	Pre-gara €	Post-gara €	Variante €
Lavori			
lavori	54.452,22		
Incidenza manodopera	9.167,90		
A. Lavori	63.620,12	58.641,85	61.953,82
costi diretti sicurezza	580,78	580,78	
costi indiretti sicurezza	305,64	305,64	
C) COSTI PER ATTUAZIONE SICUREZZA	886,42	886,42	886,42
	64.506,54	59.528,27	62.840,24
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA sui lavori 10% di (A+B)	6.450,65	5.952,83	6.284,02
spese tecniche			

Progettazione esecutiva. Direzione lavori, misure e contabilità. Rilievi topografici. Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.	9.500,00	9.500,00	10.950,00
Certificato di regolare esecuzione	650,00	650,00	650,00
CNPAIA 4% di d2 + d3	406,00	406,00	464,00
IVA su spese tecniche E CNPAIA 22%	2.322,32	2.322,32	2.654,08
incentivo RUP	1.161,12	1.161,12	1.157,65
per lavori a fattura ed imprevisti	3,37	5.479,47	0,00
D) IN UNO A DISPOSIZIONE	20.493,46	25.471,73	22.159,75
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL PROGETTO	85.000,00	85.000,00	85.000,00

Lo stesso direttore dei lavori, arch. Fedele A. Rosania, ha trasmesso, con nota acquisita in data 01.11.2016 al prot. n. 35523, il 1° stato di avanzamento dei lavori, eseguiti a tutto il 30/11/2016 dalla ditta aggiudicataria, "Pugliese Costruzioni e Servizi Srl", per il complessivo importo netto di € 32.093,23, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 282,04, nonché il relativo certificato di pagamento n.1, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, ing. Clorindo Izzillo, con il quale, dedotte le ritenute di legge, è stato accertato e riconosciuto a favore della predetta Ditta appaltatrice il credito di € 31.934,17, oltre Iva nella misura come dovuta del 10% pari ad € 3.193,42 e, quindi, di complessivi € 35.127,59.

Unitamente allo stato di avanzamento il professionista ha altresì trasmesso la parcella inerente gli onorari per la redazione della perizia di variante e suppletiva dell'importo di € 1.450,00, nonché per la direzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità dei lavori in argomento, maturati con la emissione del detto 1°SAL, dell'importo di € 3.000,00, oltre Cassa previdenziale 4% ed iva al 22% e, quindi per un importo complessivo di 5.646,16.

Considerata la regolarità degli atti, si ritiene di procedere all'approvazione:

- della perizia di variante e suppletiva;
- del 1° stato di avanzamento lavori e relativo certificato di pagamento;
- della parcella professionale;

con contestuale riconoscimento dei crediti di seguito liquidabili a favore:

- dell'impresa "Pugliese Costruzioni e Servizi Srl", dell'accertato credito di complessivi € 35.127,59, iva al 10% compresa, a titolo di corrispettivo 1° SAL, che trova capienza al finanziamento assunto per la realizzazione dell'opera ed imputazione al capitolo 34436 dei RR.PP. 2008, imp. n. 4580 sub 5, il quale per effetto della perizia dovrà essere aumentato di € 3.643,17 (da originari € 65.481,10 ad € 69.124,27);
- dell'arch. Fedele Antonio Rosania, dell'importo di € 5.646,16, contributo cnpaia 4% ed iva al 22% compresi, che trovano altresì imputazione al capitolo 34436 dei RR.PP.2008, imp.n. 4580 sub 4 liquidazione 71, la quale,

per effetto dei riconosciuti compensi per la redazione della perizia di variante e suppletiva, pari ad € 1.450,00 oltre contributo cnpaia ed IVA, dovrà essere aumentata di € 1.839,76 (da originarie 12.878,32 a € 14.718,08).

Al progetto in argomento, è stato assegnato il seguente CUP: J39D16000200007; ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex Art.3 L. n.136 del 13 agosto 2010, recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12/11/2010, n.187 convertito con modificazioni nella legge n.217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", all'attività inerente l'esecuzione dei lavori è stato assegnato il codice CIG:6643821E84 mentre a quella relativa le prestazioni tecnico-professionali il CIG:Z491321D03.»

Visto il D. Lgs. 50 del 18/04/2016;

Ai sensi dell'artt. 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, si dispone la pubblicazione del presente atto, nella sezione del link "*Amministrazione trasparente*", sotto sezione "bandi di gara e contratti";

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che : "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 21/03/2016, prot. n. 60/Gab., con il quale si affida all'ing. Clorindo Izzillo, la Dirigenza del Settore comprendente i Servizi Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente e Verde Pubblico;

Visto il decreto del Sindaco del 18/09/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquichio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

Visto il decreto del Sindaco del 03/08/2016, prot. n. 169/GAB., con il quale il Dirigente del Settore Risorse Umane - Servizi Demografici - Sviluppo Economico, Valentino dott.ssa Maria Concetta, sostituisce temporaneamente il Segretario Generale, nonché Dirigente del Settore Segreteria Affari Generali, Claudione dott.ssa Rosaria, in ferie dal 16/08/2016 al 02/09/2016;

D E T E R M I N A

1) la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di approvare la perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di recupero delle aree sportive della scuola secondaria della scuola secondaria G. Pavoncelli - CUP: J39D16000200007 CIG: 6643821E84 - in corso di esecuzione a cura dell'impresa "Pugliese Costruzioni e Servizi Srl", in virtù del contratto di appalto stipulato in data 23/09/2016 repertorio n.441, registrato a Cerignola in data 30/09/2016 al n. 1035 S.3^ aa.priv., redatta dal Direttore dei lavori, arch. Fedele Antonio Rosania, in conformità alle vigenti norme in materia di LL.PP. e favorevolmente vistata dal Direttore del Settore, ing. Clorindo Izzillo, in qualità anche di Responsabile del Procedimento;

3) di approvare l'atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa "Pugliese Costruzioni e Servizi Srl", immediatamente esecutivo per la stessa, in base al quale essa Impresa si impegna e si obbliga ad eseguire i maggiori lavori di cui alla presente perizia agli stessi patti e condizioni previsti nel citato contratto principale repertorio n.441/2016 ed ai prezzi in esso contemplati, nonché ai nuovi prezzi, individuati e concordati tra la Stazione Appaltante/D.L. e l'Impresa, quali riportati nello stesso atto di sottomissione, assoggettati anch'essi al ribasso contrattuale del 7,825%;

4) di dare atto che con la presente perizia di variante e suppletiva:

- l'importo per lavori viene rideterminato in € 61.953,82 al netto del ribasso d'asta del 7,825%, mentre vengono confermati gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso in € 886,42, stabilendo in € 62.840,24 il nuovo importo contrattuale, con l'incremento (rispetto all'originario di € 59.528,27) di € 3.311,97 pa-

- ri al 5,56% e, quindi, nei limiti previsti dalla vigente normativa, che trova copertura unitamente alla corrispondente IVA attraverso la parziale utilizzazione delle economie di gara (riportate nella voce "imprevisti");
- la intera spesa progettuale resta confermata in complessivi € 85.000,00, secondo il quadro nuovo economico analitico di spesa in narrativa dettagliatamente riportato, che si approva;
 - il termine per la esecuzione dei lavori, già fissato al 28/12/2016, viene prorogato al 03/01/2017, fatte salve eventuali sospensioni dei lavori;

5) di approvare il 1° stato di avanzamento dei lavori emesso dal direttore dei lavori per il complessivo importo netto di € 32.093,23, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 282,04, ed eseguiti a tutto il 30/11/2016 dall'appaltatrice, in dipendenza del contratto di appalto rep.441/2016, nonché il relativo certificato di pagamento n.1, con il quale è stato accertato e riconosciuto a favore della predetta Ditta Pugliese Costruzioni e Servizi Srl il credito di € 31.934,17, oltre Iva nella misura come dovuta del 10% pari ad € 3.193,42 e, quindi, di complessivi € 35.127,59;

6) di approvare la parcella esibita dall'arch.Fedele Antonio Rosania inerente gli onorari per la redazione della perizia di variante e suppletiva pari ad € 1.450,00, nonché per la direzione, coordinamento della sicurezza, misura e contabilità dei lavori in argomento, maturati con la emissione del detto 1°SAL, pari ad € 3.000,00, oltre Cassa previdenziale 4% ed iva al 22% e, quindi, per un importo complessivo di 5.646,16;

7) di liquidare e pagare, conseguentemente, gli accertati crediti a favore degli aventi causa di cui in seguito:

- dell'impresa Pugliese Costruzioni e Servizi Srl di € 35.127,59, iva compresa, a titolo di corrispettivo 1° SAL CIG:6643821E84, giusta fattura elettronica n.1/E del 01.12.2016, acquisita al prot.n.35576 del 02/12/2016 - file n.56357117;
- del professionista Arch. Fedele Antonio Rosania di € 5.646,16, contributo cnpaia 4% ed iva al 22% compresi, a titolo di competenze per la redazione della perizia di variante e suppletiva, nonché per direzione, coordinamento sicurezza, misura e contabilità dei lavori maturati al 1°SAL - Z491321D03, giusta fattura elettronica n.04PA/2016 del 02.12.2016, acquisita al prot.n.37697 del 20/12/2016 - file n. 58068886;

8) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2016, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

9) di dare atto che la spesa di complessivi € 40.773,75 trova imputazione, quanto ad € **35.127,59** sul capitolo 34436 dei RR.PP. 2008, imp.n.4580 sub 5, il quale per effetto della intervenuta perizia dovrà essere aumentato di € 3.643,17 (da originari € 65.481,10 ad € 69.124,27), e ad € **5.646,16** sul medesimo capitolo 34436 dei RR.PP. 2008, imp.n.4580 sub 4 liquidazione 71, la quale, per effetto dei riconosciuti compensi per la redazione della perizia di variante e suppletiva, pari ad € 1.839,76 contributi cnpaia ed IVA compresi, dovrà essere aumentata di detti € 1.839,76 (da originarie 12.878,32 a € 14.718,08);

10) di impegnare la detta spesa di € 40.773,75, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n.4/2 al D. Lgs. 118/2011, al suddetto capitolo ed impegni, imputandola al bilancio 2016;

11) di dare atto che la redazione del presente atto è stata assegnata alla sig.ra Battaglini Anna, in servizio presso l'Ufficio Lavori Pubblici.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Izzillo Ing. Clorindo

Copia conforme all'originale, **23-12-2016**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **24-12-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **38101** del **23-12-16** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **23-12-16**.

Dal Palazzo di Città, **23-12-2016**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **24-12-16** al **07-01-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **09-01-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201700000515475

Codice Fiscale: 03923810711

Identificativo Pagamento: PROT. 9906/2017

Data Inserimento: 11/04/2017 - 13:34

Importo: 30596,31 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA
