



Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3594

del 26-10-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	31961	Art.	0	Codice di bilancio	205010100	Gestione	RESIDUI/2013
COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE FOSSE GRANARIE - FINANZ. REG.LE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 651	del. 30-09-2015
numero 346		del 29-09-2015		Immed. Eseguita/Esecutiva			
PO FESR Puglia 2007/2013 - Asse IV, Linea d'Intervento 4.2, Azione 4.2.1. - Recupero e salvaguardia delle Fosse Granarie - 2' Stralcio - Approvazione stato finale dei lavori, certificato di regolare esecuzione, competenze tecnico-professionali - Liqui							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		PREVISIONE ASSESTATA		462.813,55	1.153.500,56
Funzione	5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		PRECEDENTI PAGAMENTI		222.908,80	652.824,37
Servizio	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE		PRESENTE IMPORTO		57.380,61	57.380,61
Intervento	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		TOTALE PAGATO		280.289,41	710.204,98
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		182.524,14	443.295,58
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 4) CONTRIBUTI REGIONALI					Fruttifero	C.U.P. J32C13000050002
IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 57.380,61 diconsì CINQUANTASETTEMILATRECENTOTTANTA/61							
Per : PO FESR Puglia 2007/2013 - Asse IV, Linea d'Intervento 4.2, Azione 4.2.1. - Recupero e salvaguardia delle Fosse Granarie - 2' Stralcio - Approv. stato finale dei lavori, cert. di regolare esecuzione, comp. tecnico-prof. - Liqu. acc. su fatt. 15/2015							

CREDITORE (Codice: 14735)				
MASELLIS S.U.R.L.		RACC. STRAD. DE REVEL - STR. PROV. 90		
Cod. Fis. 06710120723 / P. Iva 06710120723		SANNICANDRO DI BARI (BA)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. SIOPE
1	CIG: 5783572299 ACCONTO Fatt.n. FATTPA 15_15 del 08/10/2015 Lavori di recupero delle Fosse Granarie 2 stralcio. Impresa Masellis Surl. Stato finale lavori. Trib. 0022 IVA PARTE CAPITALE 10,00% su 52.164,00 *Ritenuta		57.380,61	2113
	Netto da Pagare:		52.164,19	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		52.164,19	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA POPOLARE DI BARI/ FILIALE POGGIOFRANCO - CIN: D - ABI: 05424 - CAB: 04002 - C/C: 000001003595			
	IBAN: IT46D0542404002000001003595			

UNICO PAGAMENTO/BONIFICO
DI € 71.780,58
VEDI MANDATI N. 3594 - 3595

PAGATO
28 OTT. 2015
Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8779



Dirig. Set. Finanziario
Dott. ssa R. D. Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

Rif. 33/64

MANDATO N. 3594 CAP. 31961 BIL. 2013

IMPEGNO N. 1196/1 LIQUIDAZIONE N. 346

IMPONIBILE € 52164,19
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 5216,42
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 57380,61
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3038

CREDITORE: COD.N. (14735) MASSIMIS SRL

PAGAMENTO FATTURA N. 15/15

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: LIQ. ACCONTO SU FATT 15/15 PER FESUR.
LAVORI DI RECUPERO E SALVAGUARDIA FOSSE GRANARIE
2° STRALCIO - STATO FINALE LAVORI

TOTALE FATTURA € 183461,01

CIG: 5783572299 CUP: J32E13000050002

SIOPE: M13

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 651/15 del 30/09/15



DG.C. 203

Bando Aderibile

COMUNE DI CERIGNOLA

Settore Area Tecnica

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione

Prot. n° 26981

Cerignola,

19 OTT. 2015

OGGETTO: Lavori di recupero e salvaguardia Fosse Granarie 2° Stralcio - Finanziamento Programma Operativo FESR Puglia 2007-2013 - Asse IV Linea d'intervento 4.2 - **Impresa Masellis Surl** - Contratto rep.n.166 del 17.11.2014 - **Cod. Identif. CUP J32C13000050002 - GIG 5783572299 - Liquidazione acconto su corrispettivo stato finale dei lavori.**

Dirigente Servizi Finanziari
dott.ssa Antonella Dituccio

SEDE

Invito la S.V. a voler disporre il pagamento della somma di € 78.958,64, IVA compresa, a favore dell'Impresa Masellis Surl, a titolo di acconto sul corrispettivo di complessivi € 183.461,01 alla stessa dovuto per la esecuzione dei lavori di recupero e salvaguardia Fosse Granarie 2° Stralcio, contabilizzati allo stato finale dei lavori, giusta quanto disposto con determinazione dirigenziale n.651/15 del 30.09.2015 di approvazione e liquidazione dal suddetto stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori, nonché della conseguente fattura elettronica FATTPA 15_15 emessa in data 08.10.2015 - file n. 20205616 - acquisita al prot. n. 26590 del 15.10.2015.

Il suddetto importo dovrà essere corrisposto mediante bonifico da effettuarsi sul conto corrente bancario opportunamente comunicato dalla stessa impresa, giusta dichiarazione già in atti di codesto Servizio, ai fini della tracciabilità dei movimenti finanziari in questione (art.3, comma 7 della L.136/2010). Il relativo mandato di pagamento dovrà essere emesso in duplice esemplare, ai fini della rendicontazione delle spese alla Regione Puglia, Ente finanziatore dell'opera.

La spesa di € 78.958,64, trova imputazione, giusta la richiamata D.D. n.651/15 del 30.09.2015 all'intervento 2.05.01.01, cap.31961 Bil.2013, impegno 1196/1 liquidazione n.346, finanziato con risorse regionali PO FESR 2007-2013 - Asse IV, Linea 4.2, a valere per € 57.380,61 sulle disponibilità di cui al 2° accredito di € 129.468,19 effettuato in conto contributo dalla Regione Puglia e per € 21.578,03 a titolo di anticipazione effettuata da questo Ente attuatore pari al 5% del contributo definitivamente concesso, giusta delibera G.C. n.203/2015.

IL RUP
Ing. Clorindo Izzillo

Il Dirigente
Settore Amministrativo Area Tecnica
Dott.ssa Daniela Conte

Si allega:

- Copia fattura elettronica FATTPA 15_15 emessa in data 8.10.2015 dalla ditta Masellis Surl;
- DURC impresa.

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 0000630479
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06710120723
 Codice fiscale: 06710120723
 Denominazione: MASELLIS S.U.R.L.
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Racc. Stradale De Revel S.p 90
 CAP: 70028
 Comune: Sannicandro di Bari
 Provincia: BA
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: BA
 Numero di iscrizione: 06710120723
 Numero soci: SU (socio unico)
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 080632884
 Fax: 0803885391
 E-mail: info@masellis.it

Riferimento amministrativo

Riferimento: Ing Clorindo Izzillo

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00362170714
 Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: Piazza della Repubblica, 1
 CAP: 71042
 Comune: Cerignola
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**


Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
 Denominazione: Aruba Pec S.p.A.



**Città di
Cerignola**

Progetto rendicontato dalla
 Regione Puglia nell'ambito del

P.O. FESR 2007 - 2013
 ASSE IV LINEA 4.2 - AZIONE 4.2.1
 IL DIRITTO AL SERVIZIO
 REALIZZAZIONE L.P.P.
 (dott. Ing. Clorindo IZZILLO)



PER L'INTERO IMPORTO
 di €. 183.461,01

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2015-10-08 (08 Ottobre 2015)
Numero documento: ~~FATTPA 15-15~~
Importo totale documento: ~~183461.01~~

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: ND
Codice Unitario Progetto (CUP): J32C13000050002
Codice Identificativo Gara (CIG): 5783572299

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: CONTRATTO REP. N. 166 DEL 10/11/2014,
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Recupero e salvaguardia del piano delle fosse granarie - 2° Lotto
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: Stato Finale dei Lavori
Quantità: 1.00
Valore unitario: 166782.74
Valore totale: 166782.74
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: Capitolo 31961
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: Impegno 1196 Sub 1
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
REALIZZAZIONE LL.PP.
(dott. ing. Cipriano IZZILLO)

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: Liquidazione 346
 Quantit : 0.00
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N2 (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
 Totale imponibile/importo: 166782.74
 Totale imposta: 16678.27
 Esigibilit  IVA: S (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: Operazione con Scissione dei pagamenti DM 23.1.2015

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalit : MP05 (bonifico)
 Data scadenza pagamento: 2015-11-30 (30 Novembre 2015)
 Importo: 166782.74
 Istituto finanziario: C/C 1003595 Banca Popolare di Bari
 Codice IBAN: IT46D0542404002000001003595

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
 PER
 (dott. ing. CARLO MELLO)




CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto N.651/15

In data 30-09-15

OGGETTO: PO FESR Puglia 2007/2013 - Asse IV, Linea d'Intervento 4.2, Azione 4.2.1. - Recupero e salvaguardia delle Fosse Granarie - 2' Stralcio - Approvazione stato finale dei lavori, certificato di regolare esecuzione, competenze tecnico-professionali - Liquidazioni - Omologazione spesa progettuale.

Visto

ex art. 151, c. 4, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 02-10-15

Il Responsabile del Settore
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

L'anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di
settembre, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

AMMINISTRATIVO AREA TECNICA

OO.PP.-MANUTENZIONE

Conte Dott.ssa Daniela, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Con Determinazione Dirigenziale del Servizio Beni Culturali della Regione Puglia - Area politiche per la promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti, in adempimento a quanto disposto dalla D. G.R. n. 1304/2010, il precitato Servizio ha riprogrammato le economie derivanti dal Programma Stralcio di Area Vasta Capitanata 2020 ed ha provveduto al relativo impegno di spesa.

Al fine di assicurare la corretta attuazione dell'intervento, ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del PO FESR Puglia 2007-2013 Asse IV Linea d'intervento 4.2 per l'importo complessivo di € 522.589,13 per la realizzazione del "Completamento del progetto di restauro delle fosse granarie in Piazzale S. Rocco", con nota del 5/3/2013 acquisita al protocollo n. 5457, la Regione ha trasmesso il disciplinare regolante i rapporti con i soggetti beneficiari da completare nelle parti mancanti, per la sottoscrizione e la definitiva approvazione.

L'importo del contributo finanziario di € 522.589,13, riassegnato a seguito delle economie accertate in sede di gara di appalto del progetto di recupero e salvaguardie delle Fosse Granarie 1° Stralcio, costituisce l'importo massimo a disposizione di questo soggetto beneficiario che contempla tra le spese ammissibili quelle riguardanti i lavori e quant'altro previsto all'art. 6 del disciplinare, ma non le spese generali, per le quali con delibera della G.C. n. 117 dell'11.04.2013 si è provveduto ad impegnare a carico dell'Ente la spesa di € 60.000,00 quale quota di cofinanziamento del progetto in argomento.

Con la citata delibera G.C. n.117 del 11/4/2013 si è altresì provveduto ad approvare il disciplinare, già sottoscritto e trasmesso alla Struttura regionale nei termini di cui al cronoprogramma del disciplinare stesso, quale atto opportuno e necessario a regolamentare i rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di Cerignola, Ente beneficiario del finanziamento in argomento.

Con determinazione dirigenziale n. 368/68 del 10/6/2013 - ai sensi e per gli effetti della normativa in essa richiamata - sono stati incaricati l'arch. Vincenzo Rendine e l'arch. Tommaso Bufano - già incaricati, giusta D.D. n. 989/144 del 14/10/2010, della direzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di recupero e salvaguardia delle Fosse Granarie 1° stralcio, in corso di esecuzione - della redazione del progetto esecutivo e del piano di sicurezza, della direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase d'esecuzione dell'intervento di "Completamento del progetto di restauro delle fosse granarie in Piazzale S. Rocco", da porre a base d'appalto, nei termini di cui al richiamato disciplinare, a valere sulle risorse del PO FESR Puglia 2007-2013 Asse IV linea d'intervento 4.2. per l'importo di € 522.589,13 a fronte di un investimento complessivo di € 582.589,13.

I citati professionisti giusto atto per scrittura privata del 17/6/2013, si sono costituiti in ATP con lo scopo esclusivo di svolgere le attività professionali di cui al suddetto incarico.

Dando seguito al suddetto incarico, gli stessi tecnici hanno predisposto e trasmesso, giusta nota acquisita agli atti in data 27/6/2013 col prot. n. 15745, il progetto esecutivo da porre a base d'appalto, nei termini di cui al richiamato disciplinare, con il seguente quadro economico di spesa:

		PO.FESR	Bil.Comunale
A	Lavori	429.594,16	
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	22.600,00	
	Importo lavori	452.194,16	
B	Somme a disposizione Amm.ne		
	Iva su lavori	45.219,42	
	Imprevisti	22.600,00	
	Spese pubblicità bando gara	2.575,55	
	Spese ex art.92 D.Lgs 163/06 e s.m.i		4.631,66
	Progettazione esecutiva		17.000,00
	Direzione lavori		12.000,00
	Coordinamento sicurezza in fase esecuz.ne		8.000,00
	Misure e contabilità		2.999,00
	Certificato regolare esecuzione		3.639,35
	Totale spese tecniche		43.638,35
	CNPAIALP 4%		1.745,54
	Iva 21%		9.984,46
	Totali	522.589,13	60.000,00
	Importo progetto	€ 582.589,13	

Pertanto, con deliberazione G.C. n. 241 dell'11/07/2014 si è proceduto all'approvazione della progettazione esecutiva dei lavori in oggetto, redatto dall'A.T.P. composta dagli architetti Vincenzo Rendine e Tommaso Bufano in virtù dell'incarico loro conferito con D.D. n. 368/66 del 10/6/2013, per il "Recupero e Salvaguardia del Piano delle Fosse Granarie - 2° Stralcio" dell'importo complessivo di € 582.589,13, necessaria all'attivazione delle procedure per l'affidamento dei lavori, nel rispetto delle vigenti normative in materia di appalti pubblici, ai fini e termini di cui all'art.4, comma 1, lett.b dell'allegata scheda (Cronoprogramma delle attività) del disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune di Cerignola.

La spesa progettuale di € 582.589,13 è stata finanziata per € 522.589,13 con fondi PO FESR 2007-2013 Asse IV Linea d'intervento 4.2 Azione 4.2.1.- Interventi di Programma stralcio Area Vasta "Capitanata 2020", e per € 60.000,00, quale quota di cofinanziamento per spese tecniche generali non ammesse a finanziamento regionale, con fondi di bilancio comunale, al cui impegno è stato provveduto con deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 11/4/2013.

Con determinazione a contrarre n. 494/69 del 12/06/2014 si è provveduto ad indire la gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.55 del D.Lgs. n.163/2006, per l'appalto dei lavori di completamento del progetto di "Recupero e salvaguardia del Piano delle Fosse Granarie in Piazzale San Rocco - 2° Stralcio" dell'importo a base d'asta di € 452.194,16 per opere murarie, impiantistica generale, infrastrutture specifiche e forniture al netto dell'IVA, di cui oneri per la sicurezza pari ad € 22.600,00 ed € 148.951,26 per costo della manodopera, non soggetti a ribasso d'asta, secondo il bando di gara, agli atti d'Ufficio, nel quale si propone il sistema di aggiudicazione di cui all'art. 82 del D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006, cioè il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso percentuale, da indicare in cifre e lettere, sull'elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione del 10% arrotondato all'unità superiore rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali, giusta art. 122, comma 9 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, purché in presenza di non meno di n.10 (dieci) offerte valide.

Con determinazione dirigenziale n. 607/90 del 23/07/2014 si è preso atto del verbale di gara del 02.07.2014 e proceduto all'aggiudicazione della gara con conseguente rideterminazione del quadro economico.

La Commissione di gara, opportunamente riunitasi in data 04.09.2014, preso atto di un errore materiale commesso in sede di riunione e redazione del verbale del 02.07.2014, ha proceduto alla rettifica dell'offerta errata e, quindi, aggiudicato i lavori all'Impresa Masellis s.u.r.l.

Con determinazione dirigenziale n. 733/114 del 25.09.2014 è stata annullata in autotutela la determinazione dirigenziale n. 607/90 del 23.07.2014 per mero errore materiale del verbale di gara del 2.7.2014 e, quindi, approvato il verbale della Commissione del 4.9.2014 ed aggiudicato definitivamente i lavori all'Impresa Masellis s.u.r.l. per il prezzo di € 197.889,73 dedotto del ribasso del 29,487% sull'importo a base d'asta di € 280.642,90 per lavori, oltre ad € 22.600,00 per oneri della sicurezza ed € 148.951,26 per incidenza della manodopera, non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 369.440,99; con la stessa determinazione dirigenziale in relazione al definitivo risultato di gara è stato altresì e rideterminato il quadro economico.

Tra questa Amministrazione e l'impresa aggiudicataria è stato stipulato in data 10.11.2014 il relativo contratto di appalto rep. n. 166, registrato a Cerignola il 17.11.2014 al n. 36 Serie 1^ aa.pp.

Con nota della Regione Puglia - Area Politiche per la Promozione del Territorio, dei saperi e dei talenti - acquisita in data 22.10.2014 al prot. n. 23854 del dott. Antonio Lombardo è stato chiesto di rettificare un errore materiale relativo al calcolo dell'importo dell'IVA da considerare in € 36.944,10 e di riconoscere alla voce "imprevisti" l'importo di € 22.600,00, quale importo indicato nel quadro economico pre-gara.

In relazione, con determinazione dirigenziale n.923/157 del 19.11.2014 è stato approvato il quadro economico post-gara, rideterminato secondo le seguenti risultanze:

		PO.FESR	Bil.Comunale	Post Aggiudicazione
A	Lavori	280.642,90		197.889,73
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	22.600,00		22.600,00
	Costo della Manodopera non soggetto a ribasso	148.951,26		148.951,26
	Importo lavori	452.194,16		369.440,99
B	Somme a disposizione Amm.ne			
	Iva su lavori	45.219,42		36.944,10
	Imprevisti	22.600,00		22.600,00
	Spese pubblicità bando gara	2.575,55		2.575,55
	Spese ex art.92 D.Lgs 163/06 e s.m.i		4.631,66	
	Progettazione esecutiva		17.000,00	
	Direzione lavori		12.000,00	
	Coordinamento sicurezza in fase esecuz.ne		8.000,00	
	Misure e contabilità		2.999,00	
	Certificato regolare esecuzione		3.639,35	
	Totale spese tecniche		43.638,35	
	CNPAIALP 4%		1.745,54	
	Iva 22%		9.984,46	
	Totali	522.589,13	60.000,00	431.560,64
	Bilancio Comunale			60.000,00
	Economie			91.028,49
	Importo progetto		€ 582.589,13	€ 582.589,13

La spesa progettuale rideterminata in complessivi € 491.560,00, ha trovato sistemazione contabile per € 431.560,64, corrispondente all'importo ritenuto ammissibile a finanziamento a seguito della gara d'appalto, a carico della Regione Puglia con imputazione al cap. 31961 del bilancio 2013, impegno n. 1196, correlato alla risorsa 4.03.10.20, cap.40470 bilancio 2013, acc. n.105, e per € 60.000,00, corrispondente all'importo di cui alle spese tecniche e generali non ammesse a finanziamento dal bando della Regione Puglia ed accollate a questo Ente attuatore, a carico del bilancio comunale, giusta impegno assunto con deliberazione di Giunta Comunale n. 117 dell'11.04.2013.

In data 25.11.2014, giusto verbale in atti, si è proceduto alla consegna dei lavori.

La Direzione lavori, con nota acquisita agli atti in data 31.07.2015 con prot. n. 20278, ha trasmesso la documentazione relativa alla contabilità finale dei lavori.

La stessa, giusto certificato in atti, ha certificato in data 10.06.2015 la ultimazione dei lavori, avvenuta nei termini contrattuali fissati al 22.07.2015, considerati i 240 giorni concessi contrattualmente dalla consegna (25.11.2014).

Lo stato finale, redatto in data 12.06.2015, è stato sottoscritto dall'impresa Masellis S.u.r.l. senza riserve.

L'importo netto delle lavorazioni, quale riportato nello stato finale, è stato definito in € 369.427,11, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 22.600,00 e dell'incidenza della manodopera ad € 148.951,26 (non soggetti a ribasso), contenuto nell'importo complessivamente autorizzato e contrattualizzato di € 369.440,99; tenuto conto dei certificati in acconto (n.2) emessi dalla D.L. per € 202.644,37, è stato altresì certificato a favore dell'impresa il credito finale di € 166.782,74, oltre IVA al 10% pari ad € 16.678,27 e, quindi, di complessivi € 183.461,01, come di seguito riportato:

lavori, al netto del ribasso di cui		369.427,11
di cui incidenza manodopera	148.951,26	
di cui oneri per la sicurezza non s. a ribasso	22.600,00	
a dedurre certificati d'acconto:		
- 1°SAL	119.975,94	
- 2°SAL	82.668,43	202.644,37
rata finale al netto d'IVA al 10%		166.782,74
Iva al 10%		16.678,27
Credito finale		183.461,01

L'arch. Vincenzo Rendine, nella detta qualità di direttore dei lavori, ha altresì redatto in data 16.6.2015, nel rispetto delle disposizioni in materia di LL.PP. ed autorizzazione del RUP, il Certificato di regolare esecuzione, con valenza di Collaudo tecnico-amministrativo, con il quale ha dichiarato che i lavori realizzati dall'Impresa appaltatrice "Masellis s.u.r.l." sono stati eseguiti a regola d'arte, in conformità alle norme contrattuali e previsioni di progetto nonché alle disposizioni impartite dalla stessa D.L., rientranti nei limiti discrezionali consentiti per adeguare in termini di sicurezza e funzionalità l'opera, nonché negli importi regolarmente autorizzati e finanziati, quali riportati nello stato finale.

È stata altresì certificata la mancata cessione da parte dell'impresa del suo credito derivante dal contratto in questione, nonché che nel corso dei lavori non sono occorse occupazioni permanenti e temporanee né sono stati prodotti danni diretti e/o indiretti a proprietà e terzi e che, quindi, si è tralasciata la pubblicazione degli avvisi ad oppo-

nendum. È stato richiesto d'Ufficio opportuno Documento Unico di Regolarità Contributiva, aggiornato allo stato finale.

E stata altresì redatta dall'Ufficio di direzione lavori opportuna relazione sul conto finale.

I citati professionisti, architetti Vincenzo Rendine e Tommaso Bufano, hanno altresì trasmesso le parcelle relative al saldo onorari di direzione, coordinamento della sicurezza, misure e contabilità dei lavori allo S.F. dell'importo di € 6.954,10, da dividersi in maniera paritaria tra i due professionisti, nonché dal solo arch. Vincenzo Rendine la parcella degli onorari attinenti la emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori con valenza di collaudo tecnico-amministrativo di € 4.451,61, ridotta all'importo disponibile alla corrispondente voce di quadro economico di € 3.639,35, oltre contributo previdenziale 4% ed IVA al 22% come dovuti.

Ciò stante, su parere del responsabile del procedimento, ing. Clorindo Izzillo, si ritiene opportuno procedere al riconoscimento, ai fini della relativa liquidazione, dei crediti a favore:

- dell'Appaltatrice dei lavori, Masellis S.u.r.l., della somma di € 183.461,01, IVA al 10% compresa, a titolo di rata finale dei lavori contrattuali, che trova capienza nelle risorse assegnate dalla Regione nell'ambito del PO FESR 2007-2013 Asse IV Linea d'intervento 4.2 Azione 4.2.1.- Interventi di Programma stralcio Area Vasta "Capitanata 2020" e conseguente imputazione al capitolo 31961 del bilancio 2013, impegno n. 1196/1, correlato alla risorsa 4.03.10.20, cap. 40470 bilancio 2013, acc. n.105,

- dei professionisti di cui in seguito dell'importo di complessivi € 13.440,97, dandosi atto che la relativa spesa trova capienza alle corrispondenti voci di quadro economico dell'opera ed al cofinanziamento assunto da questo Ente attuatore, con imputazione per € 3.196,59 all'intervento 2.04.02.01, RR.PP. 1996, cap. 31310, imp. n. 258; per € 1.983,19 all'intervento 2.01.05.05 RR.PP. 1999, cap.30535, imp. n.242; per € 2.901,21 all'intervento 2.05.01.01 RR.PP. 2001, cap.32238, imp. n.282; per € 928,34 all'intervento 2.08.01.01 RR.PP. 2009, cap. 36170, imp. n.519; per € 1.780,20 all'intervento 2.08.01.01 RR.PP. 2007, cap. 36170, imp. n. 3132; per € 2.076,15 all'intervento 2.05.01.01 RR.PP. 2000, cap. 32235, imp. n. 1964; per € 350,29 all'intervento 2.08.01.01 RR.PP. 2004, cap. 36170, imp. n. 3818; per € 225,00 all'intervento 2.05.01.01, cap. 31961 - imp. 1196 (corrispondente al contributo AVCP previsto tra le spese ammesse a finanz. Regionale ed erroneamente imputato al cofinanziamento ed all'intervento 2.09.01.01, cap. 36061 - bil. 2013 - imp.445):

- arch. Tommaso Bufano di € 4.411,68, compreso contributo cnpaia 4% pari ad € 139,08 ed iva al 22% pari ad € 795,55 a titolo di saldo onorari di direzione, coordinamento della sicurezza, misure e contabilità dei lavori;

- arch. Vincenzo Rendine di complessivi € 9.020,29, di cui € 4.411,68, compreso contributo cnpaia 4% pari ad € 139,08 ed iva al 22% pari ad € 795,55 per saldo onorari di direzione, coordinamento della sicurezza, misure e contabilità dei lavori, ed € 4.617,61, compreso contributo cnpaia 4% pari ad € 145,57 ed iva al 22% pari ad € 832,68 per emissione del certificato di regolare esecuzione con valenza di collaudo.

Si ritiene altresì di accantonare, per compensi ex art.93, comma 7bis e ss del D. Lgs. n. 163/2006, inerenti lo svolgimento delle attività di RUP, nonché di collaborazione tecnico-amministrativa da parte dello staff interno che ha svolto attività di supporto finalizzata all'ottimale realizzazione dell'opera, l'importo di € 2.713,17, oneri riflessi ed IRAP compresi, da ripartirsi nella misura di cui al redigendo regolamento e liquidarsi a favore del RUP, ing. Clorindo Izzillo, e collaboratrici dott.ssa Giuseppina Marinaccio e rag. Anna Battaglini, con successivo provvedimento, dandosi atto che la relativa spesa trova capienza nelle voci di quadro economico di progetto ed al cofinanziamento assunto da questo Ente attuatore.

Tenuto conto delle voci di spesa accertate nel corso dei lavori, per i quali sono già stati adottati i relativi provvedimenti di liquidazione, nonché di quelle di cui al presente provvedimento sopra accertate dallo stesso RUP, ritenute ammissibili a finanziamento, viene determinato il seguente quadro definitivo d'intervento:

		Post Aggiudicazione		A regolare esecuzione	
		PO.FESR	Bil.Com.le	PO.FESR	Bil.Comunale
A	Lavori	197.889,73		197.875,85	
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	22.600,00		22.600,00	
	Costo della Manodopera non soggetto a ribasso	148.951,26		148.951,26	
	Importo lavori	369.440,99		369.427,11	
B	Somme a disposizione Amm.ne				
	Iva su lavori	36.944,10		36.942,70	
	Imprevisti	22.600,00			
	Spese pubblicità bando gara	2.575,55		225,00	
	Spese ex art.92 D.Lgs 163/06 e s.m.i		4.631,66		2.713,17
	Progettazione esecutiva		17.000,00		17.000,00
	Direzione lavori		12.000,00		12.000,00
	Coordinamento sicurezza in fase esecuz.ne		8.000,00		8.000,00
	Misure e contabilità		2.999,00		2.998,99
	Certificato regolare esecuzione		3.639,35		3.639,35
	Totale spese tecniche		43.638,35		43.638,34
	CNPAIALP 4%		1.745,54		1.745,53
	Iva 21/22%		9.984,46		9.807,65

Totali finanz.reg.	431.560,64		406.594,81	
Bilancio Comunale		60.000,00		57.904,69
Importo progetto	€ 491.560,64		€ 464.499,50	
Economie			24.965,83	2.095,31

Considerato che per la definitiva omologazione ed ammissione delle spese da parte della Regione Puglia, così come previsto all'art.7 del disciplinare sottoscritto tra la Regione Puglia e questo Ente attuatore, è essenziale che questo Ente provveda ad effettuare le necessarie anticipazioni di cassa, pari al 5% dell'importo definitivamente ammesso a contributo, per eseguire i dovuti pagamenti per la definitiva conclusione dell'opera, la Giunta Comunale con deliberazione n.203 del 30.07.2015 ha autorizzato il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie ad effettuare le relative necessarie anticipazioni sul capitolo di spesa cap. 31961, intervento 2.05.01.01, impegno n.1196 del bilancio 2013, correlato al contributo regionale ed alla risorsa 4.03.10.20, cap. 40470 bilancio 2013 - acc. n.105.

Dato atto che all'intervento è stato attribuito il CODICE CUP: J32C13000050002 ed alla gara dei lavori di cui alla presente liquidazione il CIG: 5783572299 ed a quella delle prestazioni tecnico-professionali il CIG Z3B0A369E0.»

Visto il D. Lgs. 163/2006 e s.m.ed i.;

Visto il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti DPR 207/2010;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 19/06/2015, prot. n. 15928/AA.GG., con il quale si affida alla dott.ssa Antonella Di Tuccio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

Visto il decreto del Sindaco del 3/07/2015, prot. n. 17140/AA.GG., con il quale si affida alla dott.ssa Daniela Conte, la Dirigenza del Settore Amministrativo Area Tecnica;

D E T E R M I N A

1) la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di approvare, su parere favorevole del Responsabile del procedimento, ing.Clorindo Izzillo, secondo le risultanze di cui in premessa:

- lo stato finale dei lavori di "Recupero e salvaguardia del Piano delle Fosse Granarie 2° stralcio", eseguiti dall'impresa "Masellis S.u.r.l." in dipendenza del contratto di appalto repertorio n.166 stipulato in data 10.11.2014, registrato a Cerignola il 17.11.2014 al n. 36 S.1^ aa.pp.;
- la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, con valenza di collaudo tecnico-amministrativo, redatto dal direttore dei lavori, arch. Vincenzo Rendine, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia di LL.PP., con i quali si dà atto che i lavori sono stati eseguiti dall'impresa appaltatrice a regola d'arte, in conformità alle norme contrattuali e secondo le prescrizioni progettuali e degli ordini impartiti dalla stessa D.L. e dal RUP, rientranti nei limiti discrezionali agli stessi consentiti per l'ottimale funzionalità dell'opera, nonché negli importi regolarmente autorizzati e finanziati, quali riportati nello stato finale e confermati nel certificato di regolare esecuzione/collaudo;

3) di dare atto che l'arch. Vincenzo Rendine, nella detta qualità, con il certificato di regolare esecuzione dei lavori, non avendo riscontrato, con la puntuale revisione tecnico-contabile dei documenti, errori e manchevolezze da parte dell'impresa appaltatrice, conferma l'importo netto delle lavorazioni in € 369.427,11, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 22.600,00 e dell'incidenza della manodopera ad € 148.951,26 (non soggetti a ribasso), contenuto nell'importo complessivamente autorizzato e contrattualizzato di € 369.440,99 e, tenuto conto dei certificati in acconto emessi dalla D.L. in corso d'opera per € 202.644,37, certifica a favore dell'impresa il credito finale di € 166.782,74, oltre IVA al 10% pari ad € 16.678,27 e, quindi, di complessivi € 183.461,01;

4) di dare altresì atto che l'Impresa "Masellis S.u.r.l.", giusta documentazione in atti, ha firmato senza alcuna riserva lo stato finale, gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione/collaudo tecnico amministrativo dei lavori; non ha ceduto i suoi crediti derivanti dal relativo contratto di appalto; è in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali nei confronti dell'INPS, INAIL e Casse Edili;

5) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria prestata dalla ditta esecutrice dei lavori a garanzia degli obblighi contrattuali;

6) di approvare altresì le parcelle esibite dall'arch. Vincenzo Rendine e arch. Tommaso Bufano, relative al saldo onorari di direzione, coordinamento della sicurezza, misure e contabilità dei lavori allo S.F. dell'importo di € 6.954,10, da dividersi in maniera paritaria tra i due professionisti, nonché la parcella esibita dal solo arch. Vincenzo Rendine relativa alla emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori con valenza di collaudo tecnico-amministrativo di € 3.639,34, oltre contributo previdenziale 4% ed IVA al 22% come dovuti;

7) di liquidare il credito come sopra riconosciuto a favore della predetta Impresa Masellis surl di € 183.461,01, IVA al 10% compresa, a titolo di rata finale dei lavori contrattuali, che trova capienza nelle risorse assegnate dalla Regione nell'ambito del PO FESR 2007-2013 Asse IV Linea d'intervento 4.2 Azione 4.2.1.- Interventi di Programma stralcio Area Vasta "Capitanata 2020", autorizzando il Servizio Risorse Finanziarie a procedere, al pagamento immediato per € 78.958,64 (a valere quanto ad € 57.380,61 sulle erogazioni in conto contributo disposte dalla Regione Puglia e ad € 21.578,03 a titolo di anticipazione pari al 5% del contributo definitivamente concesso post-gara) e per le restanti € 104.502,37 ad avvenuto accredito regionale del saldo contributo;

8) di liquidare altresì il credito dell'importo di complessivi € 13.440,97 riconosciuto a favore dei professionisti di cui in seguito, dandosi atto che la relativa spesa trova capienza alle corrispondenti voci di quadro economico dell'opera ed al cofinanziamento assunto da questo Ente attuatore:

- arch. Tommaso Bufano di € 4.411,68, compreso contributo cnpaia 4% pari ad € 139,08 ed iva al 22% pari ad € 795,55 a titolo di saldo onorari di direzione, coordinamento della sicurezza, misure e contabilità dei lavori;
- arch. Vincenzo Rendine di complessivi € 9.020,29, di cui € 4.411,68, compreso contributo cnpaia 4% pari ad € 139,08 ed iva al 22% pari ad € 795,55 per saldo onorari di direzione, coordinamento della sicurezza, misure e contabilità dei lavori, ed € 4.617,61, compreso contributo cnpaia 4% pari ad € 145,57 ed iva al 22% pari ad € 832,68 per l'emissione del certificato di regolare esecuzione con valenza di collaudo;

9) di approvare il quadro economico definitivo, così come dettagliatamente riportato in premessa, che conferma in € 464.499,50 la spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento in oggetto, accollabile quanto ad € 406.594,81 al finanziamento regionale in relazione ai termini di ammissibilità di cui al Disciplinare Regione/Puglia Comune ed Bando Regionale per l'accesso ai finanziamenti e ad € 57.904,69 a

carico del cofinanziamento assunto da questo Ente attuatore, autorizzando il Servizio Risorse Finanziarie a procedere ad effettuare le conseguenti operazioni contabili necessarie alla riduzione degli i relativi impegni;

10) di autorizzare la stesso Servizio Risorse Finanziarie all'emissione dei relativi mandati di pagamento in duplice esemplare e a restituire copia conforme a questo Servizio LL.PP. per i successivi adempimenti di rendicontazione;

11) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2015, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

12) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di complessivi € 183.461,01, necessaria per il pagamento a favore della predetta Appaltatrice, sul Capitolo 31961 intervento 2.05.01.01 RR.PP. 2013, impegno n. 1196/sub 1 (correlato al finanziamento assegnato dalla Regione Puglia nell'ambito del PO FESR 2007-2013 Asse IV Linea d'intervento 4.2 Azione 4.2.1.- Interventi di Programma stralcio Area Vasta "Capitanata 2020" - risorsa 4.03.10.20, cap. 40470, RR.AA. 2013, acc. n. 105, imputandola sul Bilancio 2015;

13) di impegnare altresì, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di complessivi € 13.440,97, necessaria per il pagamento a favore dei citati professionisti delle competenze tecniche, per € 3.196,59 all'intervento 2.04.02.01, RR.PP. 1996, cap. 31310, imp. n. 258; per € 1.983,19 all'intervento 2.01.05.05 RR.PP. 1999, cap. 30535, imp. n. 242; per € 2.901,21 all'intervento 2.05.01.01 RR.PP. 2001, cap. 32238, imp. n. 282; per € 928,34 all'intervento 2.08.01.01 RR.PP. 2009, cap. 36170, imp. n. 519; per € 1.780,20 all'intervento 2.08.01.01 RR.PP. 2007, cap. 36170, imp. n. 3132; per € 2.076,15 all'intervento 2.05.01.01 RR.PP. 2000, cap. 32235, imp. n. 1964; per € 350,29 all'intervento 2.08.01.01 RR.PP. 2004, cap. 36170, imp. n. 3818; per € 225,00 all'intervento 2.05.01.01, cap. 31961 imp. 1196 (corrispondente al contributo AVCP previsto tra le spese ammesse a finanz. Regionale ed erroneamente imputato all'intervento 2.09.01.01 (cap. 36061) bilancio 2013 - imp. 445), imputandola sul Bilancio 2015;

14) di dare opportuna comunicazione del presente atto alla Struttura Regionale competente, nei termini di cui al disciplinare sottoscritto tra questo Comune e la Regione Puglia, ai fini della rendicontazione definitiva ed omologazione della intera spesa progettuale con conseguente richiesta di erogazione del saldo contributo;

15) di dare atto che la redazione del presente atto è stata assegnata alla sig.ra Battaglino Anna, in servizio presso l'Ufficio Lavori Pubblici.

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Atto N.651/15

In data 30-09-15

OGGETTO: PO FESR Puglia 2007/2013 - Asse IV, Linea d'Intervento 4.2, Azione 4.2.1. - Recupero e salvaguardia delle Fosse Granarie - 2' Stralcio - Approvazione stato finale dei lavori, certificato di regolare esecuzione, competenze tecnico-professionali - Liquidazioni - Omologazione spesa progettuale.

Ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 196.901,98 (CIG. 5783572299) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	------	------------	--------------	--------------------

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

31310/	3.196,59	345	31-12-2001	2040201
31961/	183.461,01	346	31-12-2013	2050101
30535/	1.983,19	349	31-12-2001	2010505
32238/	2.901,21	350	31-12-2001	2050101
36170/	928,34	351	28-05-2009	2080101
36170/	1.780,20	352	23-05-2007	2080101
32235/	2.076,15	353	31-12-2001	2050101
36170/	350,29	354	12-11-2004	2080101
31961/	225,00	355	31-12-2013	2050101

Cerignola, li 02-10-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Conte Dott.ssa Daniela

Copia conforme all'originale, **02-10-15**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **03-10-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **25357** del **02-10-15** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **02-10-15**.

Dal Palazzo di Città, **02-10-15**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **03-10-15** al **17-10-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **19-10-15**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione dott.ssa Rosaria

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_576758	Data richiesta	13/07/2015	Scadenza validità	10/11/2015
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MASELLIS SOCIETA' UNIPERSONALE A RESPONSABILITA' LIMITATA
Codice fiscale	06710120723
Sede legale	RACCORDO STRADALE DE REVEL - S.P. 90, / 70028 SANNICANDRO DI BARI (BA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
Casse Edili

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

DIVISIONE
METALMECCANICA

Serramenti in alluminio,
acciaio e leghe

Facciate continue

Tecnologie per il
risparmio energetico

Chiusure
industriali

Sistemi di
copertura

Ferro battuto

Strutture
metalliche

Manutenzioni

Impianti Tecnologici

DIVISIONE
EDILIZIA

Costruzioni Generali

Manutenzioni

Ristrutturazioni

Lavori Stradali

Restauri

GLOBAL SERVICE DI
MANUTENZIONE
IMMOBILIARE

ATTESTAZIONE DI
QUALIFICAZIONE
ALLA ESECUZIONE
DI LAVORI PUBBLICI

ISO 9001:2008

EN ISO 14001:2004

BH-QHSAS 18001:2007

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

**Oggetto: Appalto lavori "RECUPERO E SALVAGUARDIA DEL PIANO DELLE
FOSSE GRANARIE - 2° STRALCIO, CIG 5783572299 CUP J32C13000050002"**

Il sottoscritto Masellis Nicola nato a Acquaviva delle Fonti (BA) il 27/12/1980
residente a Sannicandro di Bari (BA) in via Gen. Mondelli n. 44/E
in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa MASELLIS S.r.l.
Con sede a Sannicandro di Bari in via Raccordo Stradale De Revel SP90
P.IVA./C.F. 06710120723

Recapiti telefonici: ufficio 080632884 cellulare 3351448765 FAX 0803885391

e-mail masellis@pec.it

*consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*

con riferimento all'appalto in oggetto ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010,
assumendo tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della
legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

COMUNICA

il numero di conto corrente dedicato alle commesse pubbliche su cui bonificare le somme relative
all'appalto in oggetto

DICHIARA

che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sono i seguenti:
Banca Popolare di Bari - Agenzia / Filiale di Bari Poggiofranco
Codice IBAN: IT 46 D 05424 04002 000001003595

che le generalità e il codice fiscale dell'unica persona delegata ad operare su di esso sono:

Nicola Masellis nato a Acquaviva delle Fonti (BA) il 27/12/1980
residente a Sannicandro di Bari (BA) Via Gen. Mondelli 44/E
c.f. MSLNCL80T27A048P

*Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.*

Sannicandro di Bari, 04/05/2015

FIRMA
MASELLIS S.r.l.
L'Amministratore Unico
Nicola Masellis


MASELLIS SOCIETA' UNIPERSONALE A RESPONSABILITA' LIMITATA


Sede Legale e Stabilimento: Raccordo Stradale De Revel - S.P. 90 - 70028 Sannicandro di Bari (BA)

Cap. Soc.: € 99.000,00 (nt. Vers. - Partita IVA / Codice Fiscale: 06710120723

Tel.: 080.632884 - Fax: 080.3885391 - www.masellis.it - info@masellis.it

Cognome	MASELLIS	
Nome	NICOLA	
Data di nascita	27-12-1980	
Altezza	1,57 m	
Altre caratteristiche fisiche	A-1980	
Altre caratteristiche fisiche	ACQUAVIVA DENISE FONIT	
Cittadinanza	Italiana	
Residenza	SANNICANDRO DI BARI (BA)	Firma del titolare: <i>[Signature]</i> SANNICANDRO DI BARI 19-12-2012 Impronta digitale: <i>[Stamp]</i> DIPENDENTE DELEGATO <i>[Signature]</i> 
Via	MONELLI GEN. 741/E 1-4	
Stato civile	CONIUGATO	
Professione		
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI		
Statura	180	
Capelli	Castani	
Occhi	Castani	
Segni particolari	NESSUNO	

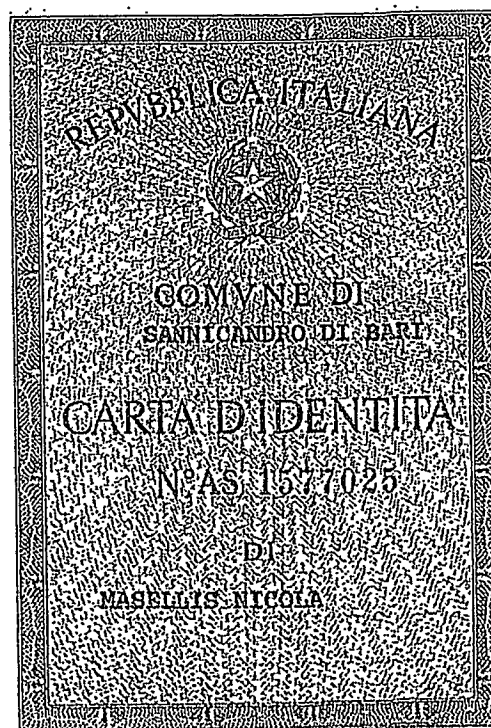



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201500001492303

Identificativo Pagamento: PROT.26981/15

Importo: 71780,58 €

Codice Fiscale: 06710120723

Data Inserimento: 26/10/2015 - 11:52

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto N.203

In data 07-08-2015

OGGETTO: PO FESR 2007-2013 - Asse IV, Linea 4.2-Azione 4.2.1 - Riprogrammazione economie di cui al Programma Stralcio Area Vasta Capitanata 2020 - "Completamento recupero e salvaguardia Piano delle Fosse Granarie - 2° Stralcio" - Assunzione impegno al rispetto termini fissati dalla Regione per conclusione intervento e autorizzazione ad effettuare anticipazioni in conto finanziamento assegnato per la realizzazione dell'opera.

L'anno duemilaquindici, il giorno sette del mese di agosto, alle ore 10:00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la **Giunta comunale** si è riunita sotto la presidenza del signor Albanese Prof.ssa Domenica, assistito dal SEGRETARIO GENERALE del Comune, Claudione dott.ssa Rosaria.

Il VICE SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Risultano presenti n. 5 e assenti n. 3:

Metta Avv. Francesco	SINDACO	A
Albanese Prof.ssa Domenica	VICE SINDACO	P
Marino Dott.ssa Anna	ASSESSORE	P
Bufano Arch. Tommaso	ASSESSORE	P
LIONETTI ANTONIO	ASSESSORE	A
ZAMPARESE avv. MARIA PIA	ASSESSORE	A
DERCOLE CARLO RAFFAELE	ASSESSORE	P
Colucci Dott.ssa Giuliana	ASSESSORE	P

Pareri ex art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000	Esito	Data	Responsabile del Settore
REGOLARITÀ TECNICA	Favorevole	06-08-15	F.to Mastroserio Ing. Vito
REGOLARITÀ CONTABILE	Favorevole	06-08-15	F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

L'Assessore del Settore Urbanistica-PRG-Patrimonio-Edilizia Privata-Lavori Pubblici-Manutenzione-Polizia Mortuaria Arch. Tommaso Bufano, propone l'adozione del presente provvedimento:

«Il Dirigente del Settore Urbanistica-PRG-Patrimonio-Edilizia Privata - Lavori Pubblici - Manutenzione - Polizia Mortuaria - Ambiente - Verde Pubblico, Mastroserio ing. Vito, su istruttoria svolta dall'ing. Clorindo Izzillo, in qualità di Responsabile del Procedimento, riferisce che questo Comune è beneficiario di un finanziamento per il "Recupero e salvaguardia del Piano delle Fosse Granarie - secondo stralcio", ottenuto attraverso la riprogrammazione delle economie derivanti dal Programma Stralcio di Area Vasta Capitanata 2020 ed ha provveduto al relativo impegno di spesa, giusta Delibera G.R. n. 1304/2010 e successiva Determinazione Dirigenziale del Servizio Beni Culturali della Regione Puglia - Area politiche per la promozione del Territorio, di relativo impegno di spesa

Al fine di assicurare la corretta attuazione dell'intervento di "Completamento del recupero e salvaguardia delle fosse granarie in Piazzale S. Rocco - 2° Stralcio", in argomento, ammesso a finanziamento per l'importo complessivo di € 522.589,13, è stato sottoscritto ed approvato con delibera G.C. n.117 dell'11/04/2013 apposito disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e questo Ente beneficiario.

La spesa progettuale rideterminata in complessivi € 491.560,00, ha trovato sistemazione contabile per € 431.560,64, corrispondente all'importo ritenuto ammissibile a finanziamento a seguito della gara d'appalto, a carico della Regione Puglia con imputazione al cap. 31961 del bilancio 2013 - impegno n. 1196, correlato alla risorsa 4.03.10.20, cap. 40470 bilancio 2013 - acc. n. 105, e per € 60.000,00, corrispondente all'importo di cui alle spese tecniche e generali non ammesse a finanziamento dal bando della Regione Puglia ed accollate a questo Ente attuatore, a carico del bilancio comunale, giusta impegno assunto con deliberazione di Giunta Comunale n. 117 dell'11/04/2013

I relativi lavori, appaltati all'impresa Masellis s.u.r.l. con sede in Sannicandro di Bari, in dipendenza del contratto d'appalto stipulato in data 10/11/2014 con rep. n. 166, sono al momento in fase di completamento.

Così come prescritto dall'Autorità di gestione PO FESR 2007/2013, giusta nota Aoo 165 n.1547 del 12/04/2013, il termine ultimo per la conclusione fisica e finanziaria (pagamento di tutte le spese, rendicontazione anche telematica con il sistema MIRWEB, omologazione delle stesse) degli interventi ammessi a finanziamento era fissato al 30 giugno 2015.

La Regione Puglia - Area Politiche per la promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti - Servizio Beni Culturali, con nota AOO-058 n.1817/5 del 24/06/2015, in ragione di quanto manifestato dal RUP circa l'oggettiva difficoltà a rispettare il detto termine del 30/06/2015 originariamente stabilito per la conclusione dell'intervento in questione, ha concesso la proroga al 30/11/2015, condizionata all'assunzione, da parte dell'Ente beneficiario, di un formale impegno (deliberazione) a rispettare il termine del:

-30/09/2015 per fare pervenire alla competente struttura regionale le richieste di erogazione degli acconti, con la puntuale rendicontazione delle spese sostenute;

-30/11/2015 per fare pervenire alla competente struttura regionale la rendicontazione del saldo finale del 5% del contributo finanziario definitivo PO FESR assegnato che, come previsto dal Disciplinare (art.7, punto 1, comma 4), deve essere anticipato da questo Ente beneficiario;

-30/11/2015 per la conclusione fisica e finanziaria (pagamento delle spese ammissibili) dell'intervento.

Con la citata nota regionale il competente Dirigente di Settore ha manifestato la inderogabilità del nuovo termine fissato al 30/11/2015 al fine di assicurare la conclusione degli stessi interventi da parte della competente struttura regionale al 31/12/2015 in osservanza di quanto stabilito dalla decisione comunitaria (C) 2013 -1573 del 20.03.2013 "Orientamenti CE sulla chiusura Programmi Europei 2007 2013".

Come rimarcato dal Dirigente del competente Servizio Regionale, la erogazione finale del residuo 5% del contributo finanziario PO FESR definitivamente assegnato, a termine del citato art.7,punto 1, comma 4, del disciplinare, è perentoriamente prevista ad avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione/collaudo tecnico-amministrativo dei lavori e conseguente emissione del provvedimento di accertamento ed omologazione delle intere spese sostenute per la realizzazione dell'intervento, dimostrate attraverso i relativi mandati di pagamento regolarmente quietanzati a favore degli aventi causa.

Condizione essenziale, pertanto, per la definitiva omologazione ed ammissione della intera spesa progettuale da parte della Regione Puglia è che questo Ente provveda ad effettuare le necessarie anticipazioni di cassa per eseguire i pagamenti in relazione all'opera, quali da accertare dall'ing. Clorindo Izzillo, in qualità di Responsabile del Procedimento, nella detta misura del 5% del contributo di € 431.560,64 ritenuto concedibile da parte della stessa e, quindi, di € 21.578,03, fatta salva la superiore verifica regionale e decisiva conferma dello stesso.»

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione di cui sopra e fattala propria;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto l'allegato n.4/2 al D.Lgs.118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligo viene a scadenza";

Visto il decreto del Sindaco del 25/06/2015, prot. n. 16286/Gab., con il quale è stato conferito l'incarico dirigenziale;

;

Visto il decreto del Sindaco del 19/06/2015, prot.n. 15928/AA.GG., con il quale è stato conferito l'incarico dirigenziale;

;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti unanimi e a scrutinio palese;

D E L I B E R A

1) la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di assumere in relazione all'intervento di "Completamento del progetto di restauro delle Fosse Granarie in Piazzale S. Rocco" Secondo Stralcio, finanziato con le risorse del PO FESR Puglia 2007-2013 Asse IV linea d'intervento 4.2, Azione 4.2.1 - Interventi di Programma stralcio Area Vasta "Capitanata 2020", formale impegno a rispettare il termine inderogabile del:

- 30/09/2015 per fare pervenire alla competente struttura regionale le richieste di erogazione degli acconti, con la puntuale rendicontazione delle spese sostenute;

- 30/11/2015 per fare pervenire alla competente struttura regionale la rendicontazione del saldo finale del 5% del contributo finanziario definitivo PO FESR assegnato che, come previsto dal Disciplinare (art.7, punto 1, comma 4), deve essere anticipato da questo Ente beneficiario;

- 30/11/2015 per la conclusione fisica e finanziaria (pagamento delle spese ammissibili) dell'intervento;

3) di prendere atto della necessità di effettuare in conto finanziamento PO FESR 2007/2013 Asse IV Linea 4.2 Az.4.2.1 - assegnato dalla Regione Puglia per la realizzazione dell'intervento in argomento, anticipazioni necessarie per eseguire i pagamenti che in relazione all'opera verranno accertati e riconosciuti a favore degli aventi causa dal Responsabile del Procedimento, ing. Clorindo Izzillo, nella

misura del 5% del contributo di € 431.560,64 ritenuto concedibile e, quindi, nell'importo di € 21.578,03, fatta salva la superiore verifica da parte della stessa Regione;

3) di autorizzare il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie ad effettuare le necessarie anticipazioni di cassa nei limiti del suddetto importo di € 21.578,03, e ciò al fine di procedere ai pagamenti a farsi in relazione al progetto in argomento nei termini e prescrizioni di cui al Disciplinare di accettazione del finanziamento, quale condizione essenziale per la definitiva omologazione ed ammissione della intera spesa progettuale da parte della Regione Puglia;

4) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2015, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

5) di dare atto che, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 21.578,03 di cui alle anticipazioni in questione risulta impegnata all'intervento 2.05.01.01, cap. 31961 RR.PP.2013, impegno n. n.1196 del bilancio 2013, correlato al capitolo di entrata 40470 risorsa 4.03.1020 acc. n.105 ed al finanziamento regionale;

6) di dare atto che la redazione del presente provvedimento è stata assegnata dal RUP alla Sig.ra Annarita Battaglino, in servizio presso l'Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici;

7) di dichiarare all'unanimità il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Approvato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO

F.to Albanese Prof.ssa Domenica

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Claudione dott.ssa Rosaria

Rilasciata copia in data **11-08-15**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente deliberazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **11-08-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa in elenco con lettera prot. n. **21112** del **11-08-15** ai signori capigruppo consiliari (art. 125, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **11-08-15** (art. 134 D.Lgs. 267/2000).

Dal Palazzo di Città, **11-08-15**

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Claudione dott.ssa Rosaria

La presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **11-08-15** al **25-08-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **26-08-15**

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Claudione dott.ssa Rosaria
