



Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1859


del 10-07-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	31312	Art.	0	Codice di bilancio	204020100	Gestione	RESIDUI/2012
PROG. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEM. BATTISTI - FINANZ. REG.LE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento SETTORE LL. PP. MANUT.		nr. 411	del. 27-05-2015
numero 236		del 26-05-2015		Immed. Eseguibile/Esecutiva			
PO FESR Puglia 2007-2013, Asione 2.4.1 - Area Vasta Capitanata 2020 - Lavori per l'energizzazione scuola elementare C. Battisti - Approvazione e liquidazione 2 stato avanzamento lavori.							
		DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		PREVISIONE ASSESTATA		382.220,33	463.720,33
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	0,00
Servizio	2	ISTRUZIONE ELEMENTARE		PRESENTE IMPORTO		72.451,29	72.451,29
Intervento	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		TOTALE PAGATO		72.451,29	72.451,29
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		309.769,04	391.269,04
DESTINAZIONE FONDI		Vincolata (Vincolo n. 4) CONTRIBUTI REGIONALI				Fruttifero	C.U.P. J36E12000680002
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 72.451,29 diconsì SETTANTADUEMILAQUATTROCENTOCINQUANTUNO/29							
Per : PO FESR Puglia 2007-2013, Asione 2.4.1 - Area Vasta Capitanata 2020 - Lavori per l'energizzazione scuola elementare C. Battisti - Approvazione e liquidazione 2 stato avanzamento lavori.							

CREDITORE (Codice: 78)				
SEDIR S.R.L.		CORSO ALDO MORO, 139		
P.Iva 01378670713		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. SIOPE
1	CIG:4564428D21 SALDO Fatt.n. 1PA del 09/06/2015 ACCONTO SU CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - APPALTO LAVORI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA EL. C. BATTISTI		72.451,29	2109
	Trib. 0022 IVA PARTE CAPITALE 22,00% su 59.386,00 *Ritenuta		13.064,99	
	Netto da Pagare:		59.386,30	59.386,30
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	13.064,99
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCO DI NAPOLI - CIN: Y - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 000020606108 IBAN: IT45Y0101078382000020606108			

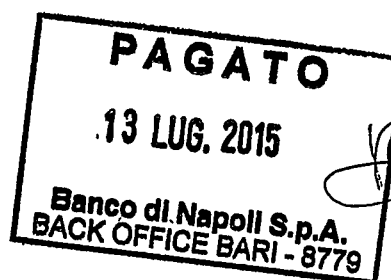

Dirig. Sett. Finanziario
Dott.ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1859 CAP. 31312 BIL. 2012

~~60~~
IMPEGNO N. 236

TOTALI: 79.451,29
IMBOMB. 59.386,30

IMPORTO € _____

RITENUTA € 13066,99

REV. N. 1787 € 13066,99

CREDITORE: cod. N. (78) SEDIR SRL

PAGAMENTO FATTURA:

Inv. F&A. n. 1/PA ACC. SU CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA EL. BATTISTO

CIG: 4564428D21

SIOPE: 2109

DOCUMENTI: ~~Delibera~~ N. 1 del _____

Determ. N. 661/95 del 27/05/15

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT04030410288**
 Progressivo di invio: **ALB157094**
 Formato Trasmissione: **SDI11**
 Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**
 Telefono del trasmittente: **049 9426171**
 E-mail del trasmittente: **fattura@2csolution.it**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01378670713**
 Codice fiscale: **01378670713**
 Denominazione: **SEDIR SRL**
 Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA DANTE**
 Numero civico: **4**
 CAP: **71042**
 Comune: **CERIGNOLA**
 Provincia: **FG**
 Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0885413550**
 Fax: **0885413550**
 E-mail: **sedirsl@libero.it**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **00362170714**
 Denominazione: **Comune di Cerignola**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA DELLA REPUBBLICA**
 Numero civico: **1**
 CAP: **71042**
 Comune: **CERIGNOLA**
 Provincia: **FG**
 Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02046570426**
 Denominazione: **Namirial SPA**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2015-06-09 (09 Giugno 2015)
Numero documento: 1PA
Importo totale documento: 72451.29
Causale: ACCONTO SU CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 RELATIVO ALL' APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE C. BATTISTI

2293
78

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo ordine di acquisto: DET. DIR. 411/95
Data ordine di acquisto: 2015-05-27 (27 Maggio 2015)
Codice Unitario Progetto (CUP): J36E12000680002
Codice Identificativo Gara (CIG): 4564428D21

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo contratto: 119
Data contratto: 2013-04-04 (04 Aprile 2013)
Codice Unitario Progetto (CUP): J36E12000680002
Codice Identificativo Gara (CIG): 4564428D21

Dati della ricezione

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo ricezione: LIQUIDAZIONE 236
Data ricezione: 2012-10-29 (29 Ottobre 2012)
Numero linea ricezione: CAP. 31312
Codice commessa/convenzione: IMPEGNO N.779-2
Codice Unitario Progetto (CUP): J36E12000680002
Codice Identificativo Gara (CIG): 4564428D21

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE C.BATTISTI
Quantità: 1.00000
Unità di misura: CORPO
Valore unitario: 72451.29000
Valore totale: 72451.29000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 59386.30
Totale imposta: 13064.99
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: SEDIR SRL
Modalità: MP05 (bonifico)
Termini di pagamento (in giorni): 30

Importo: **59386.30**
Codice IBAN: **IT45Y0101078382000020606108**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto N.411/95

In data 27-05-15

OGGETTO: PO FESR Puglia 2007-2013, Asione 2.4.1 - Area Vasta Capitanata 2020
- Lavori per l'energizzazione scuola elementare C. Battisti -
Approvazione e liquidazione 2' stato avanzamento lavori.

Visto

ex art. 151, c.4, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 27-05-15

Il Responsabile del Settore
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

L'anno duemilaquindici, il giorno ventisette del mese di **maggio**, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**LAVORI PUBBLICI E
MANUTENZIONE**

OO.PP.-MANUTENZIONE

IZZILLO ING. CLORINDO, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«La Giunta Regionale con deliberazione n.917 del 26/5/2009 ha approvato le procedure per la definizione del Programma Stralcio di Interventi di Area Vasta; con successiva n.2684 del 28/12/2009, ha approvato il Programma stralcio di interventi di Area Vasta "Capitanata 2020", assegnando finanziamenti a valere sulla Linea d'intervento 2.4 (Interventi per l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e per l'adozione di tecniche per il risparmio energetico nei diversi settori d'impiego), Azione 2.4.1 (Promozione del risparmio energetico e dell'impiego di energia solare nell'edilizia pubblica non residenziale).

La delibera G.R.n.2684/09, nel definire il cronoprogramma delle attività per l'attuazione del Programma stralcio, determina una serie di ulteriori attività da svolgere ai fini dell'istruttoria tecnico-finanziaria degli interventi, imputandone la responsabilità all'Area Vasta, riconoscendone funzioni di monitoraggio, sorveglianza e controllo connesse alla programmazione comunitaria, nonché, per specifiche Linee di intervento del P.O. FESR Puglia 2007/2013, la realizzazione di interventi denominati "a rete", con gestione unitaria dell'intervento imputabile ad un Ente capofila quale soggetto beneficiario.

La Cabina di Regia del Piano Strategico di Area Vasta "Capitanata 2020 - Innovare e Connettere" con deliberazione n. 1 del 9/02/2010, ha approvato gli interventi puntuali, individuati dal Tavolo tecnico, per l'attivazione delle risorse riferite alla Linea di intervento 2.4 "Interventi per lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili e per l'adozione di tecniche per il risparmio energetico dei diversi settori di impiego" di cui alla citata delibera G.R. n. 2684/2009 (D.G.R. n. 917/2009), la stessa con altra Deliberazione n.2 del 9/02/2010, ha individuato la Provincia di Foggia quale Ente capofila per gli interventi puntuali per l'attivazione delle risorse riferite alla suddetta Linea di intervento 2.4.

Con Deliberazione n.515 del 23/02/2010, la Giunta Regionale ha approvato le linee guida per il finanziamento di interventi di miglioramento della sostenibilità ambientale e delle prestazioni energetiche del patrimonio edilizio pubblico del settore terziario. P.O. FESR 2007-2013. Asse II - Linea 2.4 - Azione 2.4.1.

Con deliberazione n.8 del 28/09/2010, la Cabina di Regia del Piano Strategico di Area Vasta "Capitanata 2020 - Innovare e Connettere", ha approvato l'ordine prioritario degli interventi puntuali in funzione dei parametri emersi nel corso dell'istruttoria tecnico-finanziaria svolta con il Responsabile di Linea.

Con deliberazione n.2 del 7/10/2010, il Consiglio delle Istituzioni del Piano strategico di area vasta "Capitanata 2020 - Innovare e Connettere" ha individuato la Provincia di Foggia quale Ente capofila per la gestione dell'intervento a rete a valere sull'azione 2.4.1 - P.O. FESR 2007/2013 - Asse

Il - Linea di intervento 2.4 di cui alla D.G.R. n. 2684/2009 (D.G.R. n. 917/2009).

Tra gli interventi ammissibili a finanziamento sul P.O. FESR Puglia 2007/2013 Asse II - Linea 2.4 - Azione 2.4.1 è compreso quello proposto dal Comune di Cerignola inerente l'efficientamento energetico per la Scuola elementare "C. Battisti" per l'importo progettuale di complessivi € 600.772,00 di cui € 510.565,20 accollabile a contributo, giusta deliberazione G.R. n.2123 del 22.11.2012 e come da D.G.R. n.2823 del 12.12.2011 e Linee Guida di cui alla D.G.R. n.2155 del 23/09/2011.

L'intervento succitato oggetto di finanziamento è inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2012/2014.

Con delibera G.C. n.79 del 01/03/2012 si è provveduto a programmare, a carico dell'Ente, la quota di cofinanziamento di € 90.115,80, pari al 15% dell'importo progettuale di detti € 600.772,00, per la realizzazione dell'intervento di che trattasi, nonché a nominare il Dirigente ing. Clorindo Izzillo, Responsabile Unico del Procedimento.

In data 7/03/2012 con la Regione Puglia - Struttura di gestione PO FESR 2007/2013 Asse II - Linea di intervento 2.4 Azione 2.4.1 è stato sottoscritto il Disciplinare regolante i rapporti la Regione Puglia e il Comune di Cerignola in quanto soggetto beneficiario del finanziamento in argomento.

A termini dell'art.2 del richiamato "Disciplinare" questo Ente, nella persona del Dirigente dei Lavori Pubblici ing. Clorindo Izzillo, ha elaborato lo "Studio di Fattibilità" dell'intervento proposto, il quale ha richiesto adeguate prestazioni professionali ed opportune attività di misurazioni dei flussi termici, produzioni di report, verifiche on line dell'andamento della misura e calcolo della trasmittenza con 'metodo medie progressive' ISO 9869 per adempiere alle verifiche tramite il protocollo Itaca, eseguibili necessariamente attraverso l'impiego di idonee strumentazioni.

Lo studio di fattibilità è stato approvato con determinazione dirigenziale n.507/80 del 29/06/2012 e trasmesso alla competente Struttura Regionale.

Il Dirigente dei lavori Pubblici ing. Clorindo Izzillo, sulla base dello studio di fattibilità, ha predisposto la progettazione esecutiva, approvata con deliberazione G.C. n. 258 del 21/08/2012, da porre a base d'appalto ai sensi dell'art.4, comma 1, lettera b) del richiamato disciplinare.

Con determina a contrarre n. 804/126 del 06/11/2012 si è proceduto ad indire la gara d'appalto, individuando nella procedura negoziata -prevista dalla vigente normativa in materia di appalti (sottosoglia)- il procedimento di scelta del contraente, di cui all'art. 57, comma 6 del D. Lgs. 163/2006, con il sistema di aggiudicazione di cui all'art.82 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., cioè con

il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato ex art.122 del D.Lgs. 163/2006, purché in presenza di non meno di 10 (dieci) offerte valide.

L'invito di gara, con prot. n. 25007, è stato diramato in data 6/11/2012 a n.15 Ditte aventi i requisiti necessari; nel termine prescritto (ore 12.00 del 26/11/2013) sono pervenuti n.11 plichi contenenti la documentazione e le offerte delle Ditte partecipanti, tutte ammesse alla gara.

Con verbale del 27/11/2012, ritenuta l'offerta più vantaggiosa quella presentata dalla Ditta "Sedir srl" si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria dei lavori alla detta Ditta che ha offerto il ribasso del 26.720%, sull'importo a base d'asta di € 450.541,50.

Con determinazione dirigenziale n. 44/13 del 30.01.2013, preso atto della regolarità della procedura eseguita, i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta Sedir srl con sede in Cerignola al Corso A. Moro n. 139, per il prezzo di € 330.156,81, al netto nel ribasso offerto del 26,72%, oltre ad € 18.772,56 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e, quindi, per il complessivo importo di € 348.929,37 oltre IVA come per legge.

Con determinazione dirigenziale n.115/25 del 14.02.2013 è stato conferito all'ing.Ascanio Trivisano, ai sensi del comma 2 art.91 del D.Lgs. 163/2006, l'incarico di direzione e coordinamento della sicurezza dei lavori, stabilendo per tali prestazioni un onorario pari ad € 39.826,68, contributi previdenziali compresi ed oltre IVA e, quindi, di complessivi € 48.190,28.

Tra la predetta Ditta Sedir srl e questa Amministrazione è stato stipulato il relativo contratto di appalto rep.119 del 04.04.2013, registrato a Cerignola il 9.04.2013 al n. 29 Serie 1^ atti pubblici.

I lavori sono stati consegnati in data 15.07.2013 e concretamente iniziati in data 16.07.2013.

Con determinazione dirigenziale n.656/112 del 19/09/2013, su apposita richiesta acquisita il 15.07.2013 al prot. n. 17130, si è proceduto ad autorizzare l'impresa aggiudicataria dei lavori "SEDIR S.r.l.", a subappaltare all'impresa Biancofiore Michele (C.F.:BNCMHL65H02C514), con sede in Cerignola, alla Via Santuario Madonna di Ripalta n.8 - partita Iva 02284250715, in possesso dei requisiti generali di idoneità tecnica ed economica prescritti dalla vigente normativa in materia, alcune opere della categoria prevalente (OG1), ed in particolare la parte di contratto inerente a "FPO guaina bituminosa e FPO protezione di alluminio", per l'importo di € 54.285,21 di cui € 3.441,60 per oneri della sicurezza, compreso nei limiti previsti dall'art.118 del D. Lgs. 163/2006 (30% della categoria prevalente dell'importo netto contrattuale).

Con determinazione dirigenziale n.715/122 del 10/10/2013, tenuto conto del risultato di gara ed in relazione alla verifica da parte del Responsabile Regionale di Azione 2.4.1. di alcune voci di spesa ed ammissibilità delle stesse a finanziamento PO FESR 2007/2013, è stato disposto il seguente nuovo quadro economico:

		Pre gara	Post gara
A	LAVORI	€	€
A1	Importo lavori	450.541,50	330.156,81
A2	Importo attuazione Piani di sicurezza in fase esecuzione lavori	18.772,56	18.772,56
	Sommano	469.314,06	348.929,37
B	Spese tecniche e generali		
B1	Iva sui lavori 10% su A1) e A2)	46.931,41	34.892,94
B2	Spese per attività preliminari, di pubblicità e di gara	1.000,00	1.000,00
B3	Spese per Studio di fattibilità, acquisto attrezzature necessarie all'espletamento S.F. e funzionalità esercizio dell'intervento	10.472,30	10.472,30
B4	Spese tecniche	53.704,09	38.294,88
B5	Cnpaia 4% di B4	2.148,16	1.531,80
B6	Iva su B4)+B5)	11.728,97	8.363,60
B7	collaudi tecnici/specialistici amministrativo/ ex art.92 D.lgs. 163/06	3.000,00	3.000,00
B8	Allacci	2.423,01	2.423,01
B9	Imprevisti		34.892,94
	Totale spese tecniche e generali	131.407,94	134.871,47
	Totale dopo gara		483.800,84
	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	Studio fattibilità - ex art.92 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.		13.472,30
			76.643,50
			90.115,80
		600.722,00	573.916,64

Con la medesima determinazione n.715/122 del 10.10.2013, ricorrendone i presupposti, è stato disposto il ricorso al beneficio di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.2203 del 31.10.2012, pubblicata sul BURP n.166 del 20.11.2012, con la quale, alla luce delle contingenze nella stessa delibera riportate, la stessa ha ritenuto di garantire la copertura della quota di cofinanziamento a carico degli Enti beneficiari utilizzando le somme di bilancio regionale già stanziare per l'azione 2.4.1., assentendo il finanziamento totale nei soli casi in cui gli Enti beneficiari procedano all'appalto dei lavori con le modalità di cui al citato art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Pertanto, avendo questo Ente proceduto all'appalto dei lavori con le modalità di cui al richiamato art. 82 del D.Lgs. 163/2006, l'impegno per il nuovo fabbisogno è stato accollato a carico della Regione ed al finanziamento PO FESR

2007-2013 Asse II - Linea di intervento 2.4, Azione 2.4.1, correlato all'intervento 2.04.02.01, cap.31312, "Progetto di efficientamento energetico scuola elementare "C. Battisti" fin reg. - imp. n. 779.

Per il finanziamento di spese ed esecuzione di eventuali opere non ammesse a finanziamento regionale sono rimasti interamente destinati all'intervento in argomento gli stanziamenti assunti da questo Ente al bilancio Comunale (capitolo 30585 RR.PP. 2011 - impegno n. 588/12, quota di € 90.115,80, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 23.05.2013 di autorizzazione al relativo utilizzo).

Il Responsabile Regionale d'Azione 2.4.1 PO FESR Puglia 2007-2013 con propria determinazione dirigenziale 2152 cod.cifra n.158 del 08.11.2013 ha dato atto del diritto di questo Comune ad ottenere lo sconto della quota comunale di cofinanziamento in esecuzione della D.G.R. n. 2203/2012 e, quindi, disposta la erogazione della quota pari al 35% del contributo ammissibile di € 483.800,84.

In corso d'opera, data la riscontrata necessità di apportare alcune variazioni alle lavorazioni di contratto per motivi impreveduti ed imprevedibili in fase progettuale, la Direzione lavori, con nota acquisita in data 12.08.2013 al prot.n.19145, ha richiesto al RUP adeguata autorizzazione alla redazione di apposita variante progettuale, la quale è stata concessa con nota prot.n.19897 del 28/08/2013, fermo restando il rispetto alla vigente normativa in materia.

Con verbale del 09/08/2013, nelle more della redazione della succitata perizia, è stata disposta ai sensi dell'art. 159, commi 1 e 2, del DPR 207/2010, la sospensione dei lavori a partire dal 10 agosto 2013.

Il Direttore dei lavori, ing.Ascanio Trivisano, ricorrendo i presupposti di cui al comma 1 lett. b) e c) dell'art.132 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., ha redatto e provveduto a trasmettere, con nota acquisita in data 18.11.2013 al prot.n.26196, la perizia di variante, la quale è stata approvata con determinazione dirigenziale n.474/64 del 04.06.2014, fatta salva la superiore approvazione da parte del competente Responsabile di Misura Regionale.

Con nota AOO-158 prot. 714 del 16.07.2014 e successiva di chiarimenti acquisita con pec in data 6.8.2014, il Servizio Regionale Competitività dei Sistemi Produttivi, con riferimento a tutti gli interventi di efficientamento energetico su edilizia pubblica non residenziale, finanziati con l'azione 2.4.1, ha comunicato che l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, con proprio parere, che l'aliquota IVA sui lavori di straordinaria manutenzione inerenti l'edilizia scolastica, come nel caso di specie, non essendo caratterizzati dal requisito della stabile residenza, sono soggetti all'aliquota ordinaria.

Ciò posto, questa Amministrazione beneficiaria con determinazione dirigenziale n.870/141 del 06/11/2014 ha proceduto alla conseguente rimodulazione del quadro economico per l'adeguamento dell'aliquota IVA sui lavori, attingendo dalle economie residue in sede di aggiudicazione di gara dei lavori.

Con nota mail del 05.11.2014, il Responsabile d'Azione 2.4.1. del competente Ufficio Regionale in relazione alla perizia di variante e suppletiva ha notificato di non ritenere ammissibile alle finalità dell'azione 2.4.1. la voce di spesa inerente la realizzazione dell'impianto antintrusione perimetrale, rinviando i relativi costi a carico di questo Ente attuatore.

La Direzione lavori, in linea con le direttive del Responsabile di Misura Regionale e su parere del RUP che ritiene comunque indispensabile dotare la scuola di un impianto "antintrusione" per impedire i continui atti vandalici a cui è sottoposta, ha proceduto, a parziale sostituzione e rettifica dei precedenti elaborati, a conformare gli atti tecnici alle prescrizioni del R. di M.R. e direttive del RUP, assumendo in relazione al nuovo assestamento una computazione che ridetermina l'importo per lavori in € 320.256,51 al netto del ribasso d'asta del 26,72%, mentre gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, in € 18.772,56, stabilendo in € 339.029,07 il nuovo importo contrattuale.

Il quadro economico della perizia, approvata con determinazione dirigenziale n.263/61 del 31.3.2015 in sola variante ed a rettifica del precedente di cui alla citata D.D. n.474/64 del 04.06.2014, è stato rimodulato secondo le seguenti risultanze, che tiene altresì conto dell'intervenuto adeguamento dell'aliquota IVA sui lavori:

		Pre gara	Post gara	variante	adeguamento IVA	
A	LAVORI	€	€			
A1	Importo lavori (rib. asta 26,72%)	450.541,50	330.156,81	320.256,51	320.256,51	
A2	Importo attuazione Piani di sicurezza in fase esecuzione lavori	18.772,56	18.772,56	18.772,56	18.772,56	
	Sommano	469.314,06	348.929,37	339.029,07	339.029,07	Lav
B	Spese tecniche e generali					
B1	Iva sui lavori 10% su A1) e A2)	46.931,41	34.892,94	33.902,91	74.586,40	iva
B2	Spese per attività preliminari, di pubblicità e di gara	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	s.g.
B3	Spese per Studio di fattibilità, acquisto attrezzature necessarie all'espletamento S.F., funzionalità esercizio dell'intervento (importo scorporato dell'iva)	10.472,30	10.472,30	10.472,30	8.583,85	altro
B4	Spese tecniche	53.704,09	38.294,88	38.294,88	38.294,88	s.g.
B5	Cnpaia 4% di B4	2.148,16	1.531,80	1.531,80	1.531,80	altro
B6	Iva su B4)+B5)	11.728,97	8.363,60	8.761,87	8.761,87	iva
B7	collaudi tecnici/specialistici amministrativo/ ex art.92 D.lgs. 163/06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	s.g.

B8	Iva su spese studio fattibilità,etc				1.888,45	
B9	Allacci	2.423,01	2.423,01	2.423,01	2.423,01	altro
B10	Imprevisti		34.892,94	33.902,91	0,00	impr
	Totale spese tecniche e generali	131.407,94	134.871,47	133.289,69	140.070,26	
	Totale dopo gara/variante/adeq.IVA	510.565,20	483.800,84	472.318,74	479.099,33	
	Somme a disposizione dell'Ammin.ne					
	ex art.92 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.		13.472,30	13.472,30	13.472,30	
	Lavori a fattura non ammessi a finanz. PO FESR			12.000,00	12.000,00	
	Iva 22% su lavori a fattura			2.640,00	2.640,00	
			76.643,50	62.003,50	62.003,50	
		90.115,80	90.115,80	90.115,80	90.115,80	
		600.722,00	573.916,64	562.434,54	569.215,13	

In data 07.01.2015, giusto verbale (n.1) in pari data, i lavori sono stati ripresi.

Al Responsabile di Misura e competente Struttura Regionale è stata, pertanto, riproposta la variante come sopra rettificata, nonché inoltrata opportuna richiesta ai fini dell'adeguamento del contributo ritenuto concedibile in € 479.099,33, a seguito dell'applicazione dell'aliquota IVA ordinaria sui lavori, ai sensi e per gli effetti di cui alla richiamata missiva regionale AOO-158 prot. n. 7014 del 16.07.2014 e successiva (pec) del 6.08.2014.

A carico dello stanziamento assunto da questo Ente al bilancio Comunale (capitolo 30585 RR.PP. 2011 - impegno n. 588/12 di € 90.115,80) resta accollata la spesa non ammissibile a finanziamento.

In data 07.01.2015, giusto verbale (n.1) in pari data, i lavori sono stati ripresi.

L'ing. Ascanio Trivisano, in qualità di direttore dei lavori, ha trasmesso con nota acquisita in data 16.04.2015 al prot.n.8898, il 2° stato di avanzamento dei lavori, eseguiti dalla ditta aggiudicataria dei lavori, Sedir Srl, a tutto il 13/04/2015, per il complessivo importo netto di € 159.562,68, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 8.835,23, nonché il relativo certificato di pagamento n.2, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, ing. Clorindo Izzillo, con il quale, dedotto l'acconto di cui al 1° SAL e le ritenute di legge, è stato accertato e riconosciuto a favore della predetta Ditta appaltatrice il credito di € 76.600, oltre IVA nella misura del 22% pari ad € 93.452,00, e, quindi, di complessivi € 93.452,00.

Il Dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzione, ing. Clorindo Izzillo, nella qualità anche di responsabile del procedimento, vista la regolarità degli atti, ritiene di procedere all'approvazione del suddetto 2° stato di avanzamento lavori e relativo certificato di pagamento, con contestuale liquidazione a favore dell'impresa "Sedir Srl" dell'accertato credito di complessivi € 93.452,00, iva compresa, la cui relativa spesa trova imputazione all'intervento 2.04.02.01, cap. 31312, Bil.2012 "Progetto efficientamen-

to energetico scuola elementare "C. Battisti" - imp. n. 779 - sub. 2, correlato al finanziamento regionale ed alla risorsa 4.03.10.20, cap 40659, accert.55 (a valere per € 72.451,29 alle residue disponibilità di cui al 1° accredito effettuato dalla Regione Puglia e per le restanti € 21.000,71 sull'ulteriore accredito che la stessa Regione andrà ad effettuare in conto finanziamento).

Al progetto in argomento è stato assegnato il CUP: J36E12000680002, alla gara dei lavori in argomento il CIG 4564428D21, ed alla gara del servizio di ingegneria il CIG Z4308A9C8E.»

Visto il D. Lgs. 163/2006 e s.m.ed i.;

Visto il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti DPR 207/2010;

Visto l'Allegato n.4/2 al D.Lgs 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 10/01/2014, prot. n. 6/Gab., con il quale sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali;

D E T E R M I N A

1) la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di approvare il 2° stato di avanzamento dei lavori di "Miglioramento della sostenibilità ambientale e delle prestazioni energetiche del patrimonio edilizio del settore terziario nell'area Vasta 'Capitanata 2020' per l'edificio scolastico Scuola elementare "Cesare Battisti", emesso dalla Direzione lavori per il complessivo importo netto di € 159.562,68, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 8.835,23, ed eseguiti a tutto il 13/04/2015 dall'Impresa

Sedir Srl, in dipendenza del contratto di appalto rep. n.119 del 04.04.2013, registrato a Cerignola il 09.04.2013 al n.29 S.1 AA.PP.;

3) di approvare altresì il relativo certificato di pagamento n.2, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, ing. Clorindo Izzillo, con il quale, dedotto l'acconto di cui al 1° SAL e le ritenute di legge, è stato accertato e riconosciuto a favore della predetta appaltatrice il credito di € 76.600,00, procedendo alla contestuale liquidazione e pagamento, previo accredito delle necessarie somme da parte della Regione Puglia, a favore della citata appaltatrice dell'importo di complessivi € 93.452,00, iva nella misura del 22% pari ad € 16.852,00 compresa;

4) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2015, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

5) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n.4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di complessivi € 93.452,00, necessaria per il pagamento a favore della Ditta Sedir s.r.l. del corrispettivo lavori 2° SAL, sul cap. 31312, Bil. 2012 intervento 2.04.02.01, "Progetto efficientamento energetico scuola elementare "Cesare Battisti" fin. reg. - imp. n. 779 - sub. 2, imputandola sul Bilancio 2015;

6) di autorizzare il Servizio Risorse Finanziarie a procedere all'emissione dei relativi mandati di pagamento, previo accredito delle necessarie somme per il pagamento a saldo (€ 21.000,71) in duplice esemplare e a restituire copia conforme a questo Settore Lavori Pubblici e Manutenzione per i successivi adempimenti di rendicontazione delle spese alla Regione Puglia, finanziatrice dell'opera;

7) di trasmettere alla competente struttura Regionale il presente atto unitamente alla documentazione probatoria inerente la spesa in argomento, in conformità alle direttive di cui al "disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e questo Ente attuatore ed ai fini della rendicontazione delle spese e conseguente richiesta di accredito in conto contributo delle relative somme;

8) di dare atto che il Dirigente ha assegnato la redazione del presente atto alla sig.ra Anna Battaglino, in servizio presso l'Ufficio Lavori Pubblici.

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
--

Atto N.411/95

In data **27-05-15**

OGGETTO: PO FESR Puglia 2007-2013, Asione 2.4.1 - Area Vasta Capitanata 2020 - Lavori per l'energizzazione scuola elementare C. Battisti - Approvazione e liquidazione 2' stato avanzamento lavori.

Ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 93.452,00 (CIG. 4564428D21) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	------	------------	--------------	--------------------

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

31312/	93.452,00	236	29-10-2012	2040201
--------	-----------	-----	------------	---------

Cerignola, lì 27-05-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Dott. SARACINO DOTT. ADRIANO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to IZZILLO ING. CLORINDO

Copia conforme all'originale, **27-05-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **28-05-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **13673** del **27-05-15** al Commissario Prefettizio;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **27-05-15**.


Dal Palazzo di Città, **27-05-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **28-05-15** al **11-06-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **12-06-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria



SEDIR srl
Impresa costruzioni
edili stradali e restauro

18



Spett.le Comune di Cerignola
Dirigente Settore Lavori pubblici e manutenzione
Piazza della Repubblica
Cerignola

OGGETTO: Lavori di miglioramento della sostenibilità ambientale e delle prestazioni energetiche del patrimonio edilizio del settore terziario nell'area vasta "Capitanata 2020" a valere sull'azione 2.4.1 del P.O. FESR Puglia 2007/2013, per l'edificio scolastico Scuola Elementare "Cesare Battisti" - - Contratto rep. N.119 del 09/04/2013 n.29 **CUP J36E12000680002 - GIG 4564428D21**

Comunicazione ai sensi dell'art. 3, comma 7, legge 139/2010 e successive m. e i.

Il Sottoscritto Biancofiore Gerardo nato a Cerignola il 09/11/1966 ed ivi residente in Corso Aldo Moro, 139 rappresentante legale dell'impresa SEDIR srl con sede in Cerignola alla Via Dante, 4 P.IVA 01378670713, comunica gli estremi del C/C dedicato, in adempimento agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dall'art. 3, comma 7 della legge 136/2010 e s.m.i., relativamente ai pagamenti previsti in esecuzione dell'appalto in oggetto:

BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT 45 Y 01010 78382 000020606108

Persona delegata ad operare sul conto corrente sopra citato è lo scrivente, nella qualità di rappresentante legale dell'impresa i cui estremi sono:

Biancofiore Gerardo, nato a Cerignola il 09/11/1966, residente in Cerignola al Corso Aldo Moro, 139 C.F. BNC GRD 66S09 C514K

CERIGNOLA 06-12-2013

L'Amministratore Unico
IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI
SEDIR S.R.L.
L'Amministratore Unico
Gerardo Biancofiore

98

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - STATO DI AVANZAMENTO LAVORI ALLA DATA DEL 15/06/2015
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	35943028	del	15/06/2015
Riferimento	44/13	del	30/01/0013
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20130828349446		

Spett.le SEDIR SRL
moreodomenico@legalmail.it

Spett.le COMUNE DI CERIGNOLA SETTORE LAVORI PUBBLICI E
MANUTENZIONE
dirigente.llpp.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it

Impresa	SEDIR SRL				
Sede legale	VIA DANTE 4 71042 CERIGNOLA (FG)				
Sede operativa/Ind attività	VIA DANTE 4 71042 CERIGNOLA (FG)				
Codice Fiscale	01378670713	e-mail	studio.moreo@libero.it	e-mail PEC	moreodomenico@legalmail.it
C.C.N.L. applicato	Edilizia				
Stazione Appaltante/AP	00362170714 - COMUNE DI CERIGNOLA SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1 71042 CERIGNOLA (FG) e-mail: capo.uff.llpp@comune.cerignola.fg.it e-mail PEC: dirigente.llpp.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it				
Oggetto dell'appalto	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA BATTISTI				

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

☒ I.N.A.I.L. - Sede di FOGGIA

☒ È assicurata con Codice Ditta n° 4003336

Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 15/06/2015

Il responsabile del procedimento LONGO PAOLO

☒ I.N.P.S. - Sede di FOGGIA

☒ È iscritta con Matricola Azienda n° 3103592801

Risulta regolare con il versamento dei contributi al 15/06/2015

Il responsabile del procedimento LA VIOLA MARIANO

☒ CASSA EDILE - C.E.C. FOGGIA - FG

☒ È iscritta con C.I. n° 4089

Risulta regolare con il versamento dei contributi al 31/10/2013

Cantiere: VIA BATTISTI 1, 71042 CERIGNOLA (FG)

Il responsabile del procedimento CAGIANO CARMELA

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.


Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dalla CASSA EDILE in data 17/06/2015

Per INAIL-INPS-CASSA EDILE

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

MARSEGLIA FRANCESCO SAVERIO





COMUNE DI CERIGNOLA

*Settore Lavori Pubblici e Manutenzione
Ufficio Realizzazione LL.PP.*

Prot.n° 16933

Cerignola, - 2 LUG. 2015

OGGETTO: Miglioramento della sostenibilità ambientale e delle prestazioni energetiche del patrimonio edilizio del settore terziario nell'Area vasta "Capitanata 2020" – Efficientamento energetico Sc. elementare C. Battisti – PO FESR 2007/2013 Regione Puglia - Asse II - Linea di Intervento 2.4 – Azione 2.4.1 – CUP J36E12000680002 – Liquidazione corrispettivo esecuzione lavori al 2° SAL – **CIG 4564428D21.**

**Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Ssa Antonella Dituccio
SEDE**

Invito la S.V. a voler disporre il pagamento di € 72.451,29 a favore dell'impresa SEDIR Srl, a titolo di acconto sul corrispettivo lavori eseguiti e contabilizzati al 2° SAL (€ 93.452,00), inerenti l'efficientamento energetico della Sc. elementare C. Battisti, giusta quanto disposto con determinazione dirigenziale n. 411/95 del 27/05/2015 di approvazione e liquidazione del relativo stato di avanzamento e certificato di pagamento, nonché della fattura elettronica n. 1/PA del 09.06.2015 – file n.10032232 – acquisita al prot. n. 14727 del 9.6.2015 (reg. il 12.06.2015).

Il suddetto importo dovrà essere corrisposto mediante bonifico da effettuarsi sul conto corrente bancario opportunamente comunicato dalla stessa impresa, giusta comunicazione in atti, ai fini della tracciabilità dei movimenti finanziari in questione (art.3, comma 7 della L.136/2010). Il relativo mandato di pagamento dovrà essere emesso in duplice esemplare, ai fini della rendicontazione delle spese alla Regione Puglia, Ente finanziatore dell'opera..

La spesa di € 72.451,29, trova disponibilità alle corrispondenti voci di quadro economico dell'opera ed imputazione all'intervento 2.04.02.01, Capitolo 31312, bilancio 2012, impegno n. 779, sub 2, liquidazione n.236, correlato al finanziamento regionale concesso sui PO FESR 2007/2013 Asse II - linea.2.4 - Az.2.4.1..per la realizzazione dell'opera, a valere sulla residua disponibilità di cui all'accredito di € 169.330,29 dalla stessa Regione effettuata a titolo di 1^ erogazione in conto contributo.

**Il Responsabile del Procedimento
Direttore Servizi Lavori Pubblici e Manutenzioni
ing. Clorindo Izzillo**

Si Allega:

- * Fattura elettronica esibite dall'impresa;
- * comunicazione ex art.3, comma 7, legge 139/2012 e s.m. e i.;
- * DURC impresa.



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201500000954875

Identificativo Pagamento: PROT.16933/15

Importo: 72451,29 €

Codice Fiscale: 01378670713

Data Inserimento: 10/07/2015 - 12:30

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA
