

COLLAUDO ai sensi dell'art.7 della legge 5-11-1971 n.1086, della struttura in cemento armato dell'edificio residenziale compreso nel Comparto M del Piano di zona 167 - I° lotto del settore B, di proprietà dell'I.A.C.P. di Brindisi e sito in Brindisi al rione Perrino.-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

PROGETTO approvato dalla Commissione Edilizia del Comune di Brindisi nella riunione del 18-3-1980.-

CONCESSIONE PER ESECUZIONE LAVORI EDILI rilasciata dal Sindaco del predetto Comune con provvedimento n.6849/179 del 31-10-1980.-

PROGETTISTA: EDI.CO.M. - UFFICIO TECNICO - BARI.-

DIRETTORE DEI LAVORI : Ing. LONGO Antonio.-

IMPRESA:- DE.GE.CO. s.r.l. con sede in Bari alla via Devito Francesco n. 31/C.-

CALCOLI STATICI: Redatti dal Dott.Ing. A.Petrelli per le travi presollecitate autoportanti e dal Dott.

Ing. Antonio Donativi per le altre strutture, sono

stati presentati all'Ufficio del Genio Civile di

Brindisi in data 3-6-1981 e acquisiti agli atti del

medesimo Ufficio con numero di pratica 19647 e nume

ro di protocollo 5198.-

DESCRIZIONE DELL'OPERA:- Trattasi di edificio residenziale, elevantesi su 10 piani oltre piano rialza



UFFICIO DEL GENIO CIVILE BRINDISI

Si attesta che copia del presente atto risulta depositato presso questo Ufficio ai sensi della legge 5-11-1971 n. 1086.

19 GIUGNO 1982

Funzionario addetto
NATTORE D'UFFICIO
(Ing. Francesco Santoro)

8/88
to, con pianta a stella nei piani elevati e a piastra in quello rialzato.-

La sua struttura è in cemento armato del tipo tradizionale nelle travi rovesce in fondazione e nei pilastri in elevato, e del tipo presollecitato-autoportante nelle travi delle strutture in elevato.-

Il piano rialzato è destinato a zone di parcheggio, quelli superiori ad alloggi.-

VERIFICHE EFFETTUATE DALLA DIREZIONE DEI LAVORI:

Il Direttore dei lavori ha provveduto in corso di opera ad effettuare le seguenti prove:-

- prova di carico sul solaio di calpestio di terzo piano, alloggio N-E in corrispondenza del vano-letto matrimoniale, come da verbale in data 12-12-1981 redatto dal medesimo Direttore dei lavori;
- prove di laboratorio allo schiacciamento su n.24 cubetti fatte eseguire dal Laboratorio Sperimentale per le Prove sui Materiali EMMEBI di S. Pancrazio Salentino, che ha rilasciato n.12 certificati n.ri 137 + 148 in data 30-1-1981.-

ULTIMAZIONE DELL'OPERA:- Con relazione in data 12-12-1981, il Direttore dei lavori ha comunicato l'avvenuta esecuzione delle opere suindicate, producendo altresì i certificati delle prove eseguite in corso d'opera, alligandovi il verbale delle prove di cari

co sul solaio predetto e i certificati rilasciati dal Laboratorio Sperimentale per le Prove sui Materiali di S. Pancrazio Salentino.-

COLLAUDATORE:- Il sottoscritto Santostasi Ing. Francesco iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi dal 22-4-1965 al n.132, all'uopo incaricato dal proprietario.-


VISITA DI COLLAUDO

La visita di collaudo ha avuto luogo il 19-12-1981 con la partecipazione dei Sigg.ri:-

- Ing. Antonio Longo - Direttore dei lavori;
- Ing. Filippo De Cristofaro - in rappresentanza della Ditta DE.GE.CO. s.r.l.-

Con la scorta degli elaborati di progetto e degli esecutivi delle strutture in cemento armato il sottoscritto, unitamente agli altri intervenuti alla visita ha esaminato le opere oggetto di collaudo, riscontrando la loro corrispondenza alle risultanze di calcolo, tramite misurazioni e saggi.-

Esse, inoltre, si sono presentate integre senza alcun segno anche capillare di dissesto, con conglomerato cementizio compatto e tenace, costituito da inerti di natura calcarea di buona qualità e dimensioni opportune, legati con cemento che ha fatto buona presa, mentre l'armatura metallica ben svilup

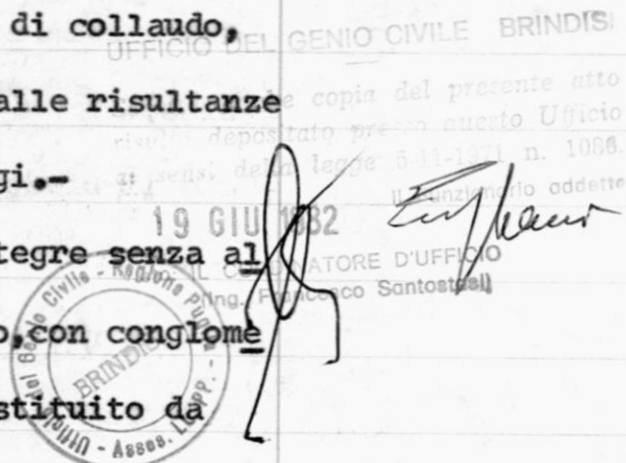

pata nel conglomerato cementizio é esente da qualsia
si traccia di ruggine.-

Per ulteriore verifica delle strutture, oggetto di
collaudo, il sottoscritto ha provveduto ad effettua
re mediante sclerometro, prove allo schiacciamento
sia in fondazione, che in elevazione, ottenendo valo
ri di resistenza oscillanti tra 320 e 425 Kg/mq.-

CERTIFICATO DI COLLAUDO

Ciò premesso il sottoscritto collaudatore conside
rato:-

- che le esaminate strutture in cemento armato sono
state eseguite secondo le buone regole dell'arte,
in conformità alle indicazioni degli esecutivi di
calcolo;
- che le prove effettuate dal Direttore dei lavori
e dal sottoscritto hanno dato risultati che garan
tiscono la idoneità statica delle strutture mede
sime;
- che il Direttore dei lavori, inoltre, ha assicura
to la buona esecuzione delle opere, anche di quel
le che non é stato possibile verificare.-

Ciò premesso e considerato;

DICHIARA COLLAUDABILE


così come in effetti con il presente atto collauda
le strutture in cemento armato dell'edificio residen

ziale nel comparto M del Piano di zona 167 - lotto
1° del settore B, di proprietà dell'I.A.C.P. e sito
in Brindisi al rione Perrino.-

Brindisi, lì 21-12-1981


IL COLLAUDATORE

(Ing. Santostasi Francesco)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Ing. Antonio Longo)



PER L'IMPRESA DE.GE.CO.

(Ing. Filippo De Cristofaro)

