

Istituto Autonomo Case Popolari

Provincia di Brindisi

CRONOPROGRAMMA


OGGETTO: Lavori di recupero del patrimonio edilizio IACP nel Comune di Brindisi. - Lotti 5° all'11° Legge 640 e lotto 4° via Marsica.


COMMITTENTE: IACP Brindisi


Brindisi, 09/12/2004

Il Tecnico
(geom. Rocco CAFORIO)


ID	Nome attività	Durata	Importo	maggio 2005												
				02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
1	Allestimento cantiere LOTTO 4° VIA MARSICA	7 g	0.00													
2	Montaggio impalcatura	14 g	6 482.01													
3	Spicconatura di intonaci	7 g	8 742.94													
4	Svellimento di pavimenti, demolizione di vecchio asfalto	7 g	715.56													☐
5	Smuratura infissi e smontaggio di condutture.	7 g	451.67													☐
6	Smontaggio di tubazioni di Eternit.	7 g	1 163.40													☐
7	Demolizione di muratura, rivestimenti, gradini, ecc.	7 g	1 092.46													☐
8	Ripristino strutture ammalorate.	21 g	16 171.85													☐
9	impermeabilizzazione con guaina, spalmatura di vernice bituminosa e n	7 g	3 292.42													
10	rinzafo per esterni	7 g	1 054.04													
11	Intonaco per superfici esterne, intonaco pletrificante tipo Terranova e l	35 g	43 158.85													
12	Intonaco comune liscio	7 g	545.00													
13	Trattamento di param. in carparo e forn. e pavimentazione di lastrici sc	7 g	3 792.41													
14	Fornitura e posa in opera di lastre di pietra di Trani o Travertino	14 g	7 422.68													
15	Discendenti di pluviali	7 g	1 405.80													
16	Fornitura e posa in opera di portone principale in alluminio, infissi per \	7 g	5 503.48													
17	Tinteggiatura di pareti e soffitti	7 g	255.36													
18	Dipintura di pareti esterne	21 g	3 043.51													
19	Smontaggio impalcatura	7 g	0.00													
20	Smobilizzo Cantiere	7 g	0.00													
21	Allestimento cantiere LOTTI 5°, 6° E 7° VIA DE PACE, VIA ELIA E VIA	7 g	0.00													
22	Svellimento di lastrici solari	14 g	12 444.48													
23	Esecuzione in opera di cemento cellulare	28 g	22 810.41													
24	Impermeabilizzazione di terrazze	14 g	10 185.70													
25	Pavimentazione lastrici solari	35 g	26 271.68													
26	Ripristino di strutture ammalorate in c.a. ammalorate e nolo piattaforma	42 g	29 629.50													
27	Tinteggiatura di pareti e soffitti	7 g	2 599.20													
28	Smobilizzo cantiere	7 g	0.00													
29	Allestimento cantiere LOTTI 8° LUCREZIO	7 g	0.00													
30	Demolizione di vecchio asfalto e svellimento di lastrici solari	7 g	4 562.82													
31	Esecuzione opere in cemento cellulare	7 g	6 011.82													
32	Impermeabilizzazione di terrazze	7 g	3 726.30													
33	Pavimentazione lastrici solari	14 g	9 632.62													
34	Ripristino di strutture in c.a. ammalorate e nolo piattaforma	14 g	10 694.00													

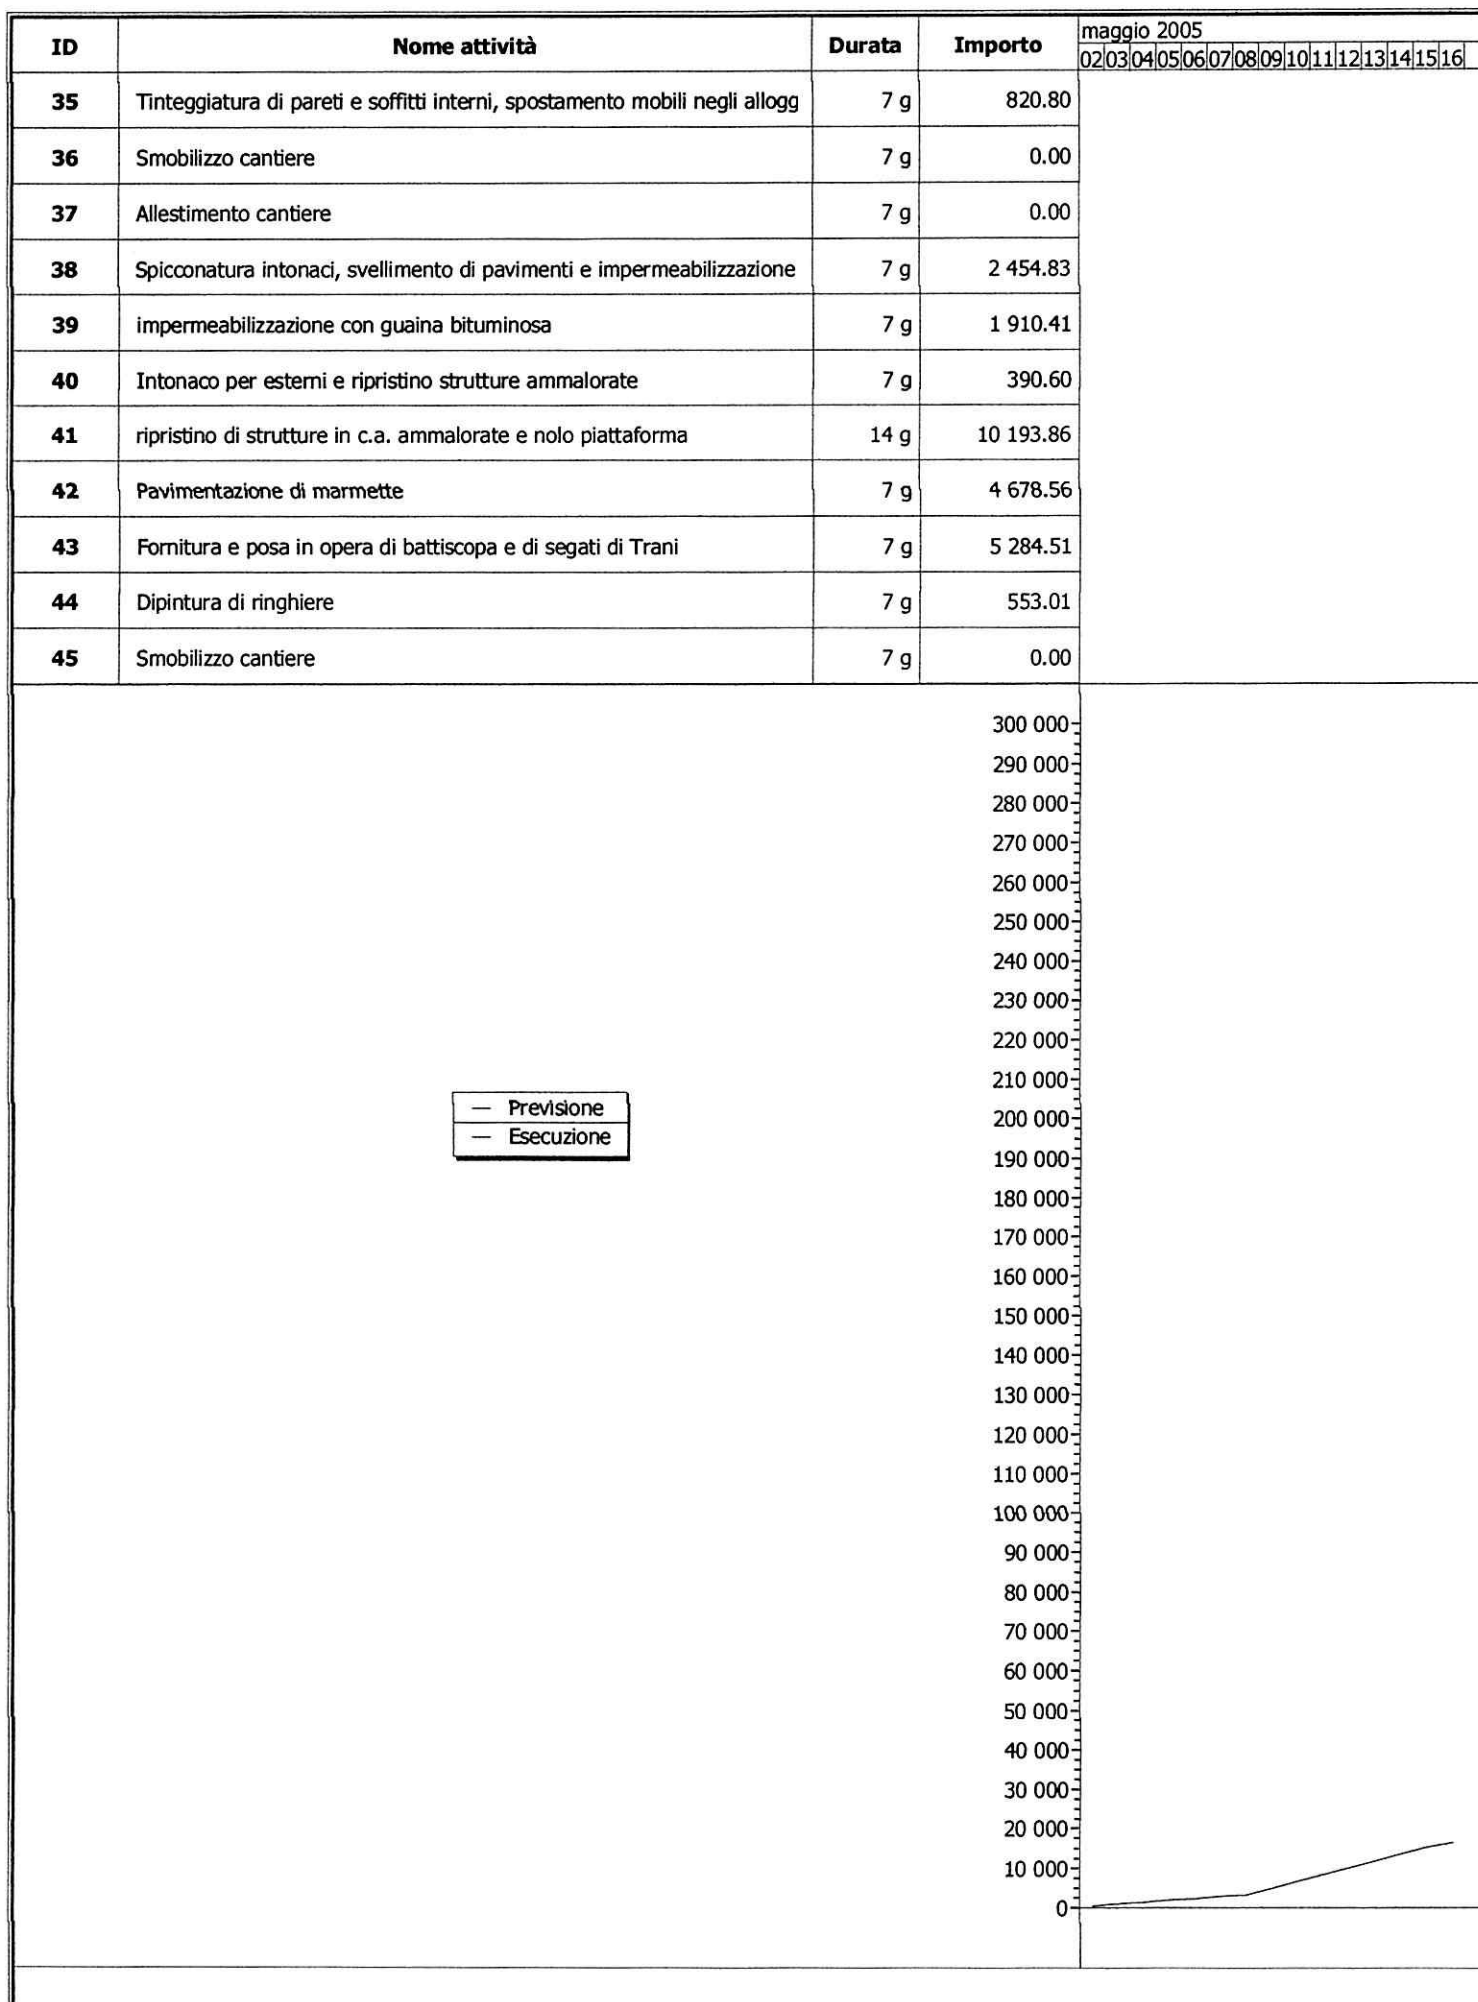


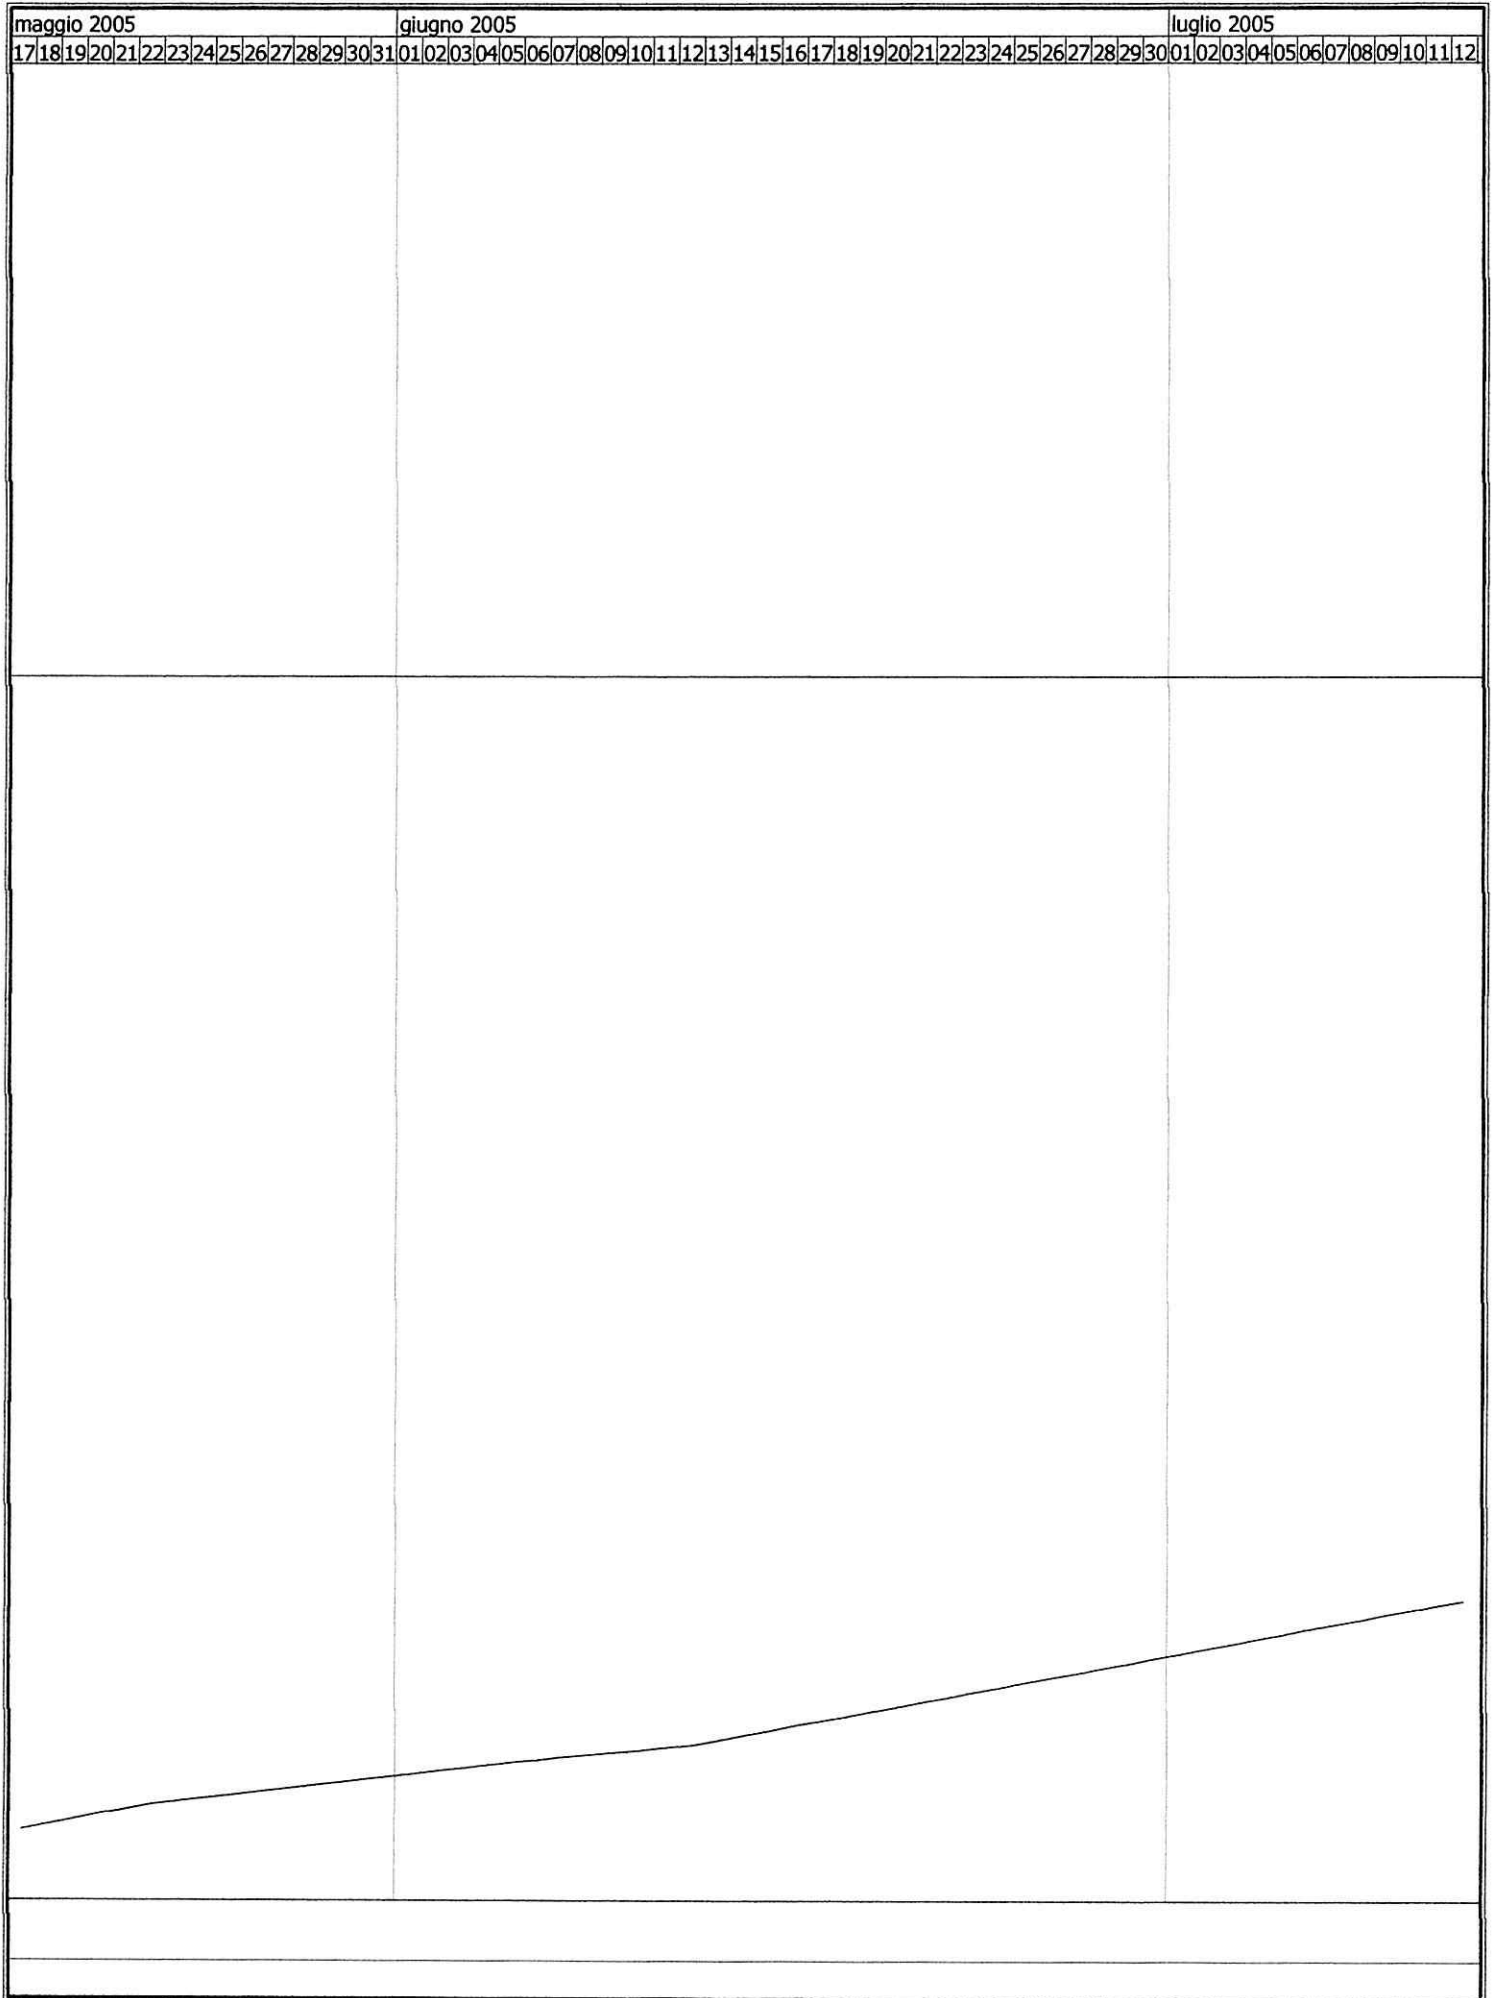

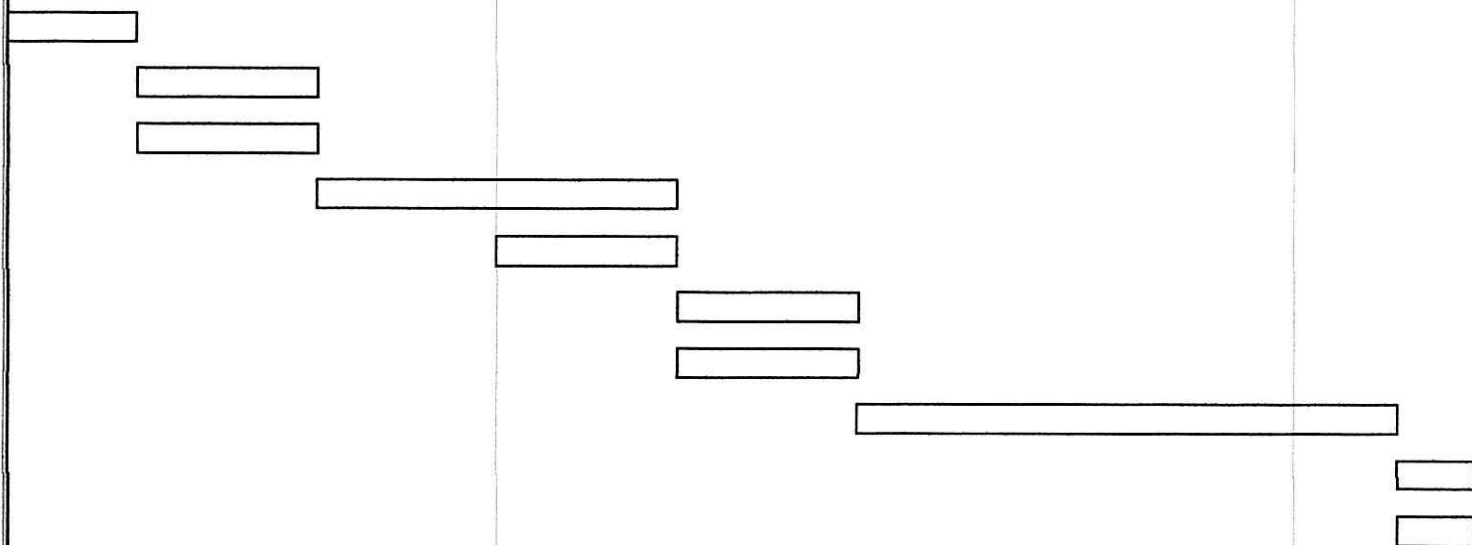


settembre 2005																														ottobre 2005																															novemb		
08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03							

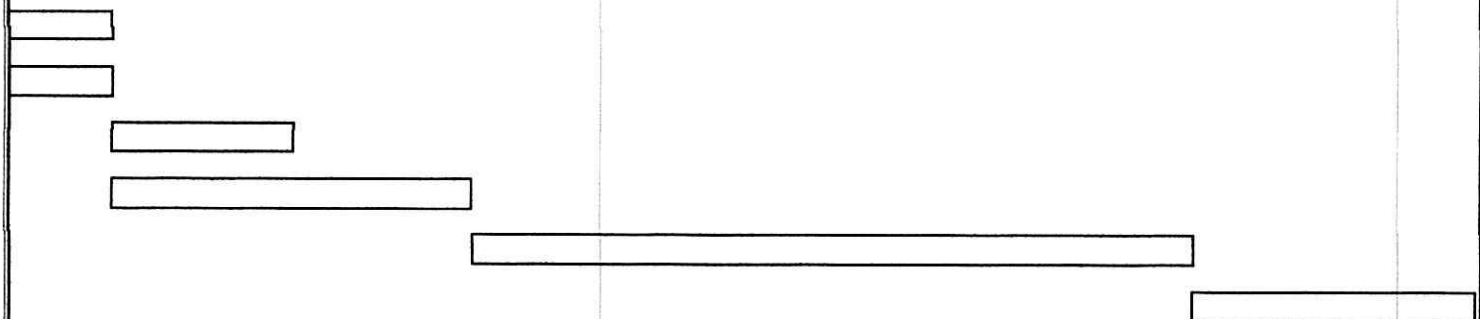

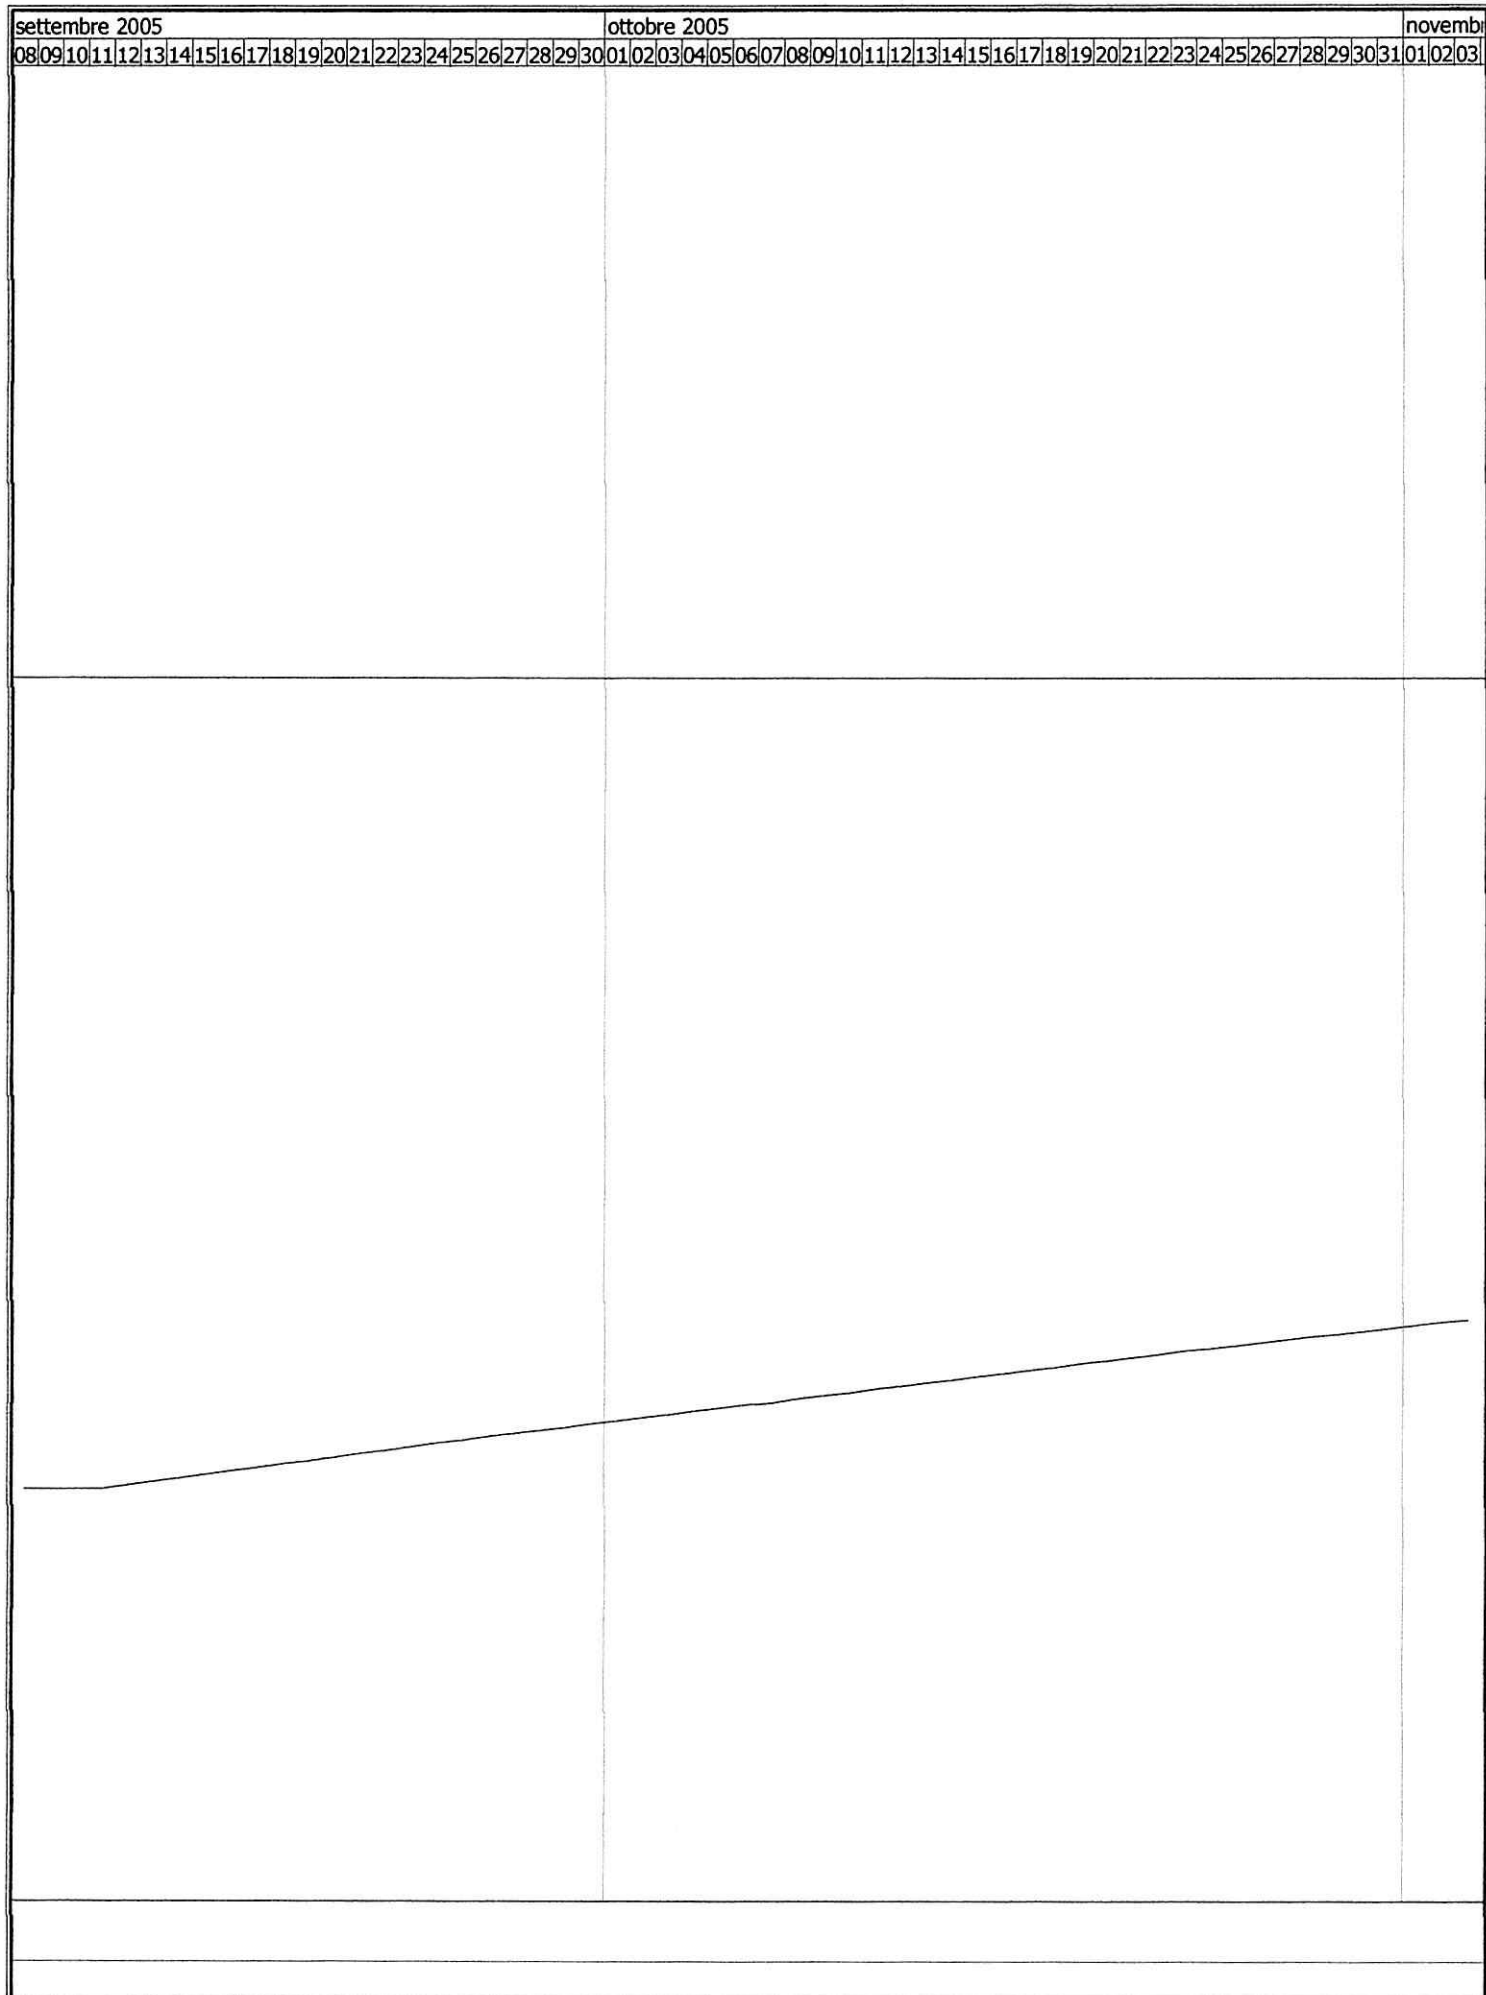


dicembre 2006																															febbraio 2006																									
31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

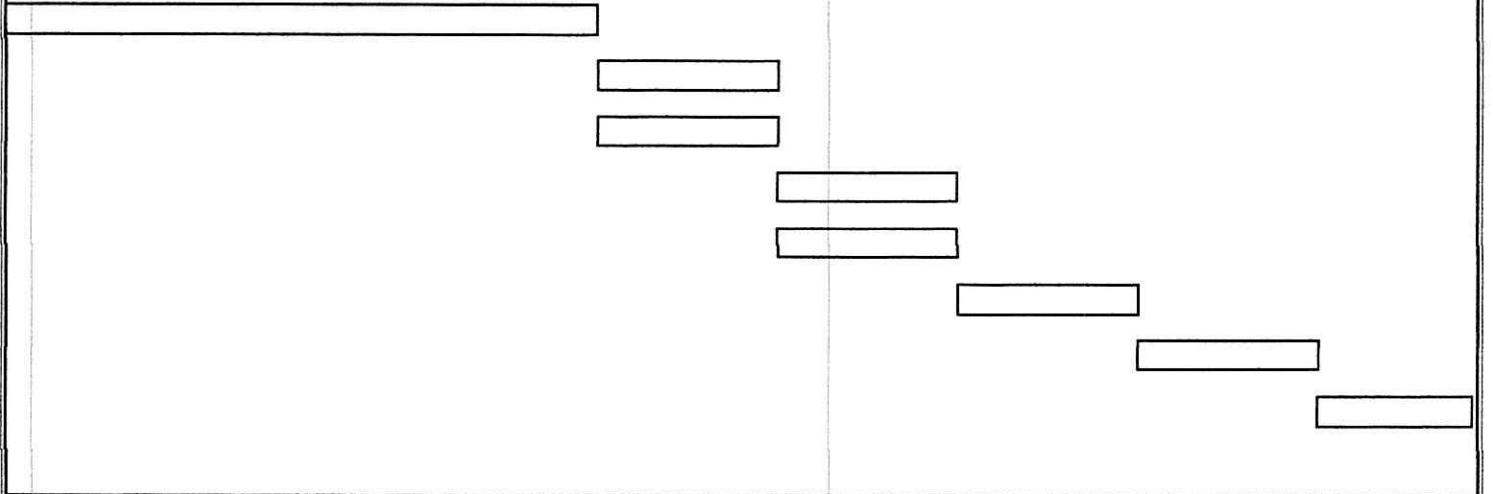


febbraio 2006

31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

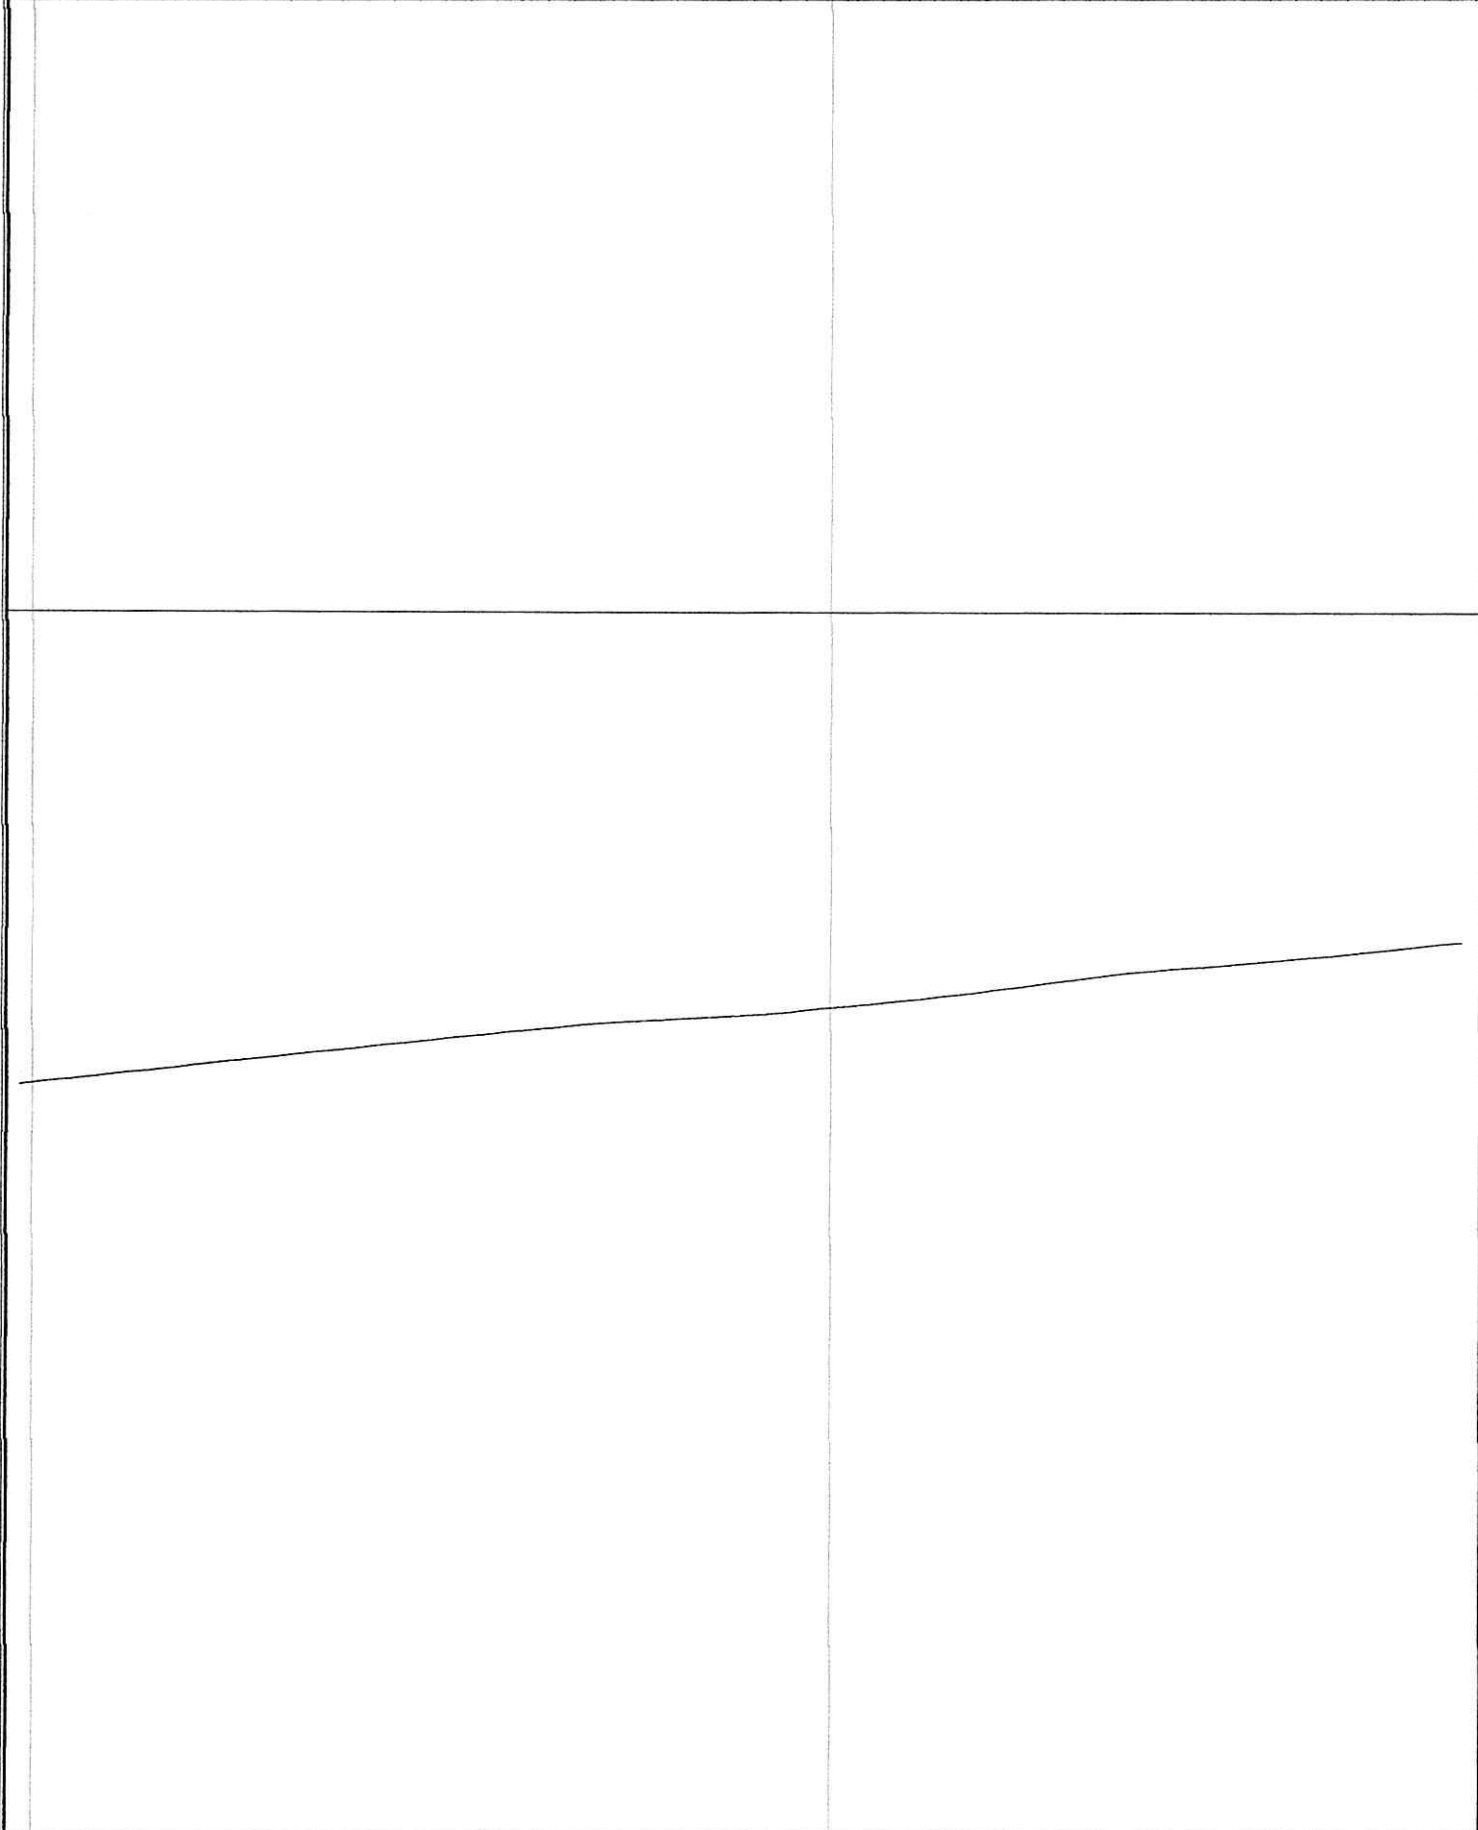

COMMITTENTE: IACP Brindisi

[illegible]

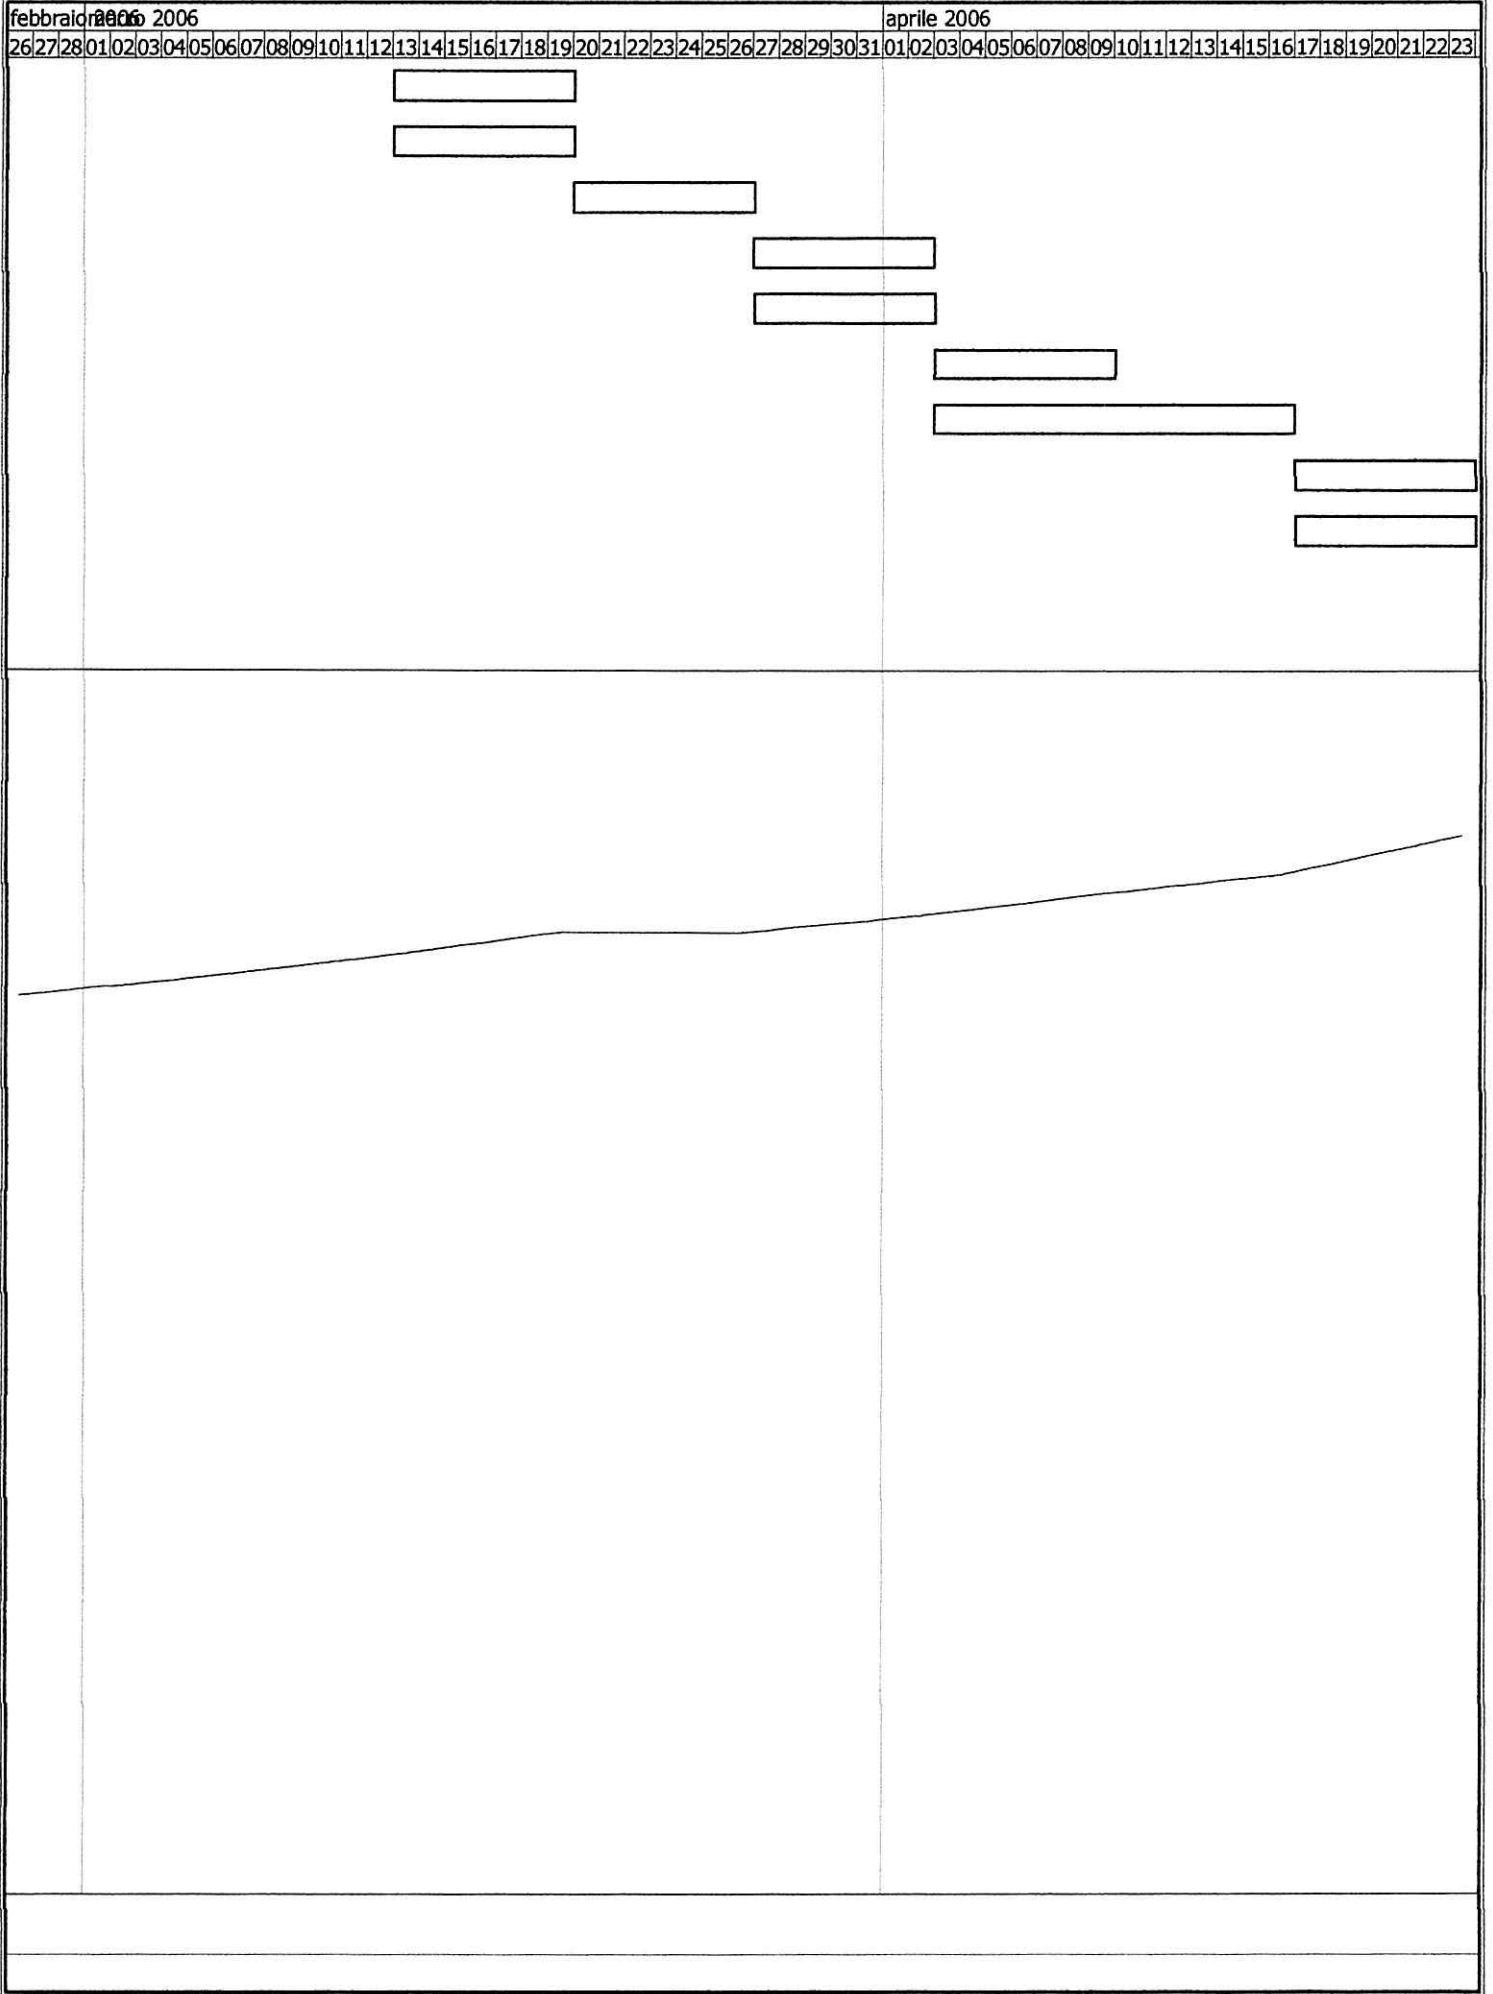

Istituto Autonomo Case Popolari

Provincia di Brindisi

Tabella Attività

OGGETTO: Lavori di recupero del patrimonio edilizio IACP nel Comune di Brindisi. - Lotti 5° all'11° Legge 640 e lotto 4° via Marsica.

COMMITTENTE: IACP Brindisi

Brindisi, 09/12/2004

Il Tecnico
(geom. Rocco CAFORIO)

ATTIVITA'	PREVISTO			Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	euro	(%)			Lav.	Tot.
Allestimento cantiere LOTTO 4° VIA MARSICA	0.00	0.00	0.00	02/05/2005	08/05/2005	7	7
Montaggio impalcatura	6 482.01	3.35	2.41	02/05/2005	15/05/2005	14	14
Spicconatura di intonaci	8 742.94	4.52	3.25	09/05/2005	15/05/2005	7	7
Svellimento di pavimenti, demolizione di vecchio asfalto	715.56	0.37	0.27	16/05/2005	22/05/2005	7	7
Smuratura infissi e smontaggio di condutture.	451.67	0.23	0.17	16/05/2005	22/05/2005	7	7
Smontaggio di tubazioni di Eternit.	1 163.40	0.60	0.43	16/05/2005	22/05/2005	7	7
Demolizione di muratura, rivestimenti, gradini, ecc.	1 092.46	0.56	0.41	16/05/2005	22/05/2005	7	7
Ripristino strutture ammalorate.	16 171.85	8.35	6.01	16/05/2005	05/06/2005	21	21
impermeabilizzazione con guaina, spalmatura di vernice bituminosa e membrana pref. a base di bitume	3 292.42	1.70	1.22	06/06/2005	12/06/2005	7	7
rinzafo per esterni	1 054.04	0.54	0.39	06/06/2005	12/06/2005	7	7
Intonaco per superfici esterne, intonaco pietrificante tipo Terranova e F. e p.o. di rete in vetro resina	43 158.85	22.29	16.04	13/06/2005	17/07/2005	35	35
Intonaco comune liscio	545.00	0.28	0.20	18/07/2005	24/07/2005	7	7
Trattamento di param. in carparo e forn. e pavimentazione di lastrici solari	3 792.41	1.96	1.41	18/07/2005	24/07/2005	7	7
Fornitura e posa in opera di lastre di pietra di Trani o Travertino	7 422.68	3.83	2.76	25/07/2005	07/08/2005	14	14
Discendenti di pluviali	1 405.80	0.73	0.52	01/08/2005	07/08/2005	7	7
Fornitura e posa in opera di portone principale in alluminio, infissi per vetrate e vetri retinati.	5 503.48	2.84	2.04	08/08/2005	14/08/2005	7	7
Tinteggiatura di pareti e soffitti	255.36	0.13	0.09	08/08/2005	14/08/2005	7	7
Dipintura di pareti esterne	3 043.51	1.57	1.13	15/08/2005	04/09/2005	21	21
Smontaggio Impalcatura	0.00	0.00	0.00	05/09/2005	11/09/2005	7	7
Smobilizzo Cantiere	0.00	0.00	0.00	05/09/2005	11/09/2005	7	7
Allestimento cantiere LOTTI 5°, 6° E 7° VIA DE PACE, VIA ELIA E VIA MONACO.	0.00	0.00	0.00	12/09/2005	18/09/2005	7	7
Svellimento di lastrici solari	12 444.48	6.43	4.62	12/09/2005	25/09/2005	14	14
Esecuzione in opera di cemento cellulare	22 810.41	11.78	8.48	26/09/2005	23/10/2005	28	28
Impermeabilizzazione di terrazze	10 185.70	5.26	3.78	24/10/2005	06/11/2005	14	14
Pavimentazione lastrici solari	26 271.68	13.57	9.76	07/11/2005	11/12/2005	35	35
Ripristino di strutture ammalorate in c.a. ammalorate e nolo piattaforma	29 629.50	15.30	11.01	12/12/2005	22/01/2006	42	42
Tinteggiatura di pareti e soffitti	2 599.20	1.34	0.97	23/01/2006	29/01/2006	7	7
Smobilizzo cantiere	0.00	0.00	0.00	23/01/2006	29/01/2006	7	7
Allestimento cantiere LOTTI 8° LUCREZIO	0.00	0.00	0.00	30/01/2006	05/02/2006	7	7
Demolizione di vecchio asfalto e svellimento di lastrici solari	4 562.82	2.36	1.70	30/01/2006	05/02/2006	7	7
Esecuzione opere in cemento cellulare	6 011.82	3.10	2.23	06/02/2006	12/02/2006	7	7
Impermeabilizzazione di terrazze	3 726.30	1.92	1.38	13/02/2006	19/02/2006	7	7

ATTIVITA'	PREVISTO			Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	euro	(%)			Lav.	Tot.
Pavimentazione lastrici solari	9 632.62	4.97	3.58	20/02/2006	05/03/2006	14	14
Ripristino di strutture in c.a. ammalorate e nolo piattaforma	10 694.00	5.52	3.97	06/03/2006	19/03/2006	14	14
Tinteggiatura di pareti e soffitti interni, spostamento mobili negli alloggi	820.80	0.42	0.30	13/03/2006	19/03/2006	7	7
Smobilizzo cantiere	0.00	0.00	0.00	13/03/2006	19/03/2006	7	7
Allestimento cantiere	0.00	0.00	0.00	20/03/2006	26/03/2006	7	7
Spicconatura intonaci, svellimento di pavimenti e impermeabilizzazione terrazze	2 454.83	1.27	0.91	27/03/2006	02/04/2006	7	7
impermeabilizzazione con guaina bituminosa	1 910.41	0.99	0.71	27/03/2006	02/04/2006	7	7
Intonaco per esterni e ripristino strutture ammalorate	390.60	0.20	0.15	03/04/2006	09/04/2006	7	7
ripristino di strutture in c.a. ammalorate e nolo piattaforma	10 193.86	5.26	3.79	03/04/2006	16/04/2006	14	14
Pavimentazione di marmette	4 678.56	2.42	1.74	17/04/2006	23/04/2006	7	7
Fornitura e posa in opera di battiscopa e di segati di Trani	5 284.51	2.73	1.96	17/04/2006	23/04/2006	7	7
Dipintura di ringhiere	553.01	0.29	0.21	24/04/2006	30/04/2006	7	7
Smobilizzo cantiere	0.00	0.00	0.00	24/04/2006	30/04/2006	7	7
Brindisi, 09/12/2004							
il Tecnico geom. Rocco CAFORIO							

DATA	IMPORTI PREVISTI				
	Parziale euro	Parziale euro	Progressivo euro	Progressivo euro	(%)
02/05/2005	463.00	0.24	463.00	0.24	0.17
03/05/2005	463.00	0.24	926.00	0.48	0.34
04/05/2005	463.00	0.24	1 389.00	0.72	0.52
05/05/2005	463.00	0.24	1 852.00	0.96	0.69
06/05/2005	463.00	0.24	2 315.00	1.20	0.86
07/05/2005	463.00	0.24	2 778.00	1.43	1.03
08/05/2005	463.00	0.24	3 241.01	1.67	1.20
09/05/2005	1 711.99	0.88	4 953.00	2.56	1.84
10/05/2005	1 711.99	0.88	6 664.99	3.44	2.48
11/05/2005	1 711.99	0.88	8 376.98	4.33	3.11
12/05/2005	1 711.99	0.88	10 088.97	5.21	3.75
13/05/2005	1 711.99	0.88	11 800.97	6.09	4.38
14/05/2005	1 711.99	0.88	13 512.96	6.98	5.02
15/05/2005	1 711.99	0.88	15 224.95	7.86	5.66
16/05/2005	1 259.10	0.65	16 484.05	8.51	6.12
17/05/2005	1 259.10	0.65	17 743.15	9.16	6.59
18/05/2005	1 259.10	0.65	19 002.25	9.81	7.06
19/05/2005	1 259.10	0.65	20 261.35	10.46	7.53
20/05/2005	1 259.10	0.65	21 520.45	11.11	8.00
21/05/2005	1 259.10	0.65	22 779.56	11.76	8.46
22/05/2005	1 259.10	0.65	24 038.66	12.41	8.93
23/05/2005	770.09	0.40	24 808.74	12.81	9.22
24/05/2005	770.09	0.40	25 578.83	13.21	9.50
25/05/2005	770.09	0.40	26 348.92	13.61	9.79
26/05/2005	770.09	0.40	27 119.01	14.01	10.08
27/05/2005	770.09	0.40	27 889.10	14.40	10.36
28/05/2005	770.09	0.40	28 659.19	14.80	10.65
29/05/2005	770.09	0.40	29 429.27	15.20	10.93
30/05/2005	770.09	0.40	30 199.36	15.60	11.22
31/05/2005	770.09	0.40	30 969.45	15.99	11.51
01/06/2005	770.09	0.40	31 739.54	16.39	11.79
02/06/2005	770.09	0.40	32 509.63	16.79	12.08
03/06/2005	770.09	0.40	33 279.71	17.19	12.36
04/06/2005	770.09	0.40	34 049.80	17.59	12.65
05/06/2005	770.09	0.40	34 819.89	17.98	12.94
06/06/2005	620.92	0.32	35 440.81	18.30	13.17
07/06/2005	620.92	0.32	36 061.74	18.62	13.40
08/06/2005	620.92	0.32	36 682.66	18.95	13.63
09/06/2005	620.92	0.32	37 303.58	19.27	13.86
10/06/2005	620.92	0.32	37 924.50	19.59	14.09
11/06/2005	620.92	0.32	38 545.43	19.91	14.32
12/06/2005	620.92	0.32	39 166.35	20.23	14.55
13/06/2005	1 233.11	0.64	40 399.46	20.86	15.01
14/06/2005	1 233.11	0.64	41 632.57	21.50	15.47
15/06/2005	1 233.11	0.64	42 865.68	22.14	15.93
16/06/2005	1 233.11	0.64	44 098.79	22.78	16.38
17/06/2005	1 233.11	0.64	45 331.90	23.41	16.84
18/06/2005	1 233.11	0.64	46 565.01	24.05	17.30
19/06/2005	1 233.11	0.64	47 798.12	24.69	17.76
20/06/2005	1 233.11	0.64	49 031.23	25.32	18.22
21/06/2005	1 233.11	0.64	50 264.34	25.96	18.68
22/06/2005	1 233.11	0.64	51 497.45	26.60	19.13
23/06/2005	1 233.11	0.64	52 730.56	27.23	19.59
24/06/2005	1 233.11	0.64	53 963.67	27.87	20.05
25/06/2005	1 233.11	0.64	55 196.78	28.51	20.51
26/06/2005	1 233.11	0.64	56 429.89	29.14	20.97
27/06/2005	1 233.11	0.64	57 663.00	29.78	21.42
28/06/2005	1 233.11	0.64	58 896.11	30.42	21.88
29/06/2005	1 233.11	0.64	60 129.22	31.05	22.34
30/06/2005	1 233.11	0.64	61 362.33	31.69	22.80
01/07/2005	1 233.11	0.64	62 595.44	32.33	23.26
02/07/2005	1 233.11	0.64	63 828.55	32.96	23.71
03/07/2005	1 233.11	0.64	65 061.66	33.60	24.17
04/07/2005	1 233.11	0.64	66 294.77	34.24	24.63
05/07/2005	1 233.11	0.64	67 527.88	34.88	25.09
06/07/2005	1 233.11	0.64	68 760.99	35.51	25.55

DATA	IMPORTI PREVISTI				
	Parziale euro	Parziale euro	Progressivo euro	Progressivo euro	(%)
07/07/2005	1 233.11	0.64	69 994.10	36.15	26.01
08/07/2005	1 233.11	0.64	71 227.21	36.79	26.46
09/07/2005	1 233.11	0.64	72 460.32	37.42	26.92
10/07/2005	1 233.11	0.64	73 693.43	38.06	27.38
11/07/2005	1 233.11	0.64	74 926.54	38.70	27.84
12/07/2005	1 233.11	0.64	76 159.65	39.33	28.30
13/07/2005	1 233.11	0.64	77 392.76	39.97	28.75
14/07/2005	1 233.11	0.64	78 625.87	40.61	29.21
15/07/2005	1 233.11	0.64	79 858.98	41.24	29.67
16/07/2005	1 233.11	0.64	81 092.09	41.88	30.13
17/07/2005	1 233.11	0.64	82 325.20	42.52	30.59
18/07/2005	619.63	0.32	82 944.83	42.84	30.82
19/07/2005	619.63	0.32	83 564.46	43.16	31.05
20/07/2005	619.63	0.32	84 184.09	43.48	31.28
21/07/2005	619.63	0.32	84 803.72	43.80	31.51
22/07/2005	619.63	0.32	85 423.35	44.12	31.74
23/07/2005	619.63	0.32	86 042.98	44.44	31.97
24/07/2005	619.63	0.32	86 662.61	44.76	32.20
25/07/2005	530.19	0.27	87 192.80	45.03	32.40
26/07/2005	530.19	0.27	87 722.99	45.31	32.59
27/07/2005	530.19	0.27	88 253.18	45.58	32.79
28/07/2005	530.19	0.27	88 783.38	45.85	32.99
29/07/2005	530.19	0.27	89 313.57	46.13	33.18
30/07/2005	530.19	0.27	89 843.76	46.40	33.38
31/07/2005	530.19	0.27	90 373.95	46.67	33.58
01/08/2005	731.02	0.38	91 104.97	47.05	33.85
02/08/2005	731.02	0.38	91 835.99	47.43	34.12
03/08/2005	731.02	0.38	92 567.01	47.81	34.39
04/08/2005	731.02	0.38	93 298.03	48.18	34.66
05/08/2005	731.02	0.38	94 029.05	48.56	34.94
06/08/2005	731.02	0.38	94 760.07	48.94	35.21
07/08/2005	731.02	0.38	95 491.09	49.32	35.48
08/08/2005	822.69	0.42	96 313.78	49.74	35.78
09/08/2005	822.69	0.42	97 136.47	50.17	36.09
10/08/2005	822.69	0.42	97 959.16	50.59	36.40
11/08/2005	822.69	0.42	98 781.86	51.02	36.70
12/08/2005	822.69	0.42	99 604.55	51.44	37.01
13/08/2005	822.69	0.42	100 427.24	51.87	37.31
14/08/2005	822.69	0.42	101 249.93	52.29	37.62
15/08/2005	144.93	0.07	101 394.86	52.37	37.67
16/08/2005	144.93	0.07	101 539.79	52.44	37.73
17/08/2005	144.93	0.07	101 684.72	52.52	37.78
18/08/2005	144.93	0.07	101 829.65	52.59	37.83
19/08/2005	144.93	0.07	101 974.58	52.67	37.89
20/08/2005	144.93	0.07	102 119.50	52.74	37.94
21/08/2005	144.93	0.07	102 264.43	52.82	38.00
22/08/2005	144.93	0.07	102 409.36	52.89	38.05
23/08/2005	144.93	0.07	102 554.29	52.96	38.10
24/08/2005	144.93	0.07	102 699.22	53.04	38.16
25/08/2005	144.93	0.07	102 844.15	53.11	38.21
26/08/2005	144.93	0.07	102 989.08	53.19	38.26
27/08/2005	144.93	0.07	103 134.01	53.26	38.32
28/08/2005	144.93	0.07	103 278.94	53.34	38.37
29/08/2005	144.93	0.07	103 423.87	53.41	38.43
30/08/2005	144.93	0.07	103 568.79	53.49	38.48
31/08/2005	144.93	0.07	103 713.72	53.56	38.53
01/09/2005	144.93	0.07	103 858.65	53.64	38.59
02/09/2005	144.93	0.07	104 003.58	53.71	38.64
03/09/2005	144.93	0.07	104 148.51	53.79	38.70
04/09/2005	144.93	0.07	104 293.44	53.86	38.75
12/09/2005	888.89	0.46	105 182.33	54.32	39.08
13/09/2005	888.89	0.46	106 071.22	54.78	39.41
14/09/2005	888.89	0.46	106 960.11	55.24	39.74
15/09/2005	888.89	0.46	107 849.01	55.70	40.07
16/09/2005	888.89	0.46	108 737.90	56.16	40.40
17/09/2005	888.89	0.46	109 626.79	56.62	40.73

DATA	IMPORTI PREVISTI				
	Parziale euro	Parziale euro	Progressivo euro	Progressivo euro	(%)
18/09/2005	888.89	0.46	110 515.68	57.08	41.06
19/09/2005	888.89	0.46	111 404.57	57.54	41.39
20/09/2005	888.89	0.46	112 293.46	57.99	41.72
21/09/2005	888.89	0.46	113 182.35	58.45	42.05
22/09/2005	888.89	0.46	114 071.25	58.91	42.38
23/09/2005	888.89	0.46	114 960.14	59.37	42.71
24/09/2005	888.89	0.46	115 849.03	59.83	43.04
25/09/2005	888.89	0.46	116 737.92	60.29	43.37
26/09/2005	814.66	0.42	117 552.58	60.71	43.68
27/09/2005	814.66	0.42	118 367.24	61.13	43.98
28/09/2005	814.66	0.42	119 181.89	61.55	44.28
29/09/2005	814.66	0.42	119 996.55	61.97	44.58
30/09/2005	814.66	0.42	120 811.21	62.39	44.89
01/10/2005	814.66	0.42	121 625.87	62.81	45.19
02/10/2005	814.66	0.42	122 440.52	63.24	45.49
03/10/2005	814.66	0.42	123 255.18	63.66	45.79
04/10/2005	814.66	0.42	124 069.84	64.08	46.10
05/10/2005	814.66	0.42	124 884.50	64.50	46.40
06/10/2005	814.66	0.42	125 699.15	64.92	46.70
07/10/2005	814.66	0.42	126 513.81	65.34	47.01
08/10/2005	814.66	0.42	127 328.47	65.76	47.31
09/10/2005	814.66	0.42	128 143.13	66.18	47.61
10/10/2005	814.66	0.42	128 957.78	66.60	47.91
11/10/2005	814.66	0.42	129 772.44	67.02	48.22
12/10/2005	814.66	0.42	130 587.10	67.44	48.52
13/10/2005	814.66	0.42	131 401.76	67.86	48.82
14/10/2005	814.66	0.42	132 216.41	68.28	49.12
15/10/2005	814.66	0.42	133 031.07	68.70	49.43
16/10/2005	814.66	0.42	133 845.73	69.13	49.73
17/10/2005	814.66	0.42	134 660.39	69.55	50.03
18/10/2005	814.66	0.42	135 475.04	69.97	50.33
19/10/2005	814.66	0.42	136 289.70	70.39	50.64
20/10/2005	814.66	0.42	137 104.36	70.81	50.94
21/10/2005	814.66	0.42	137 919.02	71.23	51.24
22/10/2005	814.66	0.42	138 733.67	71.65	51.55
23/10/2005	814.66	0.42	139 548.33	72.07	51.85
24/10/2005	727.55	0.38	140 275.88	72.45	52.12
25/10/2005	727.55	0.38	141 003.43	72.82	52.39
26/10/2005	727.55	0.38	141 730.98	73.20	52.66
27/10/2005	727.55	0.38	142 458.53	73.57	52.93
28/10/2005	727.55	0.38	143 186.08	73.95	53.20
29/10/2005	727.55	0.38	143 913.63	74.33	53.47
30/10/2005	727.55	0.38	144 641.18	74.70	53.74
31/10/2005	727.55	0.38	145 368.73	75.08	54.01
01/11/2005	727.55	0.38	146 096.28	75.45	54.28
02/11/2005	727.55	0.38	146 823.83	75.83	54.55
03/11/2005	727.55	0.38	147 551.38	76.20	54.82
04/11/2005	727.55	0.38	148 278.93	76.58	55.09
05/11/2005	727.55	0.38	149 006.48	76.96	55.36
06/11/2005	727.55	0.38	149 734.03	77.33	55.63
07/11/2005	750.62	0.39	150 484.65	77.72	55.91
08/11/2005	750.62	0.39	151 235.27	78.11	56.19
09/11/2005	750.62	0.39	151 985.89	78.49	56.47
10/11/2005	750.62	0.39	152 736.51	78.88	56.75
11/11/2005	750.62	0.39	153 487.13	79.27	57.03
12/11/2005	750.62	0.39	154 237.75	79.66	57.31
13/11/2005	750.62	0.39	154 988.37	80.04	57.58
14/11/2005	750.62	0.39	155 738.99	80.43	57.86
15/11/2005	750.62	0.39	156 489.60	80.82	58.14
16/11/2005	750.62	0.39	157 240.22	81.21	58.42
17/11/2005	750.62	0.39	157 990.84	81.60	58.70
18/11/2005	750.62	0.39	158 741.46	81.98	58.98
19/11/2005	750.62	0.39	159 492.08	82.37	59.26
20/11/2005	750.62	0.39	160 242.70	82.76	59.54
21/11/2005	750.62	0.39	160 993.32	83.15	59.82
22/11/2005	750.62	0.39	161 743.94	83.53	60.09

DATA	IMPORTI PREVISTI				
	Parziale euro	Parziale euro	Progressivo euro	Progressivo euro	(%)
23/11/2005	750.62	0.39	162 494.56	83.92	60.37
24/11/2005	750.62	0.39	163 245.18	84.31	60.65
25/11/2005	750.62	0.39	163 995.80	84.70	60.93
26/11/2005	750.62	0.39	164 746.42	85.08	61.21
27/11/2005	750.62	0.39	165 497.04	85.47	61.49
28/11/2005	750.62	0.39	166 247.66	85.86	61.77
29/11/2005	750.62	0.39	166 998.28	86.25	62.05
30/11/2005	750.62	0.39	167 748.90	86.64	62.33
01/12/2005	750.62	0.39	168 499.52	87.02	62.60
02/12/2005	750.62	0.39	169 250.14	87.41	62.88
03/12/2005	750.62	0.39	170 000.75	87.80	63.16
04/12/2005	750.62	0.39	170 751.37	88.19	63.44
05/12/2005	750.62	0.39	171 501.99	88.57	63.72
06/12/2005	750.62	0.39	172 252.61	88.96	64.00
07/12/2005	750.62	0.39	173 003.23	89.35	64.28
08/12/2005	750.62	0.39	173 753.85	89.74	64.56
09/12/2005	750.62	0.39	174 504.47	90.12	64.84
10/12/2005	750.62	0.39	175 255.09	90.51	65.11
11/12/2005	750.62	0.39	176 005.71	90.90	65.39
12/12/2005	705.46	0.36	176 711.17	91.26	65.66
13/12/2005	705.46	0.36	177 416.64	91.63	65.92
14/12/2005	705.46	0.36	178 122.10	91.99	66.18
15/12/2005	705.46	0.36	178 827.57	92.36	66.44
16/12/2005	705.46	0.36	179 533.03	92.72	66.70
17/12/2005	705.46	0.36	180 238.50	93.09	66.97
18/12/2005	705.46	0.36	180 943.96	93.45	67.23
19/12/2005	705.46	0.36	181 649.42	93.81	67.49
20/12/2005	705.46	0.36	182 354.89	94.18	67.75
21/12/2005	705.46	0.36	183 060.35	94.54	68.01
22/12/2005	705.46	0.36	183 765.82	94.91	68.28
23/12/2005	705.46	0.36	184 471.28	95.27	68.54
24/12/2005	705.46	0.36	185 176.75	95.64	68.80
25/12/2005	705.46	0.36	185 882.21	96.00	69.06
26/12/2005	705.46	0.36	186 587.67	96.36	69.33
27/12/2005	705.46	0.36	187 293.14	96.73	69.59
28/12/2005	705.46	0.36	187 998.60	97.09	69.85
29/12/2005	705.46	0.36	188 704.07	97.46	70.11
30/12/2005	705.46	0.36	189 409.53	97.82	70.37
31/12/2005	705.46	0.36	190 115.00	98.19	70.64
01/01/2006	705.46	0.36	190 820.46	98.55	70.90
02/01/2006	705.46	0.36	191 525.92	98.91	71.16
03/01/2006	705.46	0.36	192 231.39	99.28	71.42
04/01/2006	705.46	0.36	192 936.85	99.64	71.68
05/01/2006	705.46	0.36	193 642.32	100.01	71.95
06/01/2006	705.46	0.36	194 347.78	100.37	72.21
07/01/2006	705.46	0.36	195 053.25	100.74	72.47
08/01/2006	705.46	0.36	195 758.71	101.10	72.73
09/01/2006	705.46	0.36	196 464.17	101.47	72.99
10/01/2006	705.46	0.36	197 169.64	101.83	73.26
11/01/2006	705.46	0.36	197 875.10	102.19	73.52
12/01/2006	705.46	0.36	198 580.57	102.56	73.78
13/01/2006	705.46	0.36	199 286.03	102.92	74.04
14/01/2006	705.46	0.36	199 991.50	103.29	74.31
15/01/2006	705.46	0.36	200 696.96	103.65	74.57
16/01/2006	705.46	0.36	201 402.42	104.02	74.83
17/01/2006	705.46	0.36	202 107.89	104.38	75.09
18/01/2006	705.46	0.36	202 813.35	104.74	75.35
19/01/2006	705.46	0.36	203 518.82	105.11	75.62
20/01/2006	705.46	0.36	204 224.28	105.47	75.88
21/01/2006	705.46	0.36	204 929.75	105.84	76.14
22/01/2006	705.46	0.36	205 635.21	106.20	76.40
23/01/2006	371.31	0.19	206 006.52	106.39	76.54
24/01/2006	371.31	0.19	206 377.84	106.59	76.68
25/01/2006	371.31	0.19	206 749.15	106.78	76.82
26/01/2006	371.31	0.19	207 120.47	106.97	76.95
27/01/2006	371.31	0.19	207 491.78	107.16	77.09

DATA	IMPORTI PREVISTI				
	Parziale euro	Parziale euro	Progressivo euro	Progressivo euro	(%)
28/01/2006	371.31	0.19	207 863.10	107.35	77.23
29/01/2006	371.31	0.19	208 234.41	107.54	77.37
30/01/2006	651.83	0.34	208 886.24	107.88	77.61
31/01/2006	651.83	0.34	209 538.07	108.22	77.85
01/02/2006	651.83	0.34	210 189.90	108.55	78.09
02/02/2006	651.83	0.34	210 841.74	108.89	78.34
03/02/2006	651.83	0.34	211 493.57	109.23	78.58
04/02/2006	651.83	0.34	212 145.40	109.56	78.82
05/02/2006	651.83	0.34	212 797.23	109.90	79.06
06/02/2006	858.83	0.44	213 656.06	110.34	79.38
07/02/2006	858.83	0.44	214 514.89	110.79	79.70
08/02/2006	858.83	0.44	215 373.72	111.23	80.02
09/02/2006	858.83	0.44	216 232.56	111.67	80.34
10/02/2006	858.83	0.44	217 091.39	112.12	80.66
11/02/2006	858.83	0.44	217 950.22	112.56	80.98
12/02/2006	858.83	0.44	218 809.05	113.01	81.30
13/02/2006	532.33	0.27	219 341.38	113.28	81.49
14/02/2006	532.33	0.27	219 873.71	113.56	81.69
15/02/2006	532.33	0.27	220 406.04	113.83	81.89
16/02/2006	532.33	0.27	220 938.36	114.11	82.09
17/02/2006	532.33	0.27	221 470.69	114.38	82.29
18/02/2006	532.33	0.27	222 003.02	114.65	82.48
19/02/2006	532.33	0.27	222 535.35	114.93	82.68
20/02/2006	688.04	0.36	223 223.39	115.29	82.94
21/02/2006	688.04	0.36	223 911.44	115.64	83.19
22/02/2006	688.04	0.36	224 599.48	116.00	83.45
23/02/2006	688.04	0.36	225 287.53	116.35	83.70
24/02/2006	688.04	0.36	225 975.57	116.71	83.96
25/02/2006	688.04	0.36	226 663.62	117.06	84.22
26/02/2006	688.04	0.36	227 351.66	117.42	84.47
27/02/2006	688.04	0.36	228 039.70	117.77	84.73
28/02/2006	688.04	0.36	228 727.75	118.13	84.98
01/03/2006	688.04	0.36	229 415.79	118.48	85.24
02/03/2006	688.04	0.36	230 103.84	118.84	85.49
03/03/2006	688.04	0.36	230 791.88	119.19	85.75
04/03/2006	688.04	0.36	231 479.93	119.55	86.00
05/03/2006	688.04	0.36	232 167.97	119.90	86.26
06/03/2006	763.86	0.39	232 931.83	120.30	86.54
07/03/2006	763.86	0.39	233 695.68	120.69	86.83
08/03/2006	763.86	0.39	234 459.54	121.09	87.11
09/03/2006	763.86	0.39	235 223.40	121.48	87.40
10/03/2006	763.86	0.39	235 987.26	121.88	87.68
11/03/2006	763.86	0.39	236 751.11	122.27	87.96
12/03/2006	763.86	0.39	237 514.97	122.67	88.25
13/03/2006	881.11	0.46	238 396.08	123.12	88.57
14/03/2006	881.11	0.46	239 277.20	123.58	88.90
15/03/2006	881.11	0.46	240 158.31	124.03	89.23
16/03/2006	881.11	0.46	241 039.43	124.49	89.56
17/03/2006	881.11	0.46	241 920.54	124.94	89.88
18/03/2006	881.11	0.46	242 801.66	125.40	90.21
19/03/2006	881.11	0.46	243 682.77	125.85	90.54
27/03/2006	623.61	0.32	244 306.38	126.17	90.77
28/03/2006	623.61	0.32	244 929.98	126.50	91.00
29/03/2006	623.61	0.32	245 553.59	126.82	91.23
30/03/2006	623.61	0.32	246 177.19	127.14	91.47
31/03/2006	623.61	0.32	246 800.80	127.46	91.70
01/04/2006	623.61	0.32	247 424.40	127.78	91.93
02/04/2006	623.61	0.32	248 048.01	128.11	92.16
03/04/2006	783.93	0.40	248 831.94	128.51	92.45
04/04/2006	783.93	0.40	249 615.88	128.92	92.74
05/04/2006	783.93	0.40	250 399.81	129.32	93.03
06/04/2006	783.93	0.40	251 183.74	129.73	93.33
07/04/2006	783.93	0.40	251 967.67	130.13	93.62
08/04/2006	783.93	0.40	252 751.61	130.54	93.91
09/04/2006	783.93	0.40	253 535.54	130.94	94.20
10/04/2006	728.13	0.38	254 263.67	131.32	94.47

Istituto Autonomo Case Popolari

Provincia di Brindisi

RELAZIONE CRONOPROGRAMMA

OGGETTO: Lavori di recupero del patrimonio edilizio IACP nel Comune di Brindisi. - Lotti 5° all'11° Legge 640 e lotto 4° via Marsica.

COMMITTENTE: IACP Brindisi

Brindisi, 09/12/2004

Il Tecnico
(geom. Rocco CAFORIO)

Istituto Autonomo Case Popolari

Provincia di Brindisi

OGGETTO: Lavori di recupero del patrimonio edilizio IACP nel Comune di Brindisi. -
Lotti 5° all'11° Legge 640 e lotto 4° via Marsica.

COMMITTENTE: IACP Brindisi

RELAZIONE

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera h) dell'articolo 35 del D.P.R. 554/99 quale documento del progetto esecutivo da allegare al contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 110 dello stesso D.P.R. 554/99, è stato redatto ai sensi dell'art.42 del ripetuto D.P.R. 554/99.

Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati è risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari **364** giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attività, definita con riferimento ad una produttività di progetto ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonché della chiusura dei cantieri per festività.

Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni: Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

Tabella Climatico Ambientale:

condizione	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	media
Favorevole	90	90	90	90	90	90	90	45	90	90	90	45	82.5
Normale	15	15	75	90	90	90	90	45	90	90	75	15	65
Sfavorevole	15	15	45	90	90	90	90	45	90	75	45	15	58.75

Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sarà l'effettiva data d'inizio dei lavori, si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come percentuale media di riduzione sulle attività lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento temporale analogo di ogni attività, indipendentemente dalla successione temporale.

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si è a conoscenza della data d'inizio dei lavori, l'impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, che nell'arco dell'anno avrà diversi tipi di incidenza sulla produttività che potranno essere di diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto.

Produzione mensile

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che l'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione mensile media tale da poter realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di euro 22'490.66 euro 11.62 ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro 30'969.45 euro 15.99.

L'impresa che dovrà eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovrà stilare prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato cronoprogramma.

Brindisi, 09/12/2004

Il Tecnico
(geom. Rocco CAFORIO)

DESCRIZIONE	VALORE
Tipologia Documento Comune Provincia Oggetto Committente Tecnico Impresa Luogo Data Importo per l'emissione dei SAL	Cronoprogramma Istituto Autonomo Case Popolari Provincia di Brindisi Lavori di recupero del patrimonio edilizio IACP nel Comune di Brindisi. - Lotti 5° all'11° Legge 640 e lotto 4° via Marsica. IACP Brindisi geom. Rocco CAFORIO Brindisi 09/12/2004 30'000.00


COMMITTENTE: IACP Brindisi



DESCRIZIONE

Mesi

Media

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

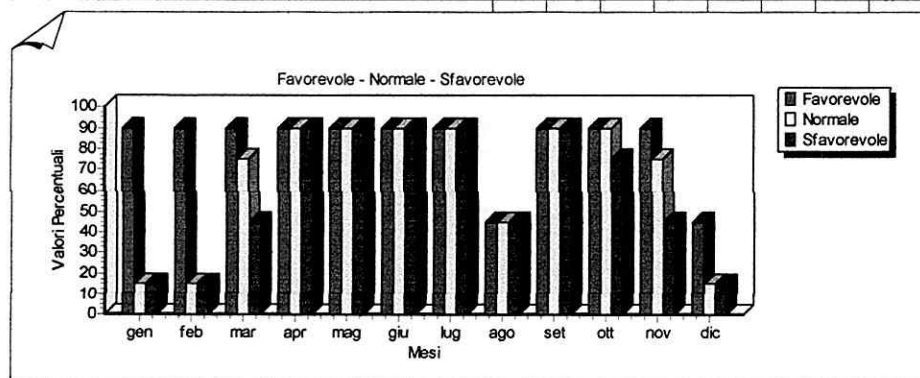

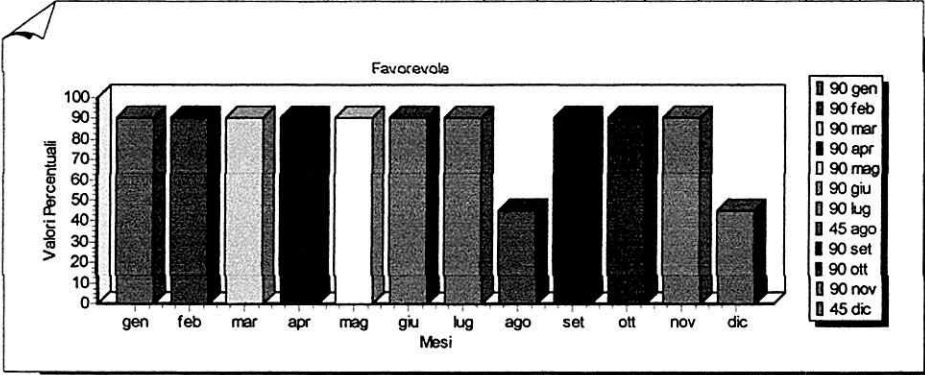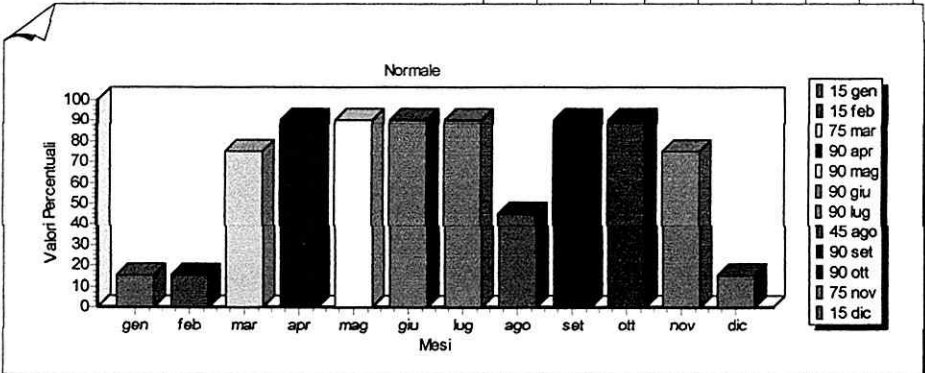DESCRIZIONE	Mesi												Media
	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
TABELLE CLIMATICO AMBIENTALI													
Favorevole	90	90	90	90	90	90	90	45	90	90	90	45	82.50
													
Normale	15	15	75	90	90	90	90	45	90	90	75	15	65.00
													
Sfavorevole	15	15	45	90	90	90	90	45	90	75	45	15	58.75
