

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

**FINANZIAMENTO:
DELIBERA GIUNTA REGIONALE
N. 1480 DEL 03.01.2006**

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO
ALLOGGI DI E.R.P. IN BRINDISI
RIONE S. ELIA - CANTIERE EX GESCAL 2813
PIAZZA MANTEGNA - PIAZZA SPADINI - VIA SPADINI**

progetto esecutivo

PROGETTISTA :
GEOM. Maurizio SPAGNOLO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO :
DOTT. ARCH. Vito Gianluca TUCCI

**COORDINATORE SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE:**
GEOM. Rocco CAFORIO

COLLABORAZIONE TECNICA:
GEOM. Antonio NAPOLITANO

GEOM. Vincenzo TONDO

DATA : SETTEMBRE 2007

SCALA :

ARCHIVIO :

TAV. H

CRONOPROGRAMMA

Istituto Autonomo Case Popolari

Provincia di Brindisi

CRONOPROGRAMMA

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento alloggi ERP in Brindisi - Rione S. Elia - Cantiere ex GESCAL 2813 - Piazza Mantegna, Piazza Spadini, via Spadini.

COMMITTENTE: I.A.C.P. Brindisi


Brindisi, 13/12/2007

Il Tecnico
(geom. Rocco CAFORIO)


ID	Nome attività	Durata	Importo	marzo 2008													
				03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
1	allestimento cantiere Palazzina A-B via Spadini civ. 1 sc. A e civ. 3 sc. B	7 g	0.00														
2	montaggio impalcatura	21 g	26 513.96														
3	Smontaggio tubazioni e bonifica cemento amianto	7 g	2 517.44														
4	demolizione intonaco	14 g	5 077.48														
5	Malta di ripristino c.a. ammaoltrato	14 g	42 919.63														
6	intonaco liscio esterno	14 g	18 185.30														
7	idrolavaggio facciate	14 g	11 334.16														
8	rasatura generale	21 g	20 196.20														
9	rivestimento facciate	35 g	47 284.56														
10	pitturazioni sottobalconi e comicioni	7 g	1 604.96														
11	revisione e tinteggiatura manufatti metallici	7 g	3 136.44														
12	Montaggio di nuovi pluviali e coprigiunti	7 g	3 922.00														
13	vernice bituminosa	7 g	1 295.64														
14	smontaggio impalcatura	7 g	0.00														
15	allestimento cantiere Palazzina C-D Piazza Spadini civ. 1 sc. C e civ. 2 s	7 g	0.00														
16	montaggio impalcatura	14 g	19 010.40														
17	Smontaggio tubazioni e bonifica cemento amianto	7 g	2 130.56														
18	demolizione intonaco	14 g	4 378.54														
19	malta per ripristino c.a. ammalorato	14 g	36 450.73														
20	intonaco liscio esterno	14 g	14 950.40														
21	idrolavaggio facciate	14 g	8 803.01														
22	rasatura generale facciate	14 g	15 946.00														
23	rivestimento facciate	14 g	37 091.28														
24	pitturazione di sottobalconi e cornicioni	7 g	1 219.96														
25	revisione e pitturazione di manufatti metallici	7 g	2 429.60														
26	montaggio di nuovi pluviali e coprigiunto	7 g	3 519.10														
27	verniciatura bituminosa	7 g	1 295.64														
28	smontaggio di impalcatura	7 g	0.00														
29	allestimento cantiere palazzina E-F-G Piazza mantegna civ, 5, 4 e 3	7 g	0.00														
30	montaggio di impalcatura	28 g	24 972.21														
31	smontaggio e bonifica di cemento amianto	7 g	3 195.84														
32	demolizione di intonaco	21 g	5 000.58														
33	malta di ripristino strutture in c.a. ammalorate	21 g	43 173.93														
34	intonaco liscio esterno	21 g	12 412.02														

ID	Nome attività	Durata	Importo	marzo 2008													
				03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
35	idrolavaggio facciate	21 g	11 878.23														
36	rasatura generale facciata	35 g	20 203.40														
37	rivestimento facciate	35 g	47 193.48														
38	pitturazione di sottobalconi e cornicioni	7 g	1 709.12														
39	revisione e tinteggiatura manufatti metallici	7 g	3 153.20														
40	montaggio di nuovi pluviali e coprigiunti	7 g	7 014.00														
41	vernice bituminosa	7 g	1 943.46														
42	smontaggio di impalcatura	7 g	0.00														
43	allestimento cantiere Palazzina H e I Piazza mantegna civ. 1 e 2	7 g	0.00														
44	montaggio di impalcatura	21 g	26 513.96														
45	Smontaggio e bonifica di cemento amianto	7 g	2 517.44														
46	demolizione di intonaco	14 g	5 341.58														
47	malta per ripristino di strutture ammalorate in c.a.	14 g	44 537.29														
48	intonaco liscio esterno	14 g	13 505.73														
49	idrolavaggio facciate	14 g	11 474.46														
50	Rasatura generale facciate	21 g	20 434.80														
51	rivestimento facciate esterne	35 g	47 714.04														
52	Pitturazione di sottobalconi e cornicioni	7 g	1 604.96														
53	revisione e tinteggiatura di manufatti in ferro	7 g	3 034.52														
54	montaggio di pluviali e coprigiunti	7 g	5 963.12														
55	spalmatura di vernice bituminosa	8 g	1 295.64														
56	smontaggio di impalcatura e smobilizzo cantiere	8 g	0.00														
			800 000														
			750 000														
			700 000														
			650 000														
			600 000														
			550 000														
			500 000														
			450 000														
			400 000														
			350 000														
			300 000														
			250 000														
			200 000														
			150 000														
			100 000														
			50 000														
			0														


marzo 2008																															aprile 2008																															maggio 2008																														
1	7	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10																																					

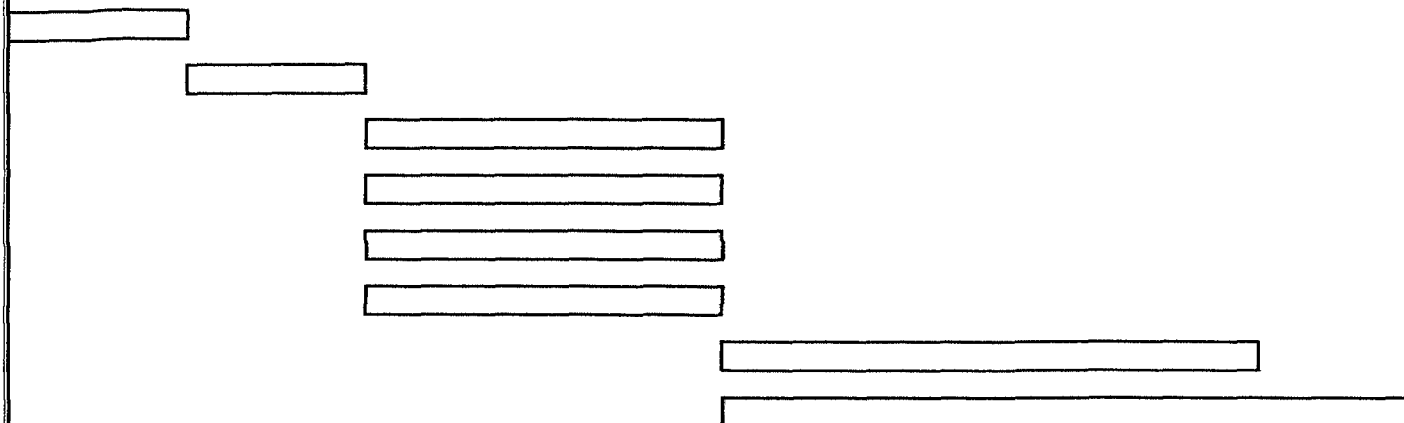

marzo 2008										aprile 2008										maggio 2008																																		
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10

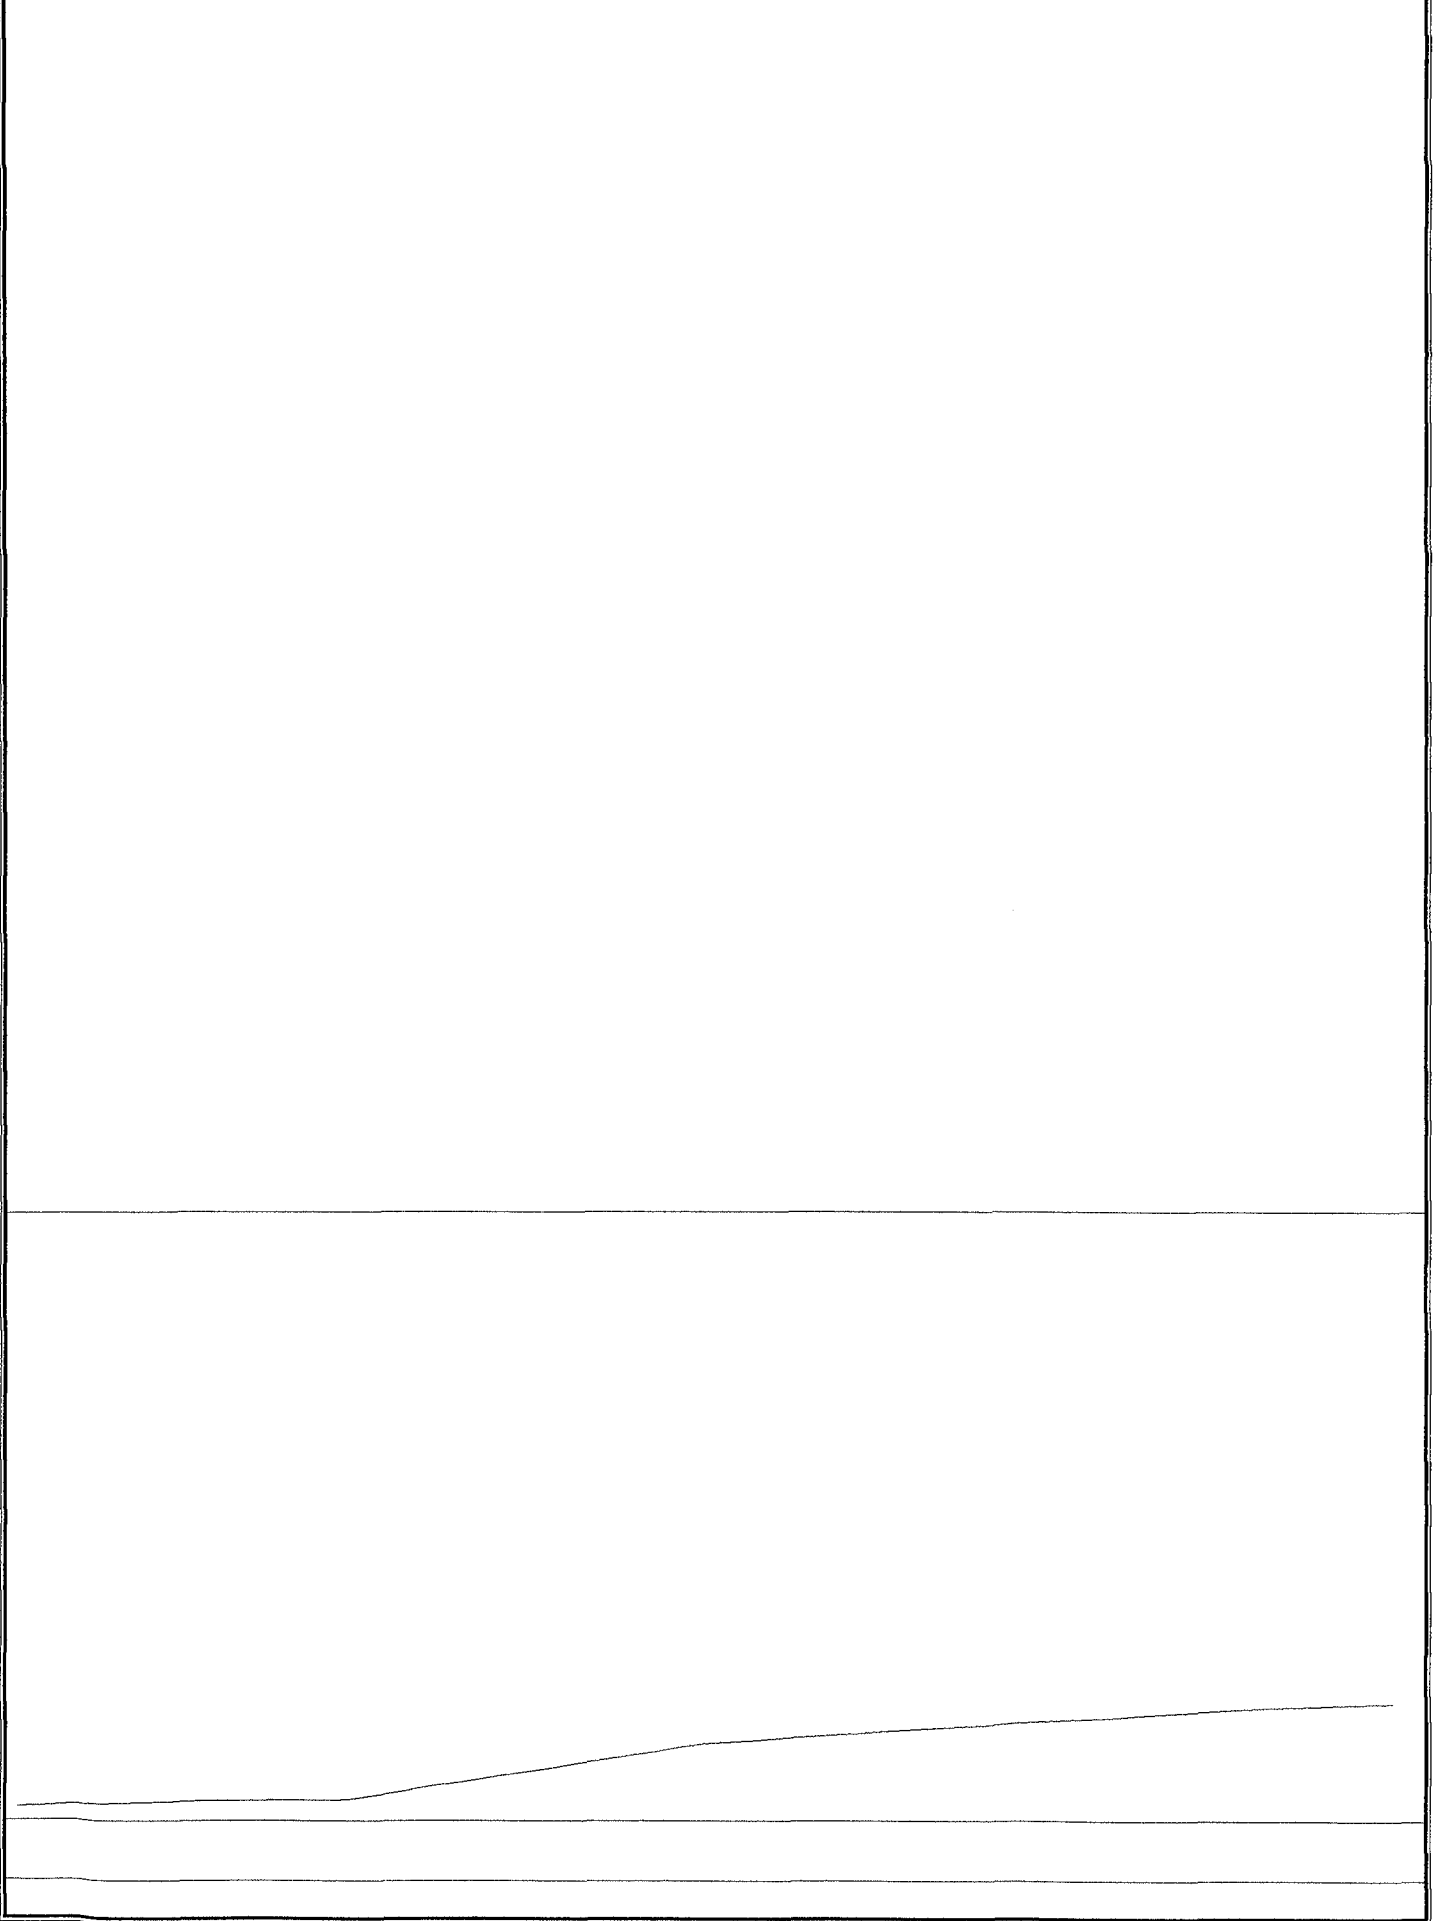


maggio 2008										giugno 2008										luglio 2008																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4

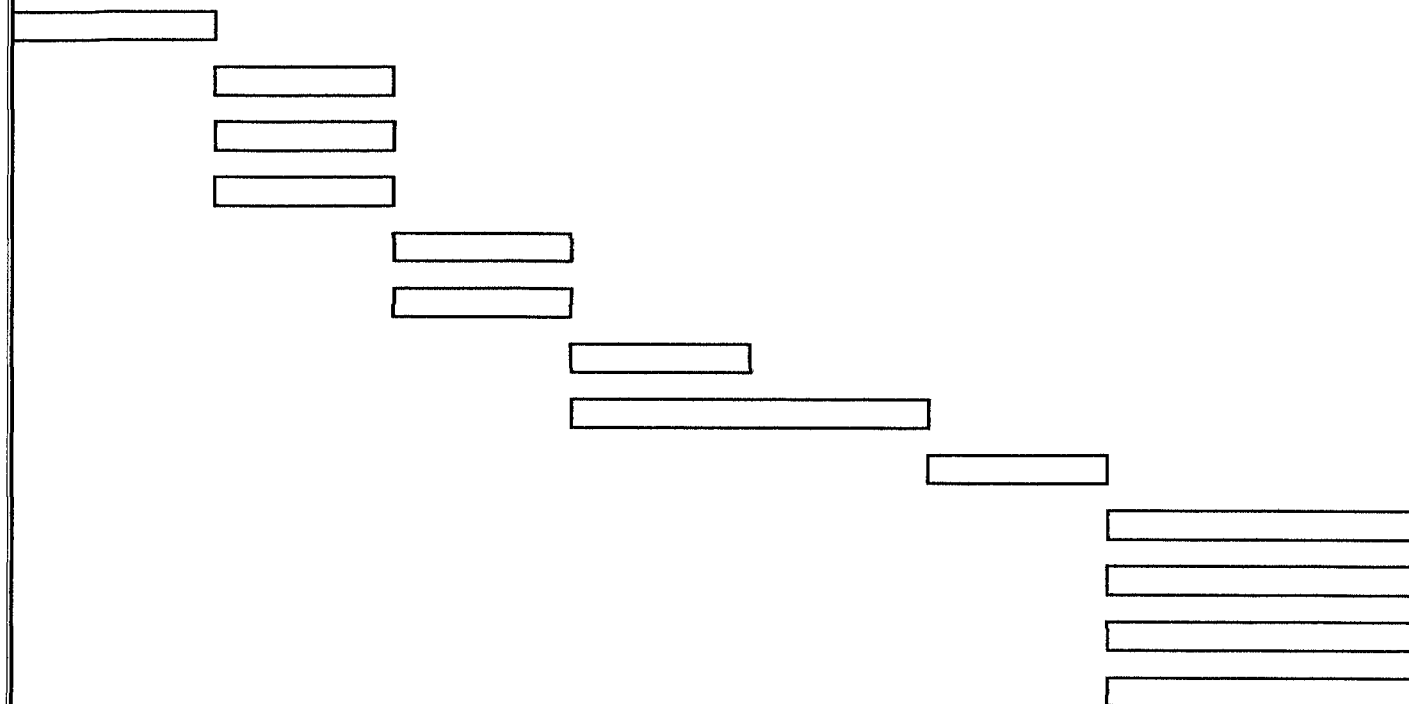


COMMITTENTE: I.A.C.P. Brindisi

luglio 2008																															agosto 2008																											
05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				

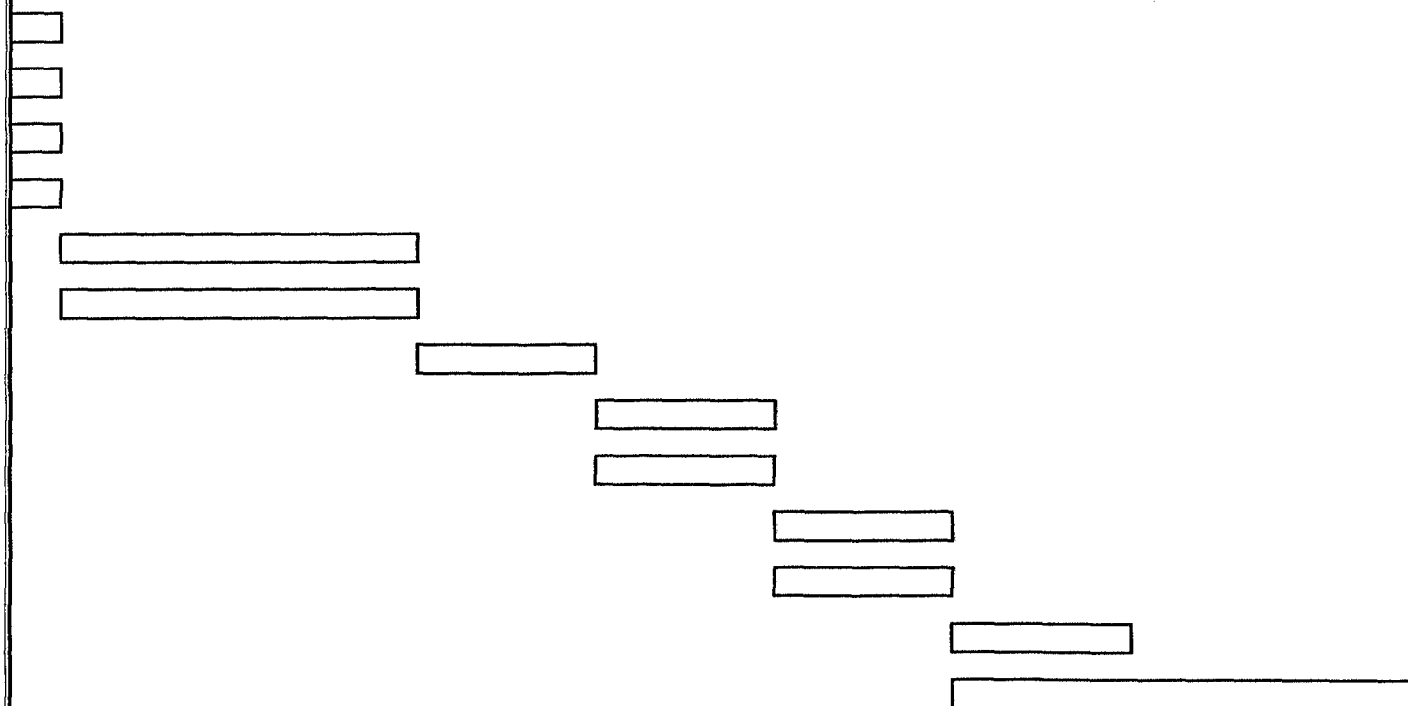


luglio 2008															agosto 2008																																							
05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

agosto 2008																								ottobre 2008																														
29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

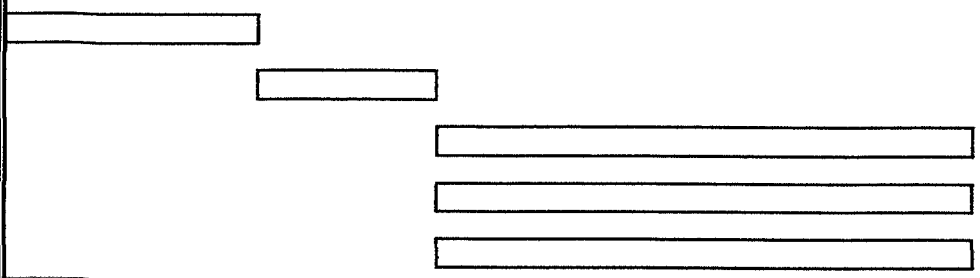


agosto 2008																								ottobre 2008																														
29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22



[illegible]

dicembre 2008										gennaio 2009										febbraio 2009																																		
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09

dicembre 2008												gennaio 2009												febbraio 2009																														
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09

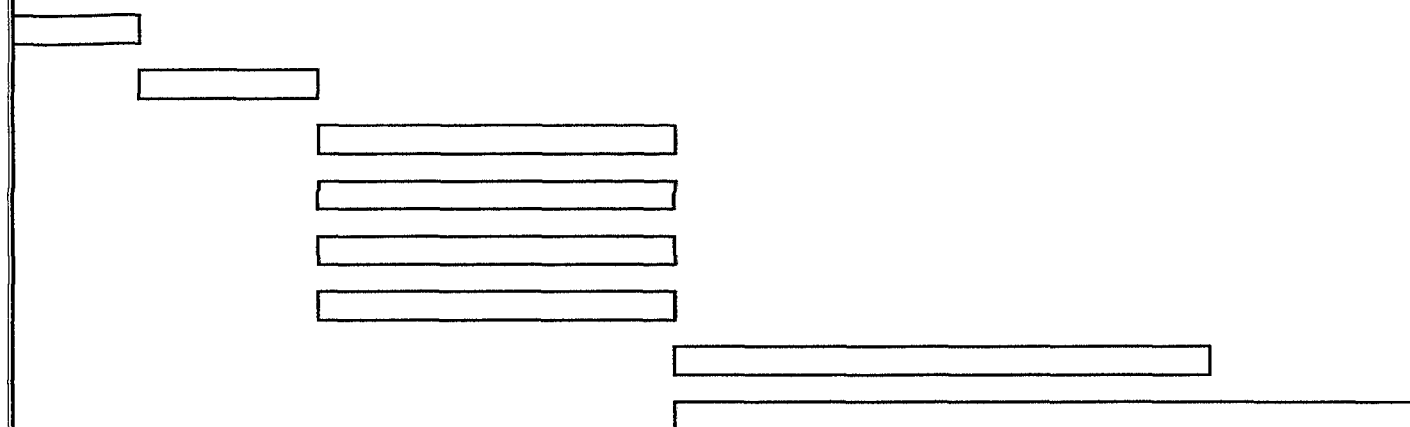

[illegible]

Istituto Autonomo Case Popolari

Provincia di Brindisi

Tabella Attività

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento alloggi ERP in Brindisi - Rione S. Elia - Cantiere ex GESCAL 2813 - Piazza Mantegna, Piazza Spadini, via Spadini.

COMMITTENTE: I.A.C.P. Brindisi

Brindisi, 13/12/2007

Il Tecnico
(geom. Rocco CAFORIO)

ATTIVITA'	PREVISTO			Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	euro	(%)			Lav.	Tot.
allestimento cantiere Palazzina A-B via Spadini civ. 1 sc. A e civ. 3 sc. B	0.00	0.00	0.00	03/03/2008	09/03/2008	7	7
montaggio impalcatura	26 513.96	13.69	3.80	03/03/2008	23/03/2008	21	21
Smontaggio tubazioni e bonifica cemento amianto	2 517.44	1.30	0.36	24/03/2008	30/03/2008	7	7
demolizione intonaco	5 077.48	2.62	0.73	31/03/2008	13/04/2008	14	14
Malta di ripristino c.a. ammalorato	42 919.63	22.17	6.16	31/03/2008	13/04/2008	14	14
intonaco liscio esterno	18 185.30	9.39	2.61	31/03/2008	13/04/2008	14	14
idrolavaggio facciate	11 334.16	5.85	1.63	31/03/2008	13/04/2008	14	14
rasatura generale	20 196.20	10.43	2.90	14/04/2008	04/05/2008	21	21
rivestimento facciate	47 284.56	24.42	6.78	14/04/2008	18/05/2008	35	35
pitturazioni sottobalconi e cornicioni	1 604.96	0.83	0.23	19/05/2008	25/05/2008	7	7
revisione e tinteggiatura manufatti metallici	3 136.44	1.62	0.45	19/05/2008	25/05/2008	7	7
Montaggio di nuovi pluviali e coprigiunti	3 922.00	2.03	0.56	19/05/2008	25/05/2008	7	7
vernice bituminosa	1 295.64	0.67	0.19	26/05/2008	01/06/2008	7	7
smontaggio impalcatura	0.00	0.00	0.00	26/05/2008	01/06/2008	7	7
allestimento cantiere Palazzina C-D Piazza Spadini civ. 1 sc. C e civ. 2 sc. D	0.00	0.00	0.00	02/06/2008	08/06/2008	7	7
montaggio impalcatura	19 010.40	9.82	2.73	02/06/2008	15/06/2008	14	14
Smontaggio tubazioni e bonifica cemento amianto	2 130.56	1.10	0.31	16/06/2008	22/06/2008	7	7
demolizione intonaco	4 378.54	2.26	0.63	23/06/2008	06/07/2008	14	14
malta per ripristino c.a. ammalorato	36 450.73	18.83	5.23	23/06/2008	06/07/2008	14	14
intonaco liscio esterno	14 950.40	7.72	2.14	23/06/2008	06/07/2008	14	14
idrolavaggio facciate	8 803.01	4.55	1.26	23/06/2008	06/07/2008	14	14
rasatura generale facciate	15 946.00	8.24	2.29	07/07/2008	20/07/2008	14	14
rivestimento facciate	37 091.28	19.16	5.32	07/07/2008	20/07/2008	14	14
pitturazione di sottobalconi e cornicioni	1 219.96	0.63	0.18	21/07/2008	27/07/2008	7	7
revisione e pitturazione di manufatti metallici	2 429.60	1.25	0.35	28/07/2008	03/08/2008	7	7
montaggio di nuovi pluviali e coprigiunto	3 519.10	1.82	0.50	28/07/2008	03/08/2008	7	7
verniciatura bituminosa	1 295.64	0.67	0.19	04/08/2008	10/08/2008	7	7
smontaggio di impalcatura	0.00	0.00	0.00	04/08/2008	10/08/2008	7	7
allestimento cantiere palazzina E-F-G Piazza mantegna civ, 5, 4 e 3	0.00	0.00	0.00	11/08/2008	17/08/2008	7	7
montaggio di impalcatura	24 972.21	12.90	3.58	11/08/2008	07/09/2008	28	28
smontaggio e bonifica di cemento amianto	3 195.84	1.65	0.46	08/09/2008	14/09/2008	7	7
demolizione di intonaco	5 000.58	2.58	0.72	15/09/2008	05/10/2008	21	21

COMMITTENTE: I.A.C.P. Brindisi
TABELLA DELLE ATTIVITA'

ATTIVITA'	PREVISTO			Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	euro	(%)			Lav.	Tot.
malta di ripristino strutture in c.a. ammalorate	43 173.93	22.30	6.19	15/09/2008	05/10/2008	21	21
intonaco liscio esterno	12 412.02	6.41	1.78	15/09/2008	05/10/2008	21	21
idrolavaggio facciate	11 878.23	6.13	1.70	15/09/2008	05/10/2008	21	21
rasatura generale facciata	20 203.40	10.43	2.90	06/10/2008	09/11/2008	35	35
rivestimento facciate	47 193.48	24.37	6.77	06/10/2008	09/11/2008	35	35
pitturazione di sottobalconi e cornicioni	1 709.12	0.88	0.25	10/11/2008	16/11/2008	7	7
revisione e tinteggiatura manufatti metallici	3 153.20	1.63	0.45	17/11/2008	23/11/2008	7	7
montaggio di nuovi pluviali e coprigiunti	7 014.00	3.62	1.01	17/11/2008	23/11/2008	7	7
vernice bituminosa	1 943.46	1.00	0.28	24/11/2008	30/11/2008	7	7
smontaggio di impalcatura	0.00	0.00	0.00	24/11/2008	30/11/2008	7	7
allestimento cantiere Palazzina H e I Piazza mantegna civ. 1 e 2	0.00	0.00	0.00	01/12/2008	07/12/2008	7	7
montaggio di impalcatura	26 513.96	13.69	3.80	01/12/2008	21/12/2008	21	21
Smontaggio e bonifica di cemento amianto	2 517.44	1.30	0.36	22/12/2008	28/12/2008	7	7
demolizione di intonaco	5 341.58	2.76	0.77	29/12/2008	11/01/2009	14	14
malta per ripristino di strutture ammalorate in c.a.	44 537.29	23.00	6.39	29/12/2008	11/01/2009	14	14
intonaco liscio esterno	13 505.73	6.98	1.94	29/12/2008	11/01/2009	14	14
idrolavaggio facciate	11 474.46	5.93	1.65	29/12/2008	11/01/2009	14	14
Rasatura generale facciate	20 434.80	10.55	2.93	12/01/2009	01/02/2009	21	21
rivestimento facciate esterne	47 714.04	24.64	6.85	12/01/2009	15/02/2009	35	35
Pitturazione di sottobalconi e cornicioni	1 604.96	0.83	0.23	16/02/2009	22/02/2009	7	7
revisione e tinteggiatura di manufatti in ferro	3 034.52	1.57	0.44	16/02/2009	22/02/2009	7	7
montaggio di pluviali e coprigiunti	5 963.12	3.08	0.86	16/02/2009	22/02/2009	7	7
spalmatura di vernice bituminosa	1 295.64	0.67	0.19	23/02/2009	02/03/2009	8	8
smontaggio di impalcatura e smobilizzo cantiere	0.00	0.00	0.00	23/02/2009	02/03/2009	8	8
Brindisi, 13/12/2007							
il Tecnico geom. Rocco CAFORIO							

Istituto Autonomo Case Popolari

Provincia di Brindisi

Tabella Date e Importi

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento alloggi ERP in
Brindisi - Rione S. Elia - Cantiere ex GESCAL 2813 - Piazza
Mantegna, Piazza Spadini, via Spadini.

COMMITTENTE: I.A.C.P. Brindisi

Brindisi, 13/12/2007

Il Tecnico
(geom. Rocco CAFORIO)

DATA	IMPORTI PREVISTI				
	Parziale euro	Parziale euro	Progressivo euro	Progressivo euro	(%)
03/03/2008	1 262.57	0.65	1 262.57	0.65	0.18
04/03/2008	1 262.57	0.65	2 525.14	1.30	0.36
05/03/2008	1 262.57	0.65	3 787.71	1.96	0.54
06/03/2008	1 262.57	0.65	5 050.28	2.61	0.72
07/03/2008	1 262.57	0.65	6 312.85	3.26	0.91
08/03/2008	1 262.57	0.65	7 575.42	3.91	1.09
09/03/2008	1 262.57	0.65	8 837.99	4.56	1.27
10/03/2008	1 262.57	0.65	10 100.56	5.22	1.45
11/03/2008	1 262.57	0.65	11 363.13	5.87	1.63
12/03/2008	1 262.57	0.65	12 625.70	6.52	1.81
13/03/2008	1 262.57	0.65	13 888.26	7.17	1.99
14/03/2008	1 262.57	0.65	15 150.83	7.82	2.17
15/03/2008	1 262.57	0.65	16 413.40	8.48	2.35
16/03/2008	1 262.57	0.65	17 675.97	9.13	2.54
17/03/2008	1 262.57	0.65	18 938.54	9.78	2.72
18/03/2008	1 262.57	0.65	20 201.11	10.43	2.90
19/03/2008	1 262.57	0.65	21 463.68	11.09	3.08
20/03/2008	1 262.57	0.65	22 726.25	11.74	3.26
21/03/2008	1 262.57	0.65	23 988.82	12.39	3.44
22/03/2008	1 262.57	0.65	25 251.39	13.04	3.62
23/03/2008	1 262.57	0.65	26 513.96	13.69	3.80
24/03/2008	359.63	0.19	26 873.59	13.88	3.86
25/03/2008	359.63	0.19	27 233.23	14.06	3.91
26/03/2008	359.63	0.19	27 592.86	14.25	3.96
27/03/2008	359.63	0.19	27 952.50	14.44	4.01
28/03/2008	359.63	0.19	28 312.13	14.62	4.06
29/03/2008	359.63	0.19	28 671.77	14.81	4.11
30/03/2008	359.63	0.19	29 031.40	14.99	4.17
31/03/2008	5 536.90	2.86	34 568.30	17.85	4.96
01/04/2008	5 536.90	2.86	40 105.20	20.71	5.75
02/04/2008	5 536.90	2.86	45 642.09	23.57	6.55
03/04/2008	5 536.90	2.86	51 178.99	26.43	7.34
04/04/2008	5 536.90	2.86	56 715.89	29.29	8.14
05/04/2008	5 536.90	2.86	62 252.79	32.15	8.93
06/04/2008	5 536.90	2.86	67 789.69	35.01	9.73
07/04/2008	5 536.90	2.86	73 326.58	37.87	10.52
08/04/2008	5 536.90	2.86	78 863.48	40.73	11.31
09/04/2008	5 536.90	2.86	84 400.38	43.59	12.11
10/04/2008	5 536.90	2.86	89 937.28	46.45	12.90
11/04/2008	5 536.90	2.86	95 474.17	49.31	13.70
12/04/2008	5 536.90	2.86	101 011.07	52.17	14.49
13/04/2008	5 536.90	2.86	106 547.97	55.03	15.29
14/04/2008	2 312.71	1.19	108 860.68	56.22	15.62
15/04/2008	2 312.71	1.19	111 173.39	57.42	15.95
16/04/2008	2 312.71	1.19	113 486.10	58.61	16.28
17/04/2008	2 312.71	1.19	115 798.81	59.81	16.61
18/04/2008	2 312.71	1.19	118 111.53	61.00	16.95
19/04/2008	2 312.71	1.19	120 424.24	62.19	17.28
20/04/2008	2 312.71	1.19	122 736.95	63.39	17.61
21/04/2008	2 312.71	1.19	125 049.66	64.58	17.94
22/04/2008	2 312.71	1.19	127 362.37	65.78	18.27
23/04/2008	2 312.71	1.19	129 675.08	66.97	18.60
24/04/2008	2 312.71	1.19	131 987.79	68.17	18.94
25/04/2008	2 312.71	1.19	134 300.50	69.36	19.27
26/04/2008	2 312.71	1.19	136 613.22	70.55	19.60
27/04/2008	2 312.71	1.19	138 925.93	71.75	19.93
28/04/2008	2 312.71	1.19	141 238.64	72.94	20.26
29/04/2008	2 312.71	1.19	143 551.35	74.14	20.60
30/04/2008	2 312.71	1.19	145 864.06	75.33	20.93
01/05/2008	2 312.71	1.19	148 176.77	76.53	21.26
02/05/2008	2 312.71	1.19	150 489.48	77.72	21.59
03/05/2008	2 312.71	1.19	152 802.19	78.92	21.92
04/05/2008	2 312.71	1.19	155 114.91	80.11	22.25
05/05/2008	1 350.99	0.70	156 465.89	80.81	22.45
06/05/2008	1 350.99	0.70	157 816.88	81.51	22.64

COMMITTENTE: I.A.C.P. Brindisi

TABELLA DATE ED IMPORTI

DATA	IMPORTI PREVISTI				
	Parziale euro	Parziale euro	Progressivo euro	Progressivo euro	(%)
07/05/2008	1 350.99	0.70	159 167.87	82.20	22.84
08/05/2008	1 350.99	0.70	160 518.86	82.90	23.03
09/05/2008	1 350.99	0.70	161 869.84	83.60	23.22
10/05/2008	1 350.99	0.70	163 220.83	84.30	23.42
11/05/2008	1 350.99	0.70	164 571.82	84.99	23.61
12/05/2008	1 350.99	0.70	165 922.81	85.69	23.81
13/05/2008	1 350.99	0.70	167 273.79	86.39	24.00
14/05/2008	1 350.99	0.70	168 624.78	87.09	24.19
15/05/2008	1 350.99	0.70	169 975.77	87.79	24.39
16/05/2008	1 350.99	0.70	171 326.76	88.48	24.58
17/05/2008	1 350.99	0.70	172 677.74	89.18	24.77
18/05/2008	1 350.99	0.70	174 028.73	89.88	24.97
19/05/2008	1 237.63	0.64	175 266.36	90.52	25.15
20/05/2008	1 237.63	0.64	176 503.99	91.16	25.32
21/05/2008	1 237.63	0.64	177 741.62	91.80	25.50
22/05/2008	1 237.63	0.64	178 979.24	92.44	25.68
23/05/2008	1 237.63	0.64	180 216.87	93.07	25.86
24/05/2008	1 237.63	0.64	181 454.50	93.71	26.03
25/05/2008	1 237.63	0.64	182 692.13	94.35	26.21
26/05/2008	185.09	0.10	182 877.22	94.45	26.24
27/05/2008	185.09	0.10	183 062.31	94.54	26.26
28/05/2008	185.09	0.10	183 247.40	94.64	26.29
29/05/2008	185.09	0.10	183 432.50	94.73	26.32
30/05/2008	185.09	0.10	183 617.59	94.83	26.34
31/05/2008	185.09	0.10	183 802.68	94.93	26.37
01/06/2008	185.09	0.10	183 987.77	95.02	26.40
02/06/2008	1 357.89	0.70	185 345.66	95.72	26.59
03/06/2008	1 357.89	0.70	186 703.54	96.42	26.79
04/06/2008	1 357.89	0.70	188 061.43	97.13	26.98
05/06/2008	1 357.89	0.70	189 419.31	97.83	27.18
06/06/2008	1 357.89	0.70	190 777.20	98.53	27.37
07/06/2008	1 357.89	0.70	192 135.08	99.23	27.57
08/06/2008	1 357.89	0.70	193 492.97	99.93	27.76
09/06/2008	1 357.89	0.70	194 850.86	100.63	27.96
10/06/2008	1 357.89	0.70	196 208.74	101.33	28.15
11/06/2008	1 357.89	0.70	197 566.63	102.03	28.35
12/06/2008	1 357.89	0.70	198 924.51	102.74	28.54
13/06/2008	1 357.89	0.70	200 282.40	103.44	28.73
14/06/2008	1 357.89	0.70	201 640.28	104.14	28.93
15/06/2008	1 357.89	0.70	202 998.17	104.84	29.12
16/06/2008	304.37	0.16	203 302.54	105.00	29.17
17/06/2008	304.37	0.16	203 606.90	105.15	29.21
18/06/2008	304.37	0.16	203 911.27	105.31	29.26
19/06/2008	304.37	0.16	204 215.63	105.47	29.30
20/06/2008	304.37	0.16	204 520.00	105.63	29.34
21/06/2008	304.37	0.16	204 824.36	105.78	29.39
22/06/2008	304.37	0.16	205 128.73	105.94	29.43
23/06/2008	4 613.05	2.38	209 741.78	108.32	30.09
24/06/2008	4 613.05	2.38	214 354.83	110.71	30.75
25/06/2008	4 613.05	2.38	218 967.88	113.09	31.42
26/06/2008	4 613.05	2.38	223 580.92	115.47	32.08
27/06/2008	4 613.05	2.38	228 193.97	117.85	32.74
28/06/2008	4 613.05	2.38	232 807.02	120.23	33.40
29/06/2008	4 613.05	2.38	237 420.07	122.62	34.06
30/06/2008	4 613.05	2.38	242 033.12	125.00	34.72
01/07/2008	4 613.05	2.38	246 646.17	127.38	35.39
02/07/2008	4 613.05	2.38	251 259.22	129.76	36.05
03/07/2008	4 613.05	2.38	255 872.26	132.15	36.71
04/07/2008	4 613.05	2.38	260 485.31	134.53	37.37
05/07/2008	4 613.05	2.38	265 098.36	136.91	38.03
06/07/2008	4 613.05	2.38	269 711.41	139.29	38.70
07/07/2008	3 788.38	1.96	273 499.79	141.25	39.24
08/07/2008	3 788.38	1.96	277 288.16	143.21	39.78
09/07/2008	3 788.38	1.96	281 076.54	145.16	40.33
10/07/2008	3 788.38	1.96	284 864.92	147.12	40.87

COMMITTENTE: I.A.C.P. Brindisi
TABELLA DATE ED IMPORTI

DATA	IMPORTI PREVISTI				
	Parziale euro	Parziale euro	Progressivo euro	Progressivo euro	(%)
11/07/2008	3 788.38	1.96	288 653.30	149.08	41.41
12/07/2008	3 788.38	1.96	292 441.67	151.03	41.96
13/07/2008	3 788.38	1.96	296 230.05	152.99	42.50
14/07/2008	3 788.38	1.96	300 018.43	154.95	43.04
15/07/2008	3 788.38	1.96	303 806.80	156.90	43.59
16/07/2008	3 788.38	1.96	307 595.18	158.86	44.13
17/07/2008	3 788.38	1.96	311 383.56	160.82	44.67
18/07/2008	3 788.38	1.96	315 171.94	162.77	45.22
19/07/2008	3 788.38	1.96	318 960.31	164.73	45.76
20/07/2008	3 788.38	1.96	322 748.69	166.69	46.31
21/07/2008	174.28	0.09	322 922.97	166.78	46.33
22/07/2008	174.28	0.09	323 097.25	166.87	46.36
23/07/2008	174.28	0.09	323 271.53	166.96	46.38
24/07/2008	174.28	0.09	323 445.81	167.05	46.41
25/07/2008	174.28	0.09	323 620.09	167.14	46.43
26/07/2008	174.28	0.09	323 794.37	167.23	46.46
27/07/2008	174.28	0.09	323 968.65	167.32	46.48
28/07/2008	849.81	0.44	324 818.46	167.75	46.60
29/07/2008	849.81	0.44	325 668.28	168.19	46.72
30/07/2008	849.81	0.44	326 518.09	168.63	46.85
31/07/2008	849.81	0.44	327 367.91	169.07	46.97
01/08/2008	849.81	0.44	328 217.72	169.51	47.09
02/08/2008	849.81	0.44	329 067.54	169.95	47.21
03/08/2008	849.81	0.44	329 917.35	170.39	47.33
04/08/2008	185.09	0.10	330 102.44	170.48	47.36
05/08/2008	185.09	0.10	330 287.53	170.58	47.39
06/08/2008	185.09	0.10	330 472.62	170.67	47.41
07/08/2008	185.09	0.10	330 657.72	170.77	47.44
08/08/2008	185.09	0.10	330 842.81	170.87	47.47
09/08/2008	185.09	0.10	331 027.90	170.96	47.49
10/08/2008	185.09	0.10	331 212.99	171.06	47.52
11/08/2008	891.86	0.46	332 104.85	171.52	47.65
12/08/2008	891.86	0.46	332 996.72	171.98	47.78
13/08/2008	891.86	0.46	333 888.58	172.44	47.90
14/08/2008	891.86	0.46	334 780.45	172.90	48.03
15/08/2008	891.86	0.46	335 672.31	173.36	48.16
16/08/2008	891.86	0.46	336 564.18	173.82	48.29
17/08/2008	891.86	0.46	337 456.04	174.28	48.42
18/08/2008	891.86	0.46	338 347.91	174.74	48.54
19/08/2008	891.86	0.46	339 239.77	175.20	48.67
20/08/2008	891.86	0.46	340 131.64	175.66	48.80
21/08/2008	891.86	0.46	341 023.50	176.12	48.93
22/08/2008	891.86	0.46	341 915.37	176.58	49.06
23/08/2008	891.86	0.46	342 807.23	177.05	49.18
24/08/2008	891.86	0.46	343 699.10	177.51	49.31
25/08/2008	891.86	0.46	344 590.96	177.97	49.44
26/08/2008	891.86	0.46	345 482.82	178.43	49.57
27/08/2008	891.86	0.46	346 374.69	178.89	49.70
28/08/2008	891.86	0.46	347 266.55	179.35	49.82
29/08/2008	891.86	0.46	348 158.42	179.81	49.95
30/08/2008	891.86	0.46	349 050.28	180.27	50.08
31/08/2008	891.86	0.46	349 942.15	180.73	50.21
01/09/2008	891.86	0.46	350 834.01	181.19	50.33
02/09/2008	891.86	0.46	351 725.88	181.65	50.46
03/09/2008	891.86	0.46	352 617.74	182.11	50.59
04/09/2008	891.86	0.46	353 509.61	182.57	50.72
05/09/2008	891.86	0.46	354 401.47	183.03	50.85
06/09/2008	891.86	0.46	355 293.34	183.49	50.97
07/09/2008	891.86	0.46	356 185.20	183.95	51.10
08/09/2008	456.55	0.24	356 641.75	184.19	51.17
09/09/2008	456.55	0.24	357 098.30	184.43	51.23
10/09/2008	456.55	0.24	357 554.85	184.66	51.30
11/09/2008	456.55	0.24	358 011.39	184.90	51.36
12/09/2008	456.55	0.24	358 467.94	185.13	51.43
13/09/2008	456.55	0.24	358 924.49	185.37	51.50

COMMITTENTE: I.A.C.P. Brindisi

TABELLA DATE ED IMPORTI

DATA	IMPORTI PREVISTI				
	Parziale euro	Parziale euro	Progressivo euro	Progressivo euro	(%)
14/09/2008	456.55	0.24	359 381.04	185.60	51.56
15/09/2008	3 450.70	1.78	362 831.74	187.39	52.06
16/09/2008	3 450.70	1.78	366 282.45	189.17	52.55
17/09/2008	3 450.70	1.78	369 733.15	190.95	53.05
18/09/2008	3 450.70	1.78	373 183.85	192.73	53.54
19/09/2008	3 450.70	1.78	376 634.55	194.52	54.04
20/09/2008	3 450.70	1.78	380 085.26	196.30	54.53
21/09/2008	3 450.70	1.78	383 535.96	198.08	55.03
22/09/2008	3 450.70	1.78	386 986.66	199.86	55.52
23/09/2008	3 450.70	1.78	390 437.37	201.64	56.02
24/09/2008	3 450.70	1.78	393 888.07	203.43	56.51
25/09/2008	3 450.70	1.78	397 338.77	205.21	57.01
26/09/2008	3 450.70	1.78	400 789.47	206.99	57.50
27/09/2008	3 450.70	1.78	404 240.18	208.77	58.00
28/09/2008	3 450.70	1.78	407 690.88	210.55	58.49
29/09/2008	3 450.70	1.78	411 141.58	212.34	58.99
30/09/2008	3 450.70	1.78	414 592.29	214.12	59.48
01/10/2008	3 450.70	1.78	418 042.99	215.90	59.98
02/10/2008	3 450.70	1.78	421 493.69	217.68	60.47
03/10/2008	3 450.70	1.78	424 944.39	219.47	60.97
04/10/2008	3 450.70	1.78	428 395.10	221.25	61.46
05/10/2008	3 450.70	1.78	431 845.80	223.03	61.96
06/10/2008	1 925.63	0.99	433 771.43	224.02	62.23
07/10/2008	1 925.63	0.99	435 697.05	225.02	62.51
08/10/2008	1 925.63	0.99	437 622.68	226.01	62.79
09/10/2008	1 925.63	0.99	439 548.30	227.01	63.06
10/10/2008	1 925.63	0.99	441 473.93	228.00	63.34
11/10/2008	1 925.63	0.99	443 399.55	229.00	63.62
12/10/2008	1 925.63	0.99	445 325.18	229.99	63.89
13/10/2008	1 925.63	0.99	447 250.80	230.99	64.17
14/10/2008	1 925.63	0.99	449 176.43	231.98	64.44
15/10/2008	1 925.63	0.99	451 102.05	232.97	64.72
16/10/2008	1 925.63	0.99	453 027.68	233.97	65.00
17/10/2008	1 925.63	0.99	454 953.30	234.96	65.27
18/10/2008	1 925.63	0.99	456 878.93	235.96	65.55
19/10/2008	1 925.63	0.99	458 804.55	236.95	65.83
20/10/2008	1 925.63	0.99	460 730.18	237.95	66.10
21/10/2008	1 925.63	0.99	462 655.80	238.94	66.38
22/10/2008	1 925.63	0.99	464 581.43	239.94	66.65
23/10/2008	1 925.63	0.99	466 507.05	240.93	66.93
24/10/2008	1 925.63	0.99	468 432.68	241.93	67.21
25/10/2008	1 925.63	0.99	470 358.30	242.92	67.48
26/10/2008	1 925.63	0.99	472 283.93	243.91	67.76
27/10/2008	1 925.63	0.99	474 209.55	244.91	68.04
28/10/2008	1 925.63	0.99	476 135.18	245.90	68.31
29/10/2008	1 925.63	0.99	478 060.80	246.90	68.59
30/10/2008	1 925.63	0.99	479 986.43	247.89	68.86
31/10/2008	1 925.63	0.99	481 912.05	248.89	69.14
01/11/2008	1 925.63	0.99	483 837.68	249.88	69.42
02/11/2008	1 925.63	0.99	485 763.30	250.88	69.69
03/11/2008	1 925.63	0.99	487 688.93	251.87	69.97
04/11/2008	1 925.63	0.99	489 614.55	252.86	70.25
05/11/2008	1 925.63	0.99	491 540.18	253.86	70.52
06/11/2008	1 925.63	0.99	493 465.80	254.85	70.80
07/11/2008	1 925.63	0.99	495 391.43	255.85	71.07
08/11/2008	1 925.63	0.99	497 317.05	256.84	71.35
09/11/2008	1 925.63	0.99	499 242.68	257.84	71.63
10/11/2008	244.16	0.13	499 486.84	257.96	71.66
11/11/2008	244.16	0.13	499 731.00	258.09	71.70
12/11/2008	244.16	0.13	499 975.16	258.22	71.73
13/11/2008	244.16	0.13	500 219.32	258.34	71.77
14/11/2008	244.16	0.13	500 463.48	258.47	71.80
15/11/2008	244.16	0.13	500 707.64	258.59	71.84
16/11/2008	244.16	0.13	500 951.80	258.72	71.87
17/11/2008	1 452.46	0.75	502 404.26	259.47	72.08

COMMITTENTE: I.A.C.P. Brindisi
TABELLA DATE ED IMPORTI

DATA	IMPORTI PREVISTI				
	Parziale euro	Parziale euro	Progressivo euro	Progressivo euro	(%)
18/11/2008	1 452.46	0.75	503 856.71	260.22	72.29
19/11/2008	1 452.46	0.75	505 309.17	260.97	72.50
20/11/2008	1 452.46	0.75	506 761.63	261.72	72.71
21/11/2008	1 452.46	0.75	508 214.09	262.47	72.91
22/11/2008	1 452.46	0.75	509 666.54	263.22	73.12
23/11/2008	1 452.46	0.75	511 119.00	263.97	73.33
24/11/2008	277.64	0.14	511 396.64	264.11	73.37
25/11/2008	277.64	0.14	511 674.27	264.26	73.41
26/11/2008	277.64	0.14	511 951.91	264.40	73.45
27/11/2008	277.64	0.14	512 229.55	264.54	73.49
28/11/2008	277.64	0.14	512 507.19	264.69	73.53
29/11/2008	277.64	0.14	512 784.82	264.83	73.57
30/11/2008	277.64	0.14	513 062.46	264.97	73.61
01/12/2008	1 262.57	0.65	514 325.03	265.63	73.79
02/12/2008	1 262.57	0.65	515 587.60	266.28	73.97
03/12/2008	1 262.57	0.65	516 850.17	266.93	74.15
04/12/2008	1 262.57	0.65	518 112.74	267.58	74.33
05/12/2008	1 262.57	0.65	519 375.31	268.23	74.52
06/12/2008	1 262.57	0.65	520 637.88	268.89	74.70
07/12/2008	1 262.57	0.65	521 900.45	269.54	74.88
08/12/2008	1 262.57	0.65	523 163.02	270.19	75.06
09/12/2008	1 262.57	0.65	524 425.59	270.84	75.24
10/12/2008	1 262.57	0.65	525 688.16	271.50	75.42
11/12/2008	1 262.57	0.65	526 950.72	272.15	75.60
12/12/2008	1 262.57	0.65	528 213.29	272.80	75.78
13/12/2008	1 262.57	0.65	529 475.86	273.45	75.96
14/12/2008	1 262.57	0.65	530 738.43	274.10	76.15
15/12/2008	1 262.57	0.65	532 001.00	274.76	76.33
16/12/2008	1 262.57	0.65	533 263.57	275.41	76.51
17/12/2008	1 262.57	0.65	534 526.14	276.06	76.69
18/12/2008	1 262.57	0.65	535 788.71	276.71	76.87
19/12/2008	1 262.57	0.65	537 051.28	277.36	77.05
20/12/2008	1 262.57	0.65	538 313.85	278.02	77.23
21/12/2008	1 262.57	0.65	539 576.42	278.67	77.41
22/12/2008	359.63	0.19	539 936.05	278.85	77.47
23/12/2008	359.63	0.19	540 295.69	279.04	77.52
24/12/2008	359.63	0.19	540 655.32	279.23	77.57
25/12/2008	359.63	0.19	541 014.96	279.41	77.62
26/12/2008	359.63	0.19	541 374.59	279.60	77.67
27/12/2008	359.63	0.19	541 734.23	279.78	77.72
28/12/2008	359.63	0.19	542 093.86	279.97	77.78
29/12/2008	5 347.08	2.76	547 440.94	282.73	78.54
30/12/2008	5 347.08	2.76	552 788.01	285.49	79.31
31/12/2008	5 347.08	2.76	558 135.09	288.25	80.08
01/01/2009	5 347.08	2.76	563 482.16	291.01	80.84
02/01/2009	5 347.08	2.76	568 829.24	293.78	81.61
03/01/2009	5 347.08	2.76	574 176.31	296.54	82.38
04/01/2009	5 347.08	2.76	579 523.39	299.30	83.15
05/01/2009	5 347.08	2.76	584 870.47	302.06	83.91
06/01/2009	5 347.08	2.76	590 217.54	304.82	84.68
07/01/2009	5 347.08	2.76	595 564.62	307.58	85.45
08/01/2009	5 347.08	2.76	600 911.69	310.34	86.21
09/01/2009	5 347.08	2.76	606 258.77	313.11	86.98
10/01/2009	5 347.08	2.76	611 605.84	315.87	87.75
11/01/2009	5 347.08	2.76	616 952.92	318.63	88.52
12/01/2009	2 336.34	1.21	619 289.26	319.84	88.85
13/01/2009	2 336.34	1.21	621 625.61	321.04	89.19
14/01/2009	2 336.34	1.21	623 961.95	322.25	89.52
15/01/2009	2 336.34	1.21	626 298.30	323.46	89.86
16/01/2009	2 336.34	1.21	628 634.64	324.66	90.19
17/01/2009	2 336.34	1.21	630 970.98	325.87	90.53
18/01/2009	2 336.34	1.21	633 307.33	327.08	90.86
19/01/2009	2 336.34	1.21	635 643.67	328.28	91.20
20/01/2009	2 336.34	1.21	637 980.02	329.49	91.53
21/01/2009	2 336.34	1.21	640 316.36	330.70	91.87

COMMITTENTE: I.A.C.P. Brindisi

TABELLA DATE ED IMPORTI

DATA	IMPORTI PREVISTI				
	Parziale euro	Parziale euro	Progressivo euro	Progressivo euro	(%)
22/01/2009	2 336.34	1.21	642 652.70	331.90	92.20
23/01/2009	2 336.34	1.21	644 989.05	333.11	92.54
24/01/2009	2 336.34	1.21	647 325.39	334.32	92.87
25/01/2009	2 336.34	1.21	649 661.74	335.52	93.21
26/01/2009	2 336.34	1.21	651 998.08	336.73	93.54
27/01/2009	2 336.34	1.21	654 334.42	337.94	93.88
28/01/2009	2 336.34	1.21	656 670.77	339.14	94.21
29/01/2009	2 336.34	1.21	659 007.11	340.35	94.55
30/01/2009	2 336.34	1.21	661 343.46	341.56	94.88
31/01/2009	2 336.34	1.21	663 679.80	342.76	95.22
01/02/2009	2 336.34	1.21	666 016.14	343.97	95.55
02/02/2009	1 363.26	0.70	667 379.40	344.67	95.75
03/02/2009	1 363.26	0.70	668 742.66	345.38	95.95
04/02/2009	1 363.26	0.70	670 105.92	346.08	96.14
05/02/2009	1 363.26	0.70	671 469.18	346.78	96.34
06/02/2009	1 363.26	0.70	672 832.44	347.49	96.53
07/02/2009	1 363.26	0.70	674 195.69	348.19	96.73
08/02/2009	1 363.26	0.70	675 558.95	348.90	96.92
09/02/2009	1 363.26	0.70	676 922.21	349.60	97.12
10/02/2009	1 363.26	0.70	678 285.47	350.31	97.31
11/02/2009	1 363.26	0.70	679 648.73	351.01	97.51
12/02/2009	1 363.26	0.70	681 011.99	351.71	97.71
13/02/2009	1 363.26	0.70	682 375.24	352.42	97.90
14/02/2009	1 363.26	0.70	683 738.50	353.12	98.10
15/02/2009	1 363.26	0.70	685 101.76	353.83	98.29
16/02/2009	1 514.66	0.78	686 616.42	354.61	98.51
17/02/2009	1 514.66	0.78	688 131.07	355.39	98.73
18/02/2009	1 514.66	0.78	689 645.73	356.17	98.94
19/02/2009	1 514.66	0.78	691 160.39	356.95	99.16
20/02/2009	1 514.66	0.78	692 675.05	357.74	99.38
21/02/2009	1 514.66	0.78	694 189.70	358.52	99.60
22/02/2009	1 514.66	0.78	695 704.36	359.30	99.81
23/02/2009	161.96	0.08	695 866.32	359.38	99.84
24/02/2009	161.96	0.08	696 028.27	359.47	99.86
25/02/2009	161.96	0.08	696 190.22	359.55	99.88
26/02/2009	161.96	0.08	696 352.18	359.64	99.91
27/02/2009	161.96	0.08	696 514.13	359.72	99.93
28/02/2009	161.96	0.08	696 676.09	359.80	99.95
01/03/2009	161.96	0.08	696 838.04	359.89	99.98
02/03/2009	161.96	0.08	697 000.00	359.97	100.00
Brindisi, 13/12/2007					
il Tecnico geom. Rocco CAFORIO					

Istituto Autonomo Case Popolari

Provincia di Brindisi

RELAZIONE CRONOPROGRAMMA

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento alloggi ERP in
Brindisi - Rione S. Elia - Cantiere ex GESCAL 2813 - Piazza
Mantegna, Piazza Spadini, via Spadini.

COMMITTENTE: I.A.C.P. Brindisi

Brindisi, 13/12/2007

Il Tecnico
(geom. Rocco CAFORIO)

Istituto Autonomo Case Popolari Provincia di Brindisi

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento alloggi ERP in Brindisi -
Rione S. Elia - Cantiere ex GESCAL 2813 - Piazza Mantegna, Piazza Spadini,
via Spadini.

COMMITTENTE: I.A.C.P. Brindisi

RELAZIONE CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera h) dell'articolo 35 del D.P.R. 554/99 quale documento del progetto esecutivo da allegare al contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 110 dello stesso D.P.R. 554/99, è stato redatto ai sensi dell'art.42 del ripetuto D.P.R. 554/99.

Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati è risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari **365** giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attività, definita con riferimento ad una produttività di progetto ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonché della chiusura dei cantieri per festività.

Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni: Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

Tabella Climatico Ambientale:

condizione	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	media
Favorevole	90	90	90	90	90	90	90	45	90	90	90	45	82.5
Normale	15	15	75	90	90	90	90	45	90	90	75	15	65
Sfavorevole	15	15	45	90	90	90	90	45	90	75	45	15	58.75

Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sarà l'effettiva data d'inizio dei lavori, si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come percentuale

media di riduzione sulle attività lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento temporale analogo di ogni attività, indipendentemente dalla successione temporale.

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si è a conoscenza della data d'inizio dei lavori, l'impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, che nell'arco dell'anno avrà diversi tipi di incidenza sulla produttività che potranno essere di diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto.

Produzione mensile

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che l'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione mensile media tale da poter realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di euro 58'083.33 euro 30.00 ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro 111'295.76 euro 57.48.

L'impresa che dovrà eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovrà stilare prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato cronoprogramma.

Prezzo Chiuso

L'allegato cronoprogramma dei lavori è redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, l'importo degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna.

Di seguito si riportano gli importi dei lavori da eseguire per anni interi a decorrere dalla consegna dei lavori:

- anno 1 - **Importo** euro 697'000.00 euro 359.97;
- anno 2 - **Importo** euro 0.00 euro 0.00;




Il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso d'inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.

Brindisi, 13/12/2007

Il Tecnico
(geom. Rocco CAFORIO)

DESCRIZIONE	VALORE
Tipologia Documento Comune Provincia Oggetto Committente Tecnico Impresa Luogo Data Importo per l'emissione dei SAL	Cronoprogramma Istituto Autonomo Case Popolari Provincia di Brindisi Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento alloggi ERP in Brindisi - Rione S. Elia - Cantiere ex GESCAL 2813 - Piazza Mantegna, Piazza Spadini, via Spadini. I.A.C.P. Brindisi geom. Rocco CAFORIO Brindisi 13/12/2007 60'000.00

COMMITTENTE: I.A.C.P. Brindisi

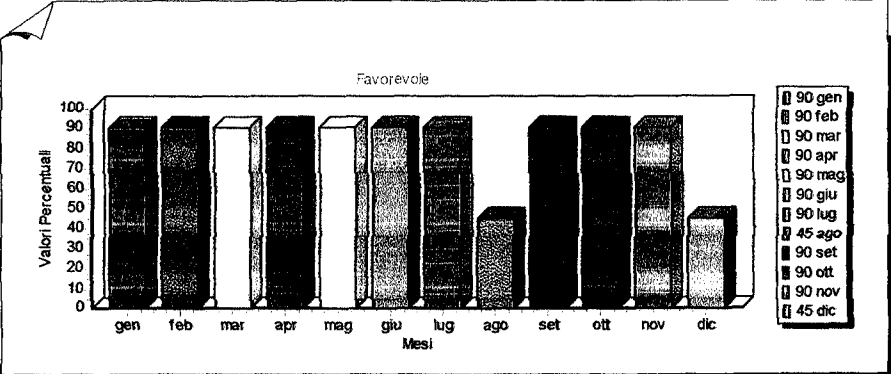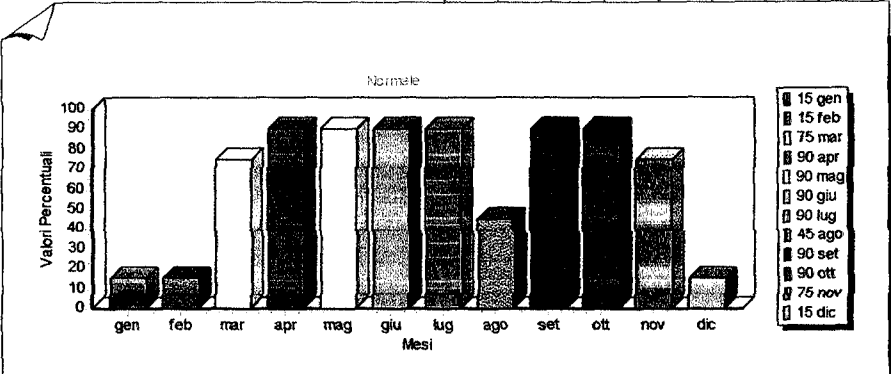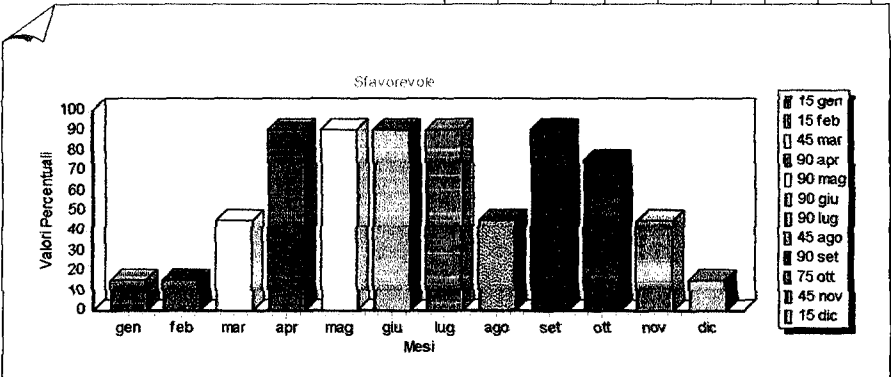DESCRIZIONE	Mesi												Media
	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
TABELLE CLIMATICO AMBIENTALI													
Favorevole	90	90	90	90	90	90	90	45	90	90	90	45	82.50
													
Normale	15	15	75	90	90	90	90	45	90	90	75	15	65.00
													
Sfavorevole	15	15	45	90	90	90	90	45	90	75	45	15	68.75
													

DESCRIZIONE	Mesi												Media																																																			
	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic																																																				
Favorevole - Normale - Sfavorevole <table><caption>Data for Favorevole - Normale - Sfavorevole chart</caption><thead><tr><th>Mese</th><th>Favorevole (%)</th><th>Normale (%)</th><th>Sfavorevole (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>gen</td><td>90</td><td>10</td><td>0</td></tr><tr><td>feb</td><td>90</td><td>10</td><td>0</td></tr><tr><td>mar</td><td>85</td><td>15</td><td>0</td></tr><tr><td>apr</td><td>90</td><td>10</td><td>0</td></tr><tr><td>mag</td><td>90</td><td>10</td><td>0</td></tr><tr><td>giu</td><td>90</td><td>10</td><td>0</td></tr><tr><td>lug</td><td>90</td><td>10</td><td>0</td></tr><tr><td>ago</td><td>45</td><td>55</td><td>0</td></tr><tr><td>set</td><td>90</td><td>10</td><td>0</td></tr><tr><td>ott</td><td>85</td><td>15</td><td>0</td></tr><tr><td>nov</td><td>90</td><td>10</td><td>0</td></tr><tr><td>dic</td><td>45</td><td>55</td><td>0</td></tr></tbody></table>	Mese	Favorevole (%)	Normale (%)	Sfavorevole (%)	gen	90	10	0	feb	90	10	0	mar	85	15	0	apr	90	10	0	mag	90	10	0	giu	90	10	0	lug	90	10	0	ago	45	55	0	set	90	10	0	ott	85	15	0	nov	90	10	0	dic	45	55	0												
	Mese	Favorevole (%)	Normale (%)	Sfavorevole (%)																																																												
	gen	90	10	0																																																												
	feb	90	10	0																																																												
	mar	85	15	0																																																												
	apr	90	10	0																																																												
	mag	90	10	0																																																												
	giu	90	10	0																																																												
	lug	90	10	0																																																												
	ago	45	55	0																																																												
	set	90	10	0																																																												
	ott	85	15	0																																																												
nov	90	10	0																																																													
dic	45	55	0																																																													
