

12

ENTE APPALTANTE 1.A.C.P. = BRINDISI = GESTIONE INA=CASA

LAVORI Costruzioni di case per civili abitazioni; Cooperative Domus, Venere, Nettuno e Nuova Brindisi.

IMPRESA LA GENERALE COSTRUZIONI s.r.l. Brindisi

DITTA PALIFICATRICE Ing. Crescenzo CERRACCHIO =NAPOLI=

VERBALE DI PROVA DI CARICO N° 2

L'anno millenovecento sessanta il giorno cinque

del mese di Agosto

con l'intervento dei signori:

Ing. Franco GENTILE =Direttore dei Lavori

Ing. Giuseppe MARASCO = " " "

Geom. Cesare MUSETTI =Assistente ai lavori

Dott. Armando DE CASTRO: per La Generale Costruzioni

Ing. Crescenzo CERRACCHIO: Ditta palificatrice.

si é proceduto alle operazioni per la prova di carico

sul plinto 9=N. Brindisi Palo n° 9/a diam. cm. 40

lunghezza ml. 15,90 gettato il 24/5/1960

previsto per un carico di esercizio di tonn. 35,500 e provato al

carico di tonn. 53,62 ottenendosi i risultati che seguono:

A - CARICO DEL PALO

Pressione al manometro Kg./cmq.	Pressione Tarata Kg./cmq.	Carico effettivo Tonn.	Orario	Letture flessimetri	
				Sinistro m./m.	Destro m./m.
0.000	0.000	0.000	11,35	0.000	0.000
50, =	60,50	19, =	11,40	0,20	0,50
			11,45	0,20	0,50
100, =	105,23	33,05	11,50	0,40	0,75
			11,55	0,40	0,75
110, =	114,65	36,00	11,57	0,50	0,90
			12,02	0,50	0,90
			12,20	0,50	0,90
150, =	150,61	47,31	12,30	0,85	1,05
			12,35	0,85	1,05
170, =	170,69	53,62	12,40	1,40	1,70
			12,45	1,70	2,40
			13,05	2,00	2,70
			13,45	2,3	2,70

Caratteristiche degli attrezzi :

Area del martinetto : cmq. 314,15

Manometro n° 32869 Certificato di taratura n°0347/C del 9/2/60

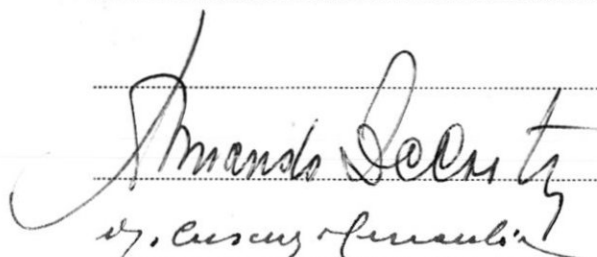
Istituto Scienze Costruzioni Università di Napoli.=

Flessimetri : FERRERO

B - SCARICO DEL PALO

Pressione al manometro Kg./cmq.	Pressione Tarata Kg./cmq.	Carico effettivo Tonn.	Orario	Letture flessimetri	
				Sinistro m./m.	Destro m./m.
170, =	170,69	53,62	16,21	2,30	2,70
150	150,61	47,31	16,26	2,30	2,70
			16,30	2,30	2,70
110	114,65	36, =	16,35	2,30	2,70
			16,40	2,20	2,50
100, =	105,23	33,05	16,45	2,10	2,30
			16,50	2,10	2,25
50, =	60,50	19, =	17, =	1,90	1,95
			17,10	1,85	1,70
0.00	0.00	0.00	17,15	1,85	1,60
			17,20	1,80	1,60
			18,00	1,50	1,35
			18,30	1,15	1,30
			////////////////////		

Firme degl'intervenuti :


 Armando Scerif
 Ing. Enrico Lombardi
 Gen. Muselli
 7
