

Legge 9-8-54 n.640

Lavori di costruzione di n.156 alloggi popolari nel
quartiere CEP di BRINDISI

Impresa Pier Marcello CORRADO (Oria)

Contratto n. 3402 del 4.5.1962

Importo dei lavori L. 339.146.473


VERBALE DI MISURAZIONE PIETRISCO DA DISPORSI SU MAS-
SICCIATA STRADALE N. 5

=.=.=

Il giorno del mese di dell'anno mil-
lenovecentosessantaquattro, nel Cantiere di Brindisi
CEP, alla presenza del Geom. Alcide Trivelli per con-
to dell'I.S.E.S., incaricato all'assistenza dei la-
vori, in contraddittorio col Geom. Glaucio Corrado,
per conto dell'Impresa Pier Marcello Corrado, si è
proceduto alla misurazione di parte del pietrisco
da spandere sulle strade del quartiere in oggetto.


Più precisamente sono stati controllati e contati
n. 20 cumuli di volume maggiore e n.21 cumuli di vo-
lume inferiore, come dalle misure sotto riportate
e posti lungo i tratti di strada dal 56 al 69 indi-
cati in verde nella planimetria di contabilità.

Sono stati contati n. 20 cumuli di pietrisco e
per i quali è stato controllato il volume di uno di
essi che è risultato delle seguenti dimensioni:

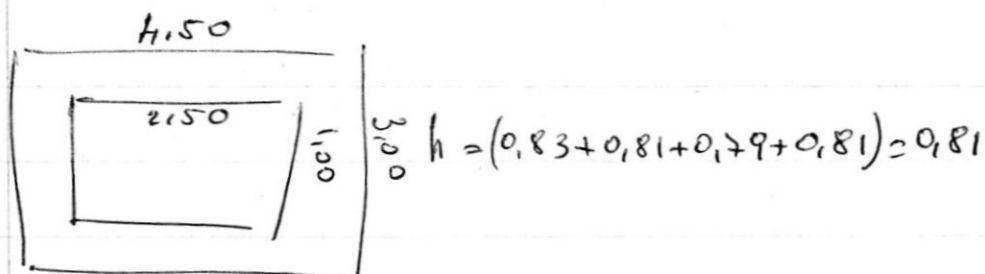

per cui $V = \frac{1}{3} 0.81 \times (2.50 + 13.50 + \sqrt{2.50 \times 13.50}) = mc. 5.889$

Sono stati inoltre contati n.21 cumuli di pietrisco per i quali è stato controllato il volume di uno di essi aventi le seguenti dimensioni



per cui $V = \frac{1}{3} 0.68 \times (10.00 + 2.50 + \sqrt{10.00 \times 2.50}) = mc. 3.967$

Essendo rispettivamente il volume dei cumuli costanti si è constatato il pietrisco ammannito che successivamente cosperso sulle strade ~~xxxxxxx~~ indicate in verde in planimetria ammonta a:

$n. 20 \times 5.889 = mc. 117.780$

$n. 21 \times 3.967 = "$ 83.307

Sommano mc. 201,087

Letto confermato e sottoscritto

p. L'IMPRESA

p. L'I.S.E.E.

(Geom. Glauco Corrado)

(Geom. Alcide Trivelli)
