

9

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli
li Dipendenti in FASANO -

IMPRESA: SARDELLA Luigi - Fasano

Importo a base d'asta.....L.64.500.000.=

Importo al netto del ribasso 3,32%...." 62.358.600.=

" " " perizia suppletiva..." 3.820.000.=

=====

VERBALE N°2 DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantacinque il giorno cinque del mese di Gennaio nel Cantiere dei Lavori suddetti.=

Il sottoscritto Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori, unitamente all'Impresa SARDELLA Luigi;

VISTO il contratto n°4213 del 10.5.1963 reg.a Brindisi il 28.5.1963 al n.1625 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 24.6.1963;

VISTO il verbale di proroga dell'1.7.1964 che fissa la scadenza dei lavori al 21.9.1964;

VISTO il verbale di sospensione in data 15.9.1964;

VISTO la perizia suppletiva dell'1.8.1964 di nette L.3.820.000.==;

VISTO l'approvazione della stessa in data 21.10.1964

n.24989;

VISTO l'atto aggiuntivo n°4485 del 30.10.1964 registrato a Brindisi il 7.11.1964 al n°846 Mod.I;

VISTO il verbale di ripresa del 9.11.1964 che fissa al 15.11.1964 il nuovo termine per la ultimazione dei lavori;

VISTO l'ordine di servizio n°1 del 10.11.1964 che ordina i lavori di cui alla perizia suppletiva e proroga di gg.60 la ultimazione dei lavori per cui questi vengono a scadere il 14.1.65;

CONSIDERATO che è in corso una 2^a perizia suppletiva per il completamento dei lavori di sistemazione esterna;

ha sospeso i lavori medesimi che verranno ripresi non appena sarà approvata la suddetta perizia.=


L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione dei lavori, che decorre da oggi, rimanendo ancora disponibili giorni dieci.=

Del che si è redatto, il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA
(SARDELLA Luigi)

Sardella Luigi

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

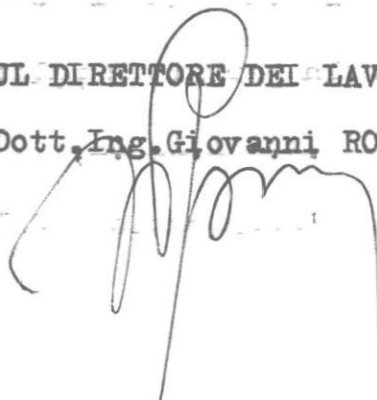

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

