



Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3803

del 19-11-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	30596	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 2 (04.02-2.02.01.09.003)	Gest.	RESIDUI/2016
MESSA IN SIC. NON STRUTT. SC. ELEM. - ITIS A. RIGHI - CONTR. STATALE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Tecnici LL.PP. Ambiente		nr.	1 del 05-07-2018
numero 1008/2015 del 02-08-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Delibera CIPE n.6/2012 - Programma straordinario stralcio interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, prevenzione e riduzione rischio connesso alla vulnerabilità elementi anche non strutturali - Istituto ex ITIS							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	61.079,42	62.959,43	
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	25.171,36	25.171,36	
Titolo	2	Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO	1.006,85	1.006,85	
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO	26.178,21	36.781,22	
3o Livello	01	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA	34.901,21		
4o Livello	09	Beni immobili					
5o Livello	003	Fabbricati ad uso scolastico					
SIOPE	2020109003						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 4) CONTRIBUTI REGIONALI					Fruttifero	C.U.P. J36E12000660001
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.006,85 dicensi MILLESEI/85							
Per : Delibera CIPE n.6/2012 - Programma straordinario stralcio interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, prevenzione e riduzione rischio connesso alla vulnerabilità elementi anche non strutturali - Istituto ex ITIS							

CREDITORE (Codice: 289)			
RUSO VINCENZO		VIA PUGLIA 8	
Cod.Fis. RSSVCN66M04C514U / P.Iva 11977970158		71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	Cig:Z57130B217 SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 28/06/2018 Lavori per la messa in sicurezza e la prevenzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali relativi all'istituto scolastico I.T.I.S. Augusto Righi (gia caserma Nino Bixio)	1.006,85	1.006,85
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCO DI NAPOLI (IT79V0101078382088486740153) - CIN:V - ABI:01010 - CAB:78382 - C/C:088486740153 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3802-3803 DEL 11/11 / 2019

REVERSALE N. _____

COLLEGATO CON ALTRO MANDATO N. _____ DEL ____/____/____

CODICE BILANCIO: 04.02-2.02.01.09.003

CAPITOLO 30596 ARTICOLO 0

BIL. RE 2014

IMPEGNO N. Sub. 1034.3 LIQUIDAZIONE N.

1008 DEL 02/08/2018

IMPORTO LIQUIDAZIONE: € 9.516,00

CIG DETERM. Z57130B217 (10) CUP DET. 3601200067000 (15)

DOCUMENTI: Delibera N.

del

Determ. N.

del

Determ. generale di liquidazione N.

75 /1

del

02/08/2018

SETTORE: Liq. LL.PP - Amb.

IMPONIBILE €

NUM.DET. 1 DEL

05/07/2018 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

DETER.IMPORTO € 26.178,22 N.TOTALE LIQ.

3

RITENUTA €

1Liq. LL.PP - Amb.43286

N.LIQUIDAZ.ATTO

1

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE €

€ 9.516,00

(IMPONIBILE + RITENUTA)

CREDITORE: Codice N.

(289)

RUSSO VINCENZO

PARTIVA IVA (11): IT 11977970158

VIA PUGLIA 8

CODICE FISCALE (16): RSSVCN66M04C514U

CERIGNOLA FG

(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI _ / _ NO _)

PARTIVA IVA (11): IT _____

CODICE FISCALE (16): _____

() FATTURA N. _____ DEL ____/____/____

PROT. ENTRATA N. _____ DEL ____/____/____ STAMPATA _ SI _ / _ NO _ SDI N. _____

IMPORTO. FATT. € 26.178,22 IMPON. _____ IVA _____

FATTURA UNICA _ SI _ NO _

CIG FATT. _____ (10) CUP FATT. _____ (15)

SALDO FATTURA _ SI _ / _ NO _ SALDO

ACCONTO FATTURA _ SI _ / _ NO _ PER €

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDETERMINATO _ SI _ / _ NO _

SCISSIONE _ SI _ / _ NO _ (SPESE ESENTI/ESCLUSE _ SI _ / _ NO _) (BOLLO _ SI _ / _ NO _)

EQUITALIA _ SI _ / _ NO _ DEL ____/____/____ (A) DICHIARAZIONE DEL /DURC SCADENZA ____/____/____ (A)

TRACCIABILITA' _ SI _ / _ NO _ (A) (A)=ALLEGATA IN PROCEDURA ALLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

IBAN: IT _ (2)/ _ (L)/ _ (5)/ _ (5) / _ (12)

COMMISSIONI BANCARIE _ SI _ / _ NO _ BANCA _____

DESCRIZIONE :

Delibera CIPE n.6/2012 - Programma straordinario stralcio interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, prevenzione e riduzione rischio connesso alla vulnerabilità elementi anche non strutturali - Istituto ex ITIS

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____



COMUNE DI CERIGNOLA

Settore Servizi Tecnici, Lavori Pubblici Ambiente

Prot.n° 24288

Cerignola, 5 NOV. 2019

OGGETTO: Delibera CIPE n.6 del 20.01.2012 - Programma straordinario stralcio di interventi urgenti nel patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, dell'istituto scolastico ex ITIS "Augusto Righi" - CUP: J36E12000670001 - Liquidazione saldo compensi relativi alla D.L., variante, coordinamento sicurezza dei lavori - CIG Z57130B217.

Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio
SEDE

Invito la S.V. a voler disporre il pagamento di complessivi € 26.178,21 a favore dell'arch. Vincenzo Russo, a titolo di saldo onorari relativi alla direzione, coordinamento sicurezza, redazione perizia di variante e suppletiva dei lavori di messa in sicurezza dell'edificio scolastico ex ITIS Augusto Righi, giusta quanto disposto con Atto di Liquidazione n.75/1 del 02/08/2018 di approvazione e liquidazione della relativa parcella/fattura emessa dal professionista n. FATTPA 1_18 del 28/06/2019 identificativo Sdi n. 108480274, acquisita al prot.gen. n. 19138 del 28/06/2018.

Il suddetto importo dovrà essere corrisposto mediante bonifico da effettuarsi sul conto corrente bancario opportunamente comunicato dalla stessa impresa, giusta comunicazione in atti, ai fini della tracciabilità dei movimenti finanziari in questione (art.3, comma 7 della L.136/2010). Il relativo mandato di pagamento dovrà essere emesso in duplice esemplare, ai fini della rendicontazione delle spese al MIT - attraverso il Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche, sede coordinata di Bari, Ente finanziatore dell'opera.

La spesa di € 26.178,21, trova imputazione sul capitolo 30596 codice 4.02-2.02.01.09.003 - a valere per € 9.049,42 sull'impegno n. 1035_2014, sub 1, RE 2014, liquidazione n.1006 del 02/08/2018, per € 7.612,80 sull'impegno n. 1035_2014, sub 3, RE 2017, liquidazione n.1007 del 02/08/2018, e per € 9.516,00 sull'impegno n. 1034_2015, sub 3, RE 2016, liquidazione n.1008 del 02/08/2018, con carico sulla 3^ erogazione di € 62.499,98 effettuata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Direzione Gen. per l'Edilizia Statale a saldo del finanziamento assegnato per la realizzazione dell'opera (cap.E 40267-2014 accert.66).

J36E12000670001 (o)

Il Dirigente del Settore
arch. Michele Prencipe

Si Allega:

- fattura elettronica;
- regolarità contributiva, comunicazione ex art.3, comma 7, legge 139/2012 e s.m. e i.

Versione 1.0

Notifica Esito Committente

Identificativo Sdl: **108480274**

Riferimento Fattura

Numero Fattura: **FATTPA 1_18**

Anno Fattura: **2018**

Posizione Fattura: **1**

Esito: **EC01** (Accettazione)

Descrizione: **Fattura accettata**

Message Id Committente: **001**

Ord. n. 19138 del 28.6.2018

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **0004663262**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT11977970158**
Codice fiscale: **RSSVCN66M04C514U**
Nome: **vincenzo**
Cognome: **russo**
Albo professionale di appartenenza: **Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori**
Provincia di competenza dell'Albo: **MI**
Numero iscrizione all'Albo: **8356**
Data iscrizione all'Albo: **1994-07-20** (20 Luglio 1994)
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **via puglie 8**
CAP: **71042**
Comune: **Cerignola**
Provincia: **FG**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0885427288**
E-mail: **studio@virusdesign.it**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **00362170714**
Denominazione: **Comune di Cerignola - Uff_eFatturaPA**

Dati della sede

Indirizzo: **Piazza Della Repubblica**
CAP: **71042**
Comune: **Cerignola**
Provincia: **FG**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01879020517**
Denominazione: **Aruba Pec S.p.A.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2018-06-28** (28 Giugno 2018)
 Numero documento: **FATTPA 1_18**
 Importo totale documento: **26178.21**

Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)
 Importo ritenuta: **4126.45**
 Aliquota ritenuta (%): **20.00**
 Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello 770S)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC04** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)
 Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
 Importo contributo cassa: **825.29**
 Imponibile previdenziale: **20632.26**
 Aliquota IVA applicata: **22.00**

Dati della convenzione

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
 Identificativo convenzione: **D.D. 63/18**
 Data convenzione: **2015-02-25** (25 Febbraio 2015)
 Codice commessa/convenzione: **cap.30596 imp. n.1035 sub 1 RE 2014**
 Codice Unitario Progetto (CUP): **J36E12000670001**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z57130B217**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
 Identificativo convenzione: **D.D. 194/34**
 Data convenzione: **2017-02-27** (27 Febbraio 2017)
 Codice commessa/convenzione: **cap.30596 imp. n.1034 sub 3 RE 2016**
 Codice Unitario Progetto (CUP): **J36E12000670001**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z57130B217**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
 Identificativo convenzione: **D.D. 445/85**
 Data convenzione: **2018-03-14** (14 Marzo 2018)
 Codice commessa/convenzione: **cap.30596 imp. n.1035 sub 3 RE 2017**
 Codice Unitario Progetto (CUP): **J36E12000670001**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z57130B217**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornituraNr. linea: **1****Codifica articolo**Tipo: **Codice fornitore**Valore: **ON**

Descrizione bene/servizio: **Lavori per la messa in sicurezza e la prevenzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali relativi all'istituto scolastico I.T.I.S. Augusto Righi (già caserma Nino Bixio) via xxv aprile - Cerignola (FG) - Acconto n.4 a saldo per Direzione Lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione a tutto il 3° ed ultimo SAL (100%), Perizia di variante e suppletiva**

Quantità: **1.000000000**Unità di misura: **NR**Valore unitario: **20632.26000000**Valore totale: **20632.26000000**IVA (%): **22.00**Soggetta a ritenuta: **SI****Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **21457.55**
 Totale imposta: **4720.66**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: **Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2018-07-28** (28 Luglio 2018)

Importo: **17331.10**

Istituto finanziario: **BANCO DI NAPOLI**

Codice IBAN: **IT79V0101078382088486740153**

Codice BIC: **IBSPITNA**

Codice pagamento: **BB30G**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it



VIRUSDESIGN®

v i n c e n z o r u s s o a r c h i t e t t o

8, via puglie - 71042 cerignola (fg) - tel/fax: +39 0885 427288 - mobile: +39 335 5388804 - e.mail: info@virusdesign.it

Preg.mo dott.ing. Clorindo Izzillo

DIRIGENTE SETTORE LL.PP. E
MANUTENZIONE

COMUNE DI CERIGNOLA

OGGETTO: COMUNICAZIONE CONTO CORRENTE BANCARIO DEDICATO AD APPALTI/COMMESSE PUBBLICHE AI SENSI ART.3 COMMA 7 DELLA L.136/2010 E S.M. E I.

Il sottoscritto arch. Vincenzo Russo nato a Cerignola (FG) il 04-08-1966 (C.F. RSSVCN66M04C514U) nella qualità di architetto libero professionista con sede legale in Cerignola (FG) CAP 71042 , via Puglie 8 regolarmente iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Milano al n. 8356, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 e s.m. e i. relativi ai pagamenti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

l'esistenza del conto corrente bancario dedicato, anche non in via esclusiva, alla gestione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche presso il BANCO DI NAPOLI sede di Cerignola (FG) con i seguenti identificativi:

BANCO DI NAPOLI filiale n.00592 di Cerignola (FG) via Roma 56

n° c/c bancario: 8848674 0153

intestato ad arch. Vincenzo Russo


cod. IBAN IT79 V010 1078 3820 8848 6740 153

Si allega, ai sensi del citato DPR 445/2000, copia fotostatica (non autenticata) del documento di identità.


Cerignola, 19-04-2016

arch. Vincenzo Russo



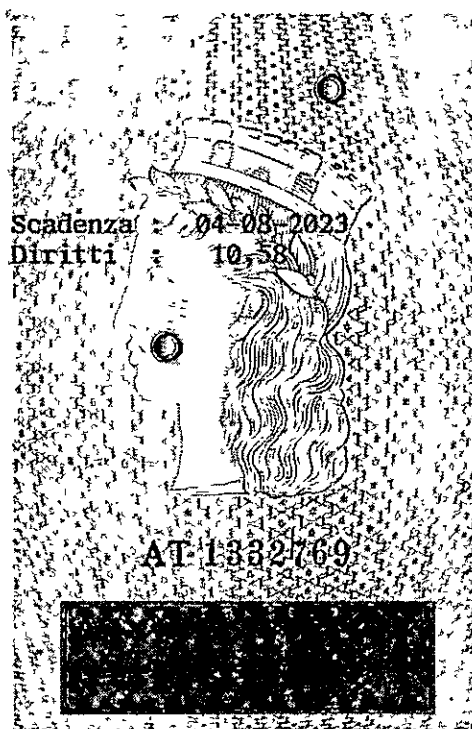

Cognome	RUSSO
Nome	VINCENZO
nato il	04-08-1966
(atto n. 928 P. 1 S. A 1966)	
a	CERIGNOLA (FG)
	Italiana
Cittadinanza	CERIGNOLA (FG)
Residenza	GENTILE GIOVANNI 11
Via	CONIUGATO
Stato civile	ARCHITETTO
Professione	
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura	185
Capelli	Castani
Occhi	Castani
Segni particolari	NESSUNO

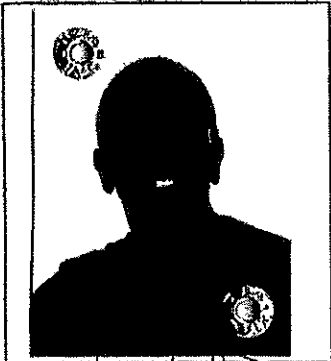	
Firma del titolare	
CERIGNOLA 17-08-2012	
Impronta del dito indice sinistro	L'Ufficio ha ricevuto DELEGATO SINISTRA 

C. Russo

DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Ufficio Iscrizioni e Contribuzioni Professionisti

388951/171.2.1/STAP03


Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA
LAVORI PUBBLICI
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA FG

Roma, 04 novembre 2019

Oggetto: certificato di regolarità contributiva Arch. Vincenzo Russo - richiesta del 04/11/2019

L'Arch. **Vincenzo Russo**, nato a CERIGNOLA FG il 04/08/1966, codice fiscale RSSVCN66M04C514U, matricola 388951 iscritto nei ruoli previdenziali di Inarcassa, **alla data del 04/11/2019, risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di questa Associazione**, per quanto accertato in relazione alle comunicazioni annuali inviate.

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
(Sergio Ricci)



Il presente certificato viene rilasciato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.50/2016. E' prodotto in carta semplice per gli usi consentiti dalla Legge, ha validità quattro mesi dalla data di rilascio e non preclude l'azione di accertamento e il recupero di eventuali somme che risultassero successivamente dovute.



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 75

In data **02-08-2018**

Atto Reg. Sett. N. 1

In data **05-07-2018**

OGGETTO: Delibera CIPE n.6/2012 - Programma straordinario stralcio interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, prevenzione e riduzione rischio connesso alla vulnerabilità elementi anche non strutturali - Istituto ex ITIS Augusto Righi - Liquidazione saldo onorari per direzione, redazione perizia, cordinamento sicurezza, contabilità dei lavori.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **cinque** del mese di **luglio**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI TECNICI LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

LAVORI PUBBLICI

Izzillo Ing. Clorindo, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

«Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata - sede coordinata di Bari, al fine di prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità di elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici, ha disposto apposito sopralluogo presso l'edificio sede dell'istituto scolastico "ITIS - Augusto Righi" di Via XXV Aprile, effettuato da proprio Tecnico rilevatore in data 18.09.2009, durante il quale sono state riscontrate problematiche appositamente riportate nella predisposta scheda di rilevamento.

Con delibera C.I.P.E. n. 6 del 20/01/2012 pubblicata sulla G.U.R.I. n.88 del 14/04/2012, è stata disposta, tra l'altro, l'assegnazione di risorse per la realizzazione del "Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici - II Stralcio".

Il citato MIT Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche, con nota prot. 0007493 del 04/07/2012 acquisita al protocollo n.16014 del 06.07.2012, ha trasmesso lo schema di convenzione relativo al Programma di cui sopra, nell'ambito del quale è compreso l'intervento finalizzato alla messa in sicurezza dell'edificio sede dell'Istituto scolastico "ITIS - Augusto Righi" in XXV Aprile - CUP: J36E12000670001.

In data 29/10/2012, presso il competente Ufficio del Provveditorato, si è proceduto alla sottoscrizione della "Convenzione" regolante i rapporti fra Stato ed Ente.

Con nota Ministeriale prot.n.7214 del 06/05/2014, acquisita al prot.n.11363 del 15/05/2014, la Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali-Div.1^a, ha trasmesso la detta "Convenzione", iscritta al n.19369 del 21.11.2013, comunicando che l'Ufficio Centrale di Bilancio del Ministero dell'Economia e Finanze, ha visto col n.175 del 9.1.2014 il Decreto prot.n.19707 del 22/11/2013 di approvazione della stessa Convenzione e impegno a favore del Comune di Cerignola dell'importo di € 643.800,00 finalizzato alla realizzazione dell'intervento in argomento (cod.n. 00612PUG135).

La spesa progettuale di complessivi € 643.800,00, finanziata con fondi assegnati dal MIT come dal citato Decreto, è stata imputata al capitolo 30596 bilancio 2014, correlato al finanziamento statale ed al capitolo di entrata 40267, bilancio 2014, accert. 66.

Con determinazione dirigenziale n.63/18 del 10.02.2015 è stato incaricato della progettazione esecutiva, sicurezza in fase di progettazione, direzione, coordinamento della sicurezza in fase d'esecuzione, alla misura e contabilità dei lavori l'arch. Vincenzo Russo (CIG Z57130B217), tecnico esterno alla struttura comunale, in possesso dei requisiti richiesti per l'espletamento dell'incarico. In data 25/02/2015 il professionista ha sottoscritto apposito disciplinare di incarico.

Il citato professionista, ad espletamento dell'incarico, ha trasmesso il progetto per la messa in sicurezza dell'edificio scolastico ex ITIS Augusto Righi, il quale -data la valenza storica artistica dell'immobile di età superiore a 50 anni- è stato sottoposto all'esame della Soprintendenza territorialmente

competente per l'acquisizione dell'autorizzazione, ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 42/2004.

La Soprintendenza alle Belle Arti e Paesaggio per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, con sede in Bari, giusta nota n.7254 del 17.11.2015, acquisita al prot.n.31425 del 25/11/2015, si è favorevolmente espressa sul progetto.

Con delibera n. 370 del 30/12/2015 la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo, adeguato nei termini di cui al parere della Soprintendenza, il quale è stato sottoposto al definitivo parere del competente Provveditorato, in osservanza dell'art.3, comma 1, della citata "Convenzione".

Con pec del 16/03/2016 è stato acquisito il parere favorevole rilasciato dal C.T.A. del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise la Puglia e la Basilicata - sede coordinata di Bari, giusto voto n.19 reso nell'adunanza dell'11.02.2016. In relazione ad alcune precisazioni esposte dal CTA è stato rimodulato il quadro economico di spesa.

I lavori, giusta determinazione dirigenziale del Settore Lavori Pubblici n.650/86 del 18/08/2016 e successivo contratto di appalto repertorio n.185 del 12/10/2016, registrato a Cerignola in data 12/10/2016 col n.2673 Serie 1T, sono stati definitivamente aggiudicati alla ditta Cadinvest srl (codice fiscale e partita IVA:01934460716), per il prezzo di € 322.184,29 al netto del ribasso offerto del 22,500% sulla base d'asta di € 415.721,66, oltre a € 68.112,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e per un totale complessivo di contratto per lavori pari a € 390.296,59, oltre iva come dovuta.

In relazione al risultato di gara, con la citata D.D. n.650/86 del 18/08/2016 è stato rideterminato il quadro economico, secondo le risultanze in essa riportate.

I lavori sono stati consegnati in data 18/10/2016, come da verbale in atti, e regolarmente iniziati in pari data. La durata degli stessi è stata stabilita in 180 gg, come da C.S.e contratto.

Con determinazione dirigenziale n.194/34 del 27/02/2017 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva finalizzata alla risoluzione delle emerse nuove contingenze e criticità, dettagliatamente riportate nella stessa determinazione e negli elaborati di perizia, redatti dal direttore dei lavori, arch. Vincenzo Russo, su autorizzazione del RUP.

Per effetto della suddetta variante, che ha previsto primariamente lavorazioni diverse impreviste ed imprevedibili in fase progettuale ed in parte lavori di miglioramento delle caratteristiche costruttive e di finitura, l'importo dei lavori è stato rideterminato in € 396.026,15 al netto del ribasso d'asta del 22,50% (applicato sull'importo computato di € 511.001,48), mentre gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso in € 77.613,03 stabilendo, pertanto, in € 473.639,17 il nuovo importo contrattuale, con l'incremento di € 83.342,58 che ha trovato copertura con la parziale utilizzazione delle economie di gara (voce "imprevisti").

Per la redazione della perizia di variante e suppletiva all'arch.Vincenzo Russo sono stati riconosciuti compensi professionali pari ad € 13.500,00, oltre contributo cnpaia ed IVA, con prelievo della spesa dalla voce imprevisti del quadro economico di progetto.

Sulla perizia è stato acquisito il parere favorevole della competente Soprintendenza ABAP-FG, giusta autorizzazione prot.n.3008 del 24/04/2017, e del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise la Puglia e la Basilicata - sede coordinata di Bari, giusto voto favorevole n°54 reso nell'Adunanza del 29/06/2017 dal proprio C.T.A. , comunicato con nota prot.n.6931 del 02/08/2017.

La spesa progettuale è rimasta confermata in complessivi € 643.800,00, secondo il seguente Q.E. analitico di perizia approvato con la citata D.D. n.194/34/2017:

LAVORI	Come da Precisazioni CTA	Post gara d'appalto	Perizia di variante e suppletiva
A LAVORI			
a1.importo dei lavori al netto del ribasso del 22,50%	415.721,66	322.184,29	396.026,15
a2.Oneri di sicurezza	68.112,30	68.112,30	77.613,02
TOTALE LAVORI	483.833,96	390.296,59	473.639,17
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b1.Iva sui Lavori (22%)	106.443,47	85.865,25	104.200,62
b2.Spese per pubblicità bando di gara	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Imprevisti (comprensivi di IVA)	8.837,57	122.953,16	
b3. Contributo Anac	225,00	225,00	225,00
b4. Progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	31.368,22	31.368,22	44.868,22
b5. calcoli strutturali consolidamento solai, deposito Genio Civile			3.152,60
b6. collaudo	3.000,00	3.000,00	3.000,00
b7. CNPAIA AL 4%	1.254,73	1.254,73	2.040,83
b8.Iva AL 22% su spese tecniche e cnpaia al 4%	7.837,05	7.837,05	11.673,56
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	159.966,04	253.503,41	170.160,83
TOTALE QUADRO ECONOMICO	643.800,00	643.800,00	643.800,00

Con determinazione dirigenziale n.1071/101 del 13/09/2017 è stato conferito all'ing.Nicola Rizzo -CF.RZZNCL69D23C514U, P.IVA:02389870714, l'incarico per la redazione della relazione di calcolo degli interventi di consolidamento estradossale dei solai di copertura del 1° Piano (calpestio del sottotetto ala SUD), previsti con la intervenuta variante, (CIG:Z731FE07AA) e all'arch.Matteo Morra -CF.MRRMTT64T27C514J, P.IVA:03455820716- l'incarico per il collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e definitivo (CIG: Z661FE0815).

Sul "progetto esecutivo strutturale degli interventi di consolidamento del solaio del sottotetto" è stata ottenuta l'autorizzazione sismica registrata in data 06/11/2017 da parte del preposto Ufficio Edilizia sismica della Provincia di Foggia ed acquisita agli atti in data 13.11.2017 al prot.n.33132.

La D.L., con verbale del 24/01/2018, acquisito agli atti il 30/01/2018 al prot.n.3003, ha certificato l'avvenuta ultimazione dei lavori in pari data, fatta eccezione per alcune lavorazioni e forniture di piccola entità non incidenti sulla funzionalità, per la realizzazione delle quali è stato concesso il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art.199, comma 2, del DPR 207 del 5/10/2010.

La ultimazione, pertanto, è stata considerata avvenuta nei termini contrattuali fissati al 24/01/2018, tenuto conto della

1
2
intervenuta sospensione in attesa dell'acquisizione sulla variante del parere della Soprintendenza ABAP e del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata e della proroga concessa con la variante stessa.

Il verbale di ripresa lavori del 6.12.2017 è stato firmato dall'appaltatrice Cadinvest Srl con riserva.

L'arch. Vincenzo Russo, in qualità di Direttore Lavori, con nota acquisita al prot.n.6387 del 26/02/2018, ha proceduto a trasmettere gli atti di contabilità finale e Relazione sul Conto Finale.

Lo stato finale dei lavori è stato sottoscritto dall'Appaltatrice in data 21.02.2018 con riserva, confermando le riserve iscritte sul verbale di ripresa dei lavori del 06/12/2017 ed esplicitate sul registro di contabilità in data 20.12.2017, avanzando richiesta di indennità derivanti dal prolungamento della sospensione dei lavori oltre i termini previsti dall'art.160 del DPR 207/2010.

Il Direttore dei lavori in merito alla riserva formulata dall'Appaltatrice, con relazione riservata del 23/02/2018, redatta ai sensi dell'art.200 del DPR n.207 del 5/10/2010, con motivate controdeduzioni ha manifestato al Responsabile del procedimento che le richieste dell'Appaltatrice, in considerazione delle richiamate disposizioni legislative relative alla sospensione e ripresa dei lavori - proroghe e tempo per la ultimazione dei lavori (art.158 e art.159 del DPR n.207/2010), si possono ritenere non accettabili.

Con Pec del 28/02/2018, acquisita al prot. n.6759 del 01/03/2018, l'Appaltatrice ha inoltre richiesto gli interessi legali e moratori per ritardato pagamento del corrispettivo di cui al 2° SAL, secondo il calcolo nella stessa riportato.

Con determinazione dirigenziale n. 445/85 del 14/03/2018 si è proceduto:

- alla presa d'atto dello stato finale dei lavori unitamente agli atti di contabilità finale e alla relazione sullo stato finale;
- a respingere, a termini delle disposizioni normative nella stessa richiamate, la richiesta avanzata dall'Appaltatrice in relazione alle riserve dalla stessa formulate.

Ciò stante il direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza, arch. Vincenzo Russo - con riferimento alla parcella esibita in relazione al saldo onorari dovutogli per direzione lavori, coordinamento della sicurezza, redazione perizia di variante e suppletiva, misure e contabilità dei lavori, acquisita in data 30/01/2018 al prot. n.3224 - ha emesso ai fini della liquidazione delle proprie spettanze la fattura n.FATTPA 1 18 del 28/06/2018, acquisita al protocollo n. 19138 del 28/06/2018 - sdi 108480274, dell'importo di € 20.632,26, oltre Cassa previdenziale 4% pari ad € 825,29 ed iva al 22% pari ad € 4.720,66 e, quindi, di complessivi di € 26.178,21.

Verificata la regolarità contributiva del professionista e preso atto della dichiarazione rilasciata dallo stesso, ai sensi dell'art.3 comma 7 della L.136/2010.

Dato atto che la relativa spesa trova capienza alle specifiche voci di quadro economico di progetto ed imputazione al capitolo 30596, cod. bilancio 4.02-2.02.01.09.003, a valere per € 9.049,42

all'impegno n. 1035-2014 sub 1 RE 2014, per € 9.516,00 all'impegno 1034-2015 sub 3 RE 2016 e per € 7.612,80 all'impegno 1035-2014 sub 3 RE 2017.

Si ritiene, pertanto, su parere del Responsabile del Procedimento, ing. Clorindo Izzillo, di procedere all'approvazione della parcella professionale, con contestuale riconoscimento del credito liquidabile a favore dell'arch. Vincenzo Russo dell'importo di cui alla esibita fattura, subordinando il relativo pagamento alla erogazione da parte Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, su istruttoria del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata - sede coordinata di Bari, ai quali verrà inoltrata opportuna documentazione e relativa richiesta di erogazione.

La suddetta fattura rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti e, pertanto, si procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore dell'importo imponibile della stessa, mentre la somma corrispondente all'Iva, verrà versata all'Erario con le modalità previste dalla legge.

Dato atto che all'intervento è stato attribuito il CUP: ~~J36E12000670001~~; ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex Art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12 novembre 2010, n.187 convertito con modificazioni nella legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", all'attività inerente l'affidamento dei lavori è stato attribuito il CIG: 66494389D1, mentre a quella relativa alla prestazione professionale di progettazione, coordinamento della sicurezza, D.L., misure e contabilità dei lavori di cui alla presente liquidazione il CIG: Z57130B217.»

Visto il D.Lgs. 163/2006 ed il D.P.R. 207/2010;

Visto il D.Lgs. n.50 del 18/04/2016;

Visti gli adempimenti ex artt. 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, si dispone la pubblicazione del presente atto nella sezione del link "Amministrazione trasparente", sotto sezione "bandi di gara e contratti";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di adozione del Piano Economico di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 06/06/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale si ridefinisce e si affida all'ing. Clorindo Izzillo, la Dirigenza del Settore Servizi Tecnici Lavori Pubblici - Ambiente comprendente i Servizi Lavori Pubblici, Manutenzione, Ambiente e Verde Pubblico;

Visto il decreto del Sindaco dell'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018;

D E T E R M I N A

1) la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di approvare la parcella dell'importo di € 20.632,26 oltre contributo previdenziale ed iva, esibita dall'arch.Vincenzo Russo a saldo degli onorari dovuti per le prestazioni di direzione, redazione perizia di variante e suppletiva, misura, contabilità, coordinamento della sicurezza dei lavori per la "Messa in sicurezza e la prevenzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, nell'Istituto scolastico A. Righi" CUP: J36E12000670001, in virtù dell'incarico allo stesso conferito con DD n.63/18 del 10.02.2015 (CIG:Z57130B217) e successiva n.194/34 del 27/02/2017 di approvazione della variante;

3) di liquidare a favore dell'arch. Vincenzo Russo l'importo di € 26.178,21, contributo cnpaia 4% pari ad € 825,29 ed iva al 22% pari ad € 4.720,66 compresi, come da relativa fattura emessa dallo stesso professionista n.FATTPA 1-18 del 28/06/2018, acquisita al protocollo n. 19138 del 28/06/2018, dandosi atto che la relativa spesa trova capienza al finanziamento assunto per la realizzazione dell'opera, correlato al capitolo in entrata 40267, bilancio 2014, accert. 66, ed imputazione al capitolo 30596, cod. bilancio 4.02-2.02.01.09.003, a valere per € 9.049,42 all'impegno n. 1035-2014 sub 1 RE 2014, per € 9.516,00 all'impegno 1034-2015 sub3 RE 2016 e per € 7.612,80 all'impegno 1035-2014 sub 3 RE 2017, specificando che all'effettivo pagamento si provvederà ad avvenuta relativa erogazione da parte del Ministero dell'Interno, finanziatore dell'opera;

4) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2018, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

5) di liquidare la detta spesa di € 26.178,21 al suddetto capitolo ed impegno, imputandola al bilancio 2018;

6) di dare opportuna comunicazione del presente atto, unitamente alla documentazione probante della spesa, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attraverso la competente Struttura del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise la Puglia e la Basilicata - sede coordinata di Bari, nei termini di cui alla citata "Convenzione", ai fini della rendicontazione delle spese;

8) di dare atto che la redazione del presente atto è stata assegnata alla Sig.ra Battaglino Anna, in servizio presso l'Ufficio Lavori Pubblici.

IL Dirigente DEL SETTORE

Izzillo Ing. Clorindo

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell'art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000

attesta

la copertura finanziaria.

La spesa complessiva di € 26.178,21 (CIG. Z57130B217) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Delibera CIPE n.6/2012 - Programma straordinario st n. 1006 del 02-08-2018 CIG Z57130B217	
Su Impegno N° 1 sub n° 1 del 06-02-2015 a Residuo 2014 approvato con Atto n. 63 SETTORE LL. PP. MANUT. del 10-02-2015 avente per oggetto "Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici - Secondo	
Missione Programma 5° livello 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	
Capitolo 30596 Articolo MESSA IN SIC. NON STRUTT. SC. ELEM. - ITIS A. RIGHI - CONTR. STATALE	
Causale	Delibera CIPE n.6/2012 - Programma straordinario stralcio interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, prevenzione e riduzione rischio connesso alla vulnerabilità elementi anche non strutturali - Istituto ex ITIS
Importo	€. 9.049,42
Beneficiario 289 RUSSO VINCENZO	
Quietanza BANCO DI NAPOLI (IT79V0101078382088486740153) IBAN IT79V0101078382088486740153	
Delibera CIPE n.6/2012 - Programma straordinario st n. 1007 del 02-08-2018 CIG Z57130B217	
Su Impegno N° 3 sub n° 3 del 21-02-2018 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 42 Determinazione Servizi Tecnici del 01-02-2018 avente per oggetto Delibera CIPE n.6/2012 - Programma straordinario stralcio interventi sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e prevenzione rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali - Istituto ex ITIS Augusto Righi	
Missione Programma 5° livello 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	
Capitolo 30596 Articolo MESSA IN SIC. NON STRUTT. SC. ELEM. - ITIS A. RIGHI - CONTR. STATALE	
Causale	Delibera CIPE n.6/2012 - Programma straordinario stralcio interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, prevenzione e riduzione rischio connesso alla vulnerabilità elementi anche non strutturali - Istituto ex ITIS
Importo	€. 7.612,80
Beneficiario 289 RUSSO VINCENZO	
Quietanza BANCO DI NAPOLI (IT79V0101078382088486740153) IBAN IT79V0101078382088486740153	
Delibera CIPE n.6/2012 - Programma straordinario st n. 1008 del 02-08-2018 CIG Z57130B217	
Su Impegno N° 3 sub n° 3 del 24-02-2017 a Residuo 2016 approvato con Atto n. 194 D.D. Reg. Gen. N. del 27-02-2017 avente per oggetto Delibera CIPE n.6/2012 - Programma straordinario stralcio interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, prevenzione e riduzione rischio connesso alla vulnerabilità elementi anche non strutturali - Istituto ex ITIS	
Missione Programma 5° livello 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	
Capitolo 30596 Articolo MESSA IN SIC. NON STRUTT. SC. ELEM. - ITIS A. RIGHI - CONTR. STATALE	
Causale	Delibera CIPE n.6/2012 - Programma straordinario stralcio interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, prevenzione e riduzione rischio connesso alla vulnerabilità elementi anche non strutturali - Istituto ex ITIS
Importo	€. 9.516,00
Beneficiario 289 RUSSO VINCENZO	
Quietanza BANCO DI NAPOLI (IT79V0101078382088486740153) IBAN IT79V0101078382088486740153	

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal al , come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città,

IL Responsabile AA.GG
VALENTINO MARIA CONCETTA

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201900003495688

Identificativo Pagamento: FATT.2019

Importo: 17331,10 €

Codice Fiscale: RSSVCN66M04C514U

Data Inserimento: 19/11/2019 - 15:09

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA
