



Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4094

del 09-12-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO


2019

Capitolo	30594	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 2 (04.02-2.02.01.09.003)	Gest.	RESIDUI/2017
MESSA IN SIC. NON STRUTT. SC. ELEM. CARDUCCI - CONTR. STATALE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Tecnici LL.PP. Ambiente		nr.	249 del 05-11-2019
numero 1615/2014 del 15-11-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Delibera CIPE n.6 del 20.01.2012 -Programma straordinario stralcio di interventi urgenti nel patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non st							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio	PREVISIONE ASSESTATA		241.511,95	242.463,00	
Programma	02	Altri ordini di Istruzione	PRECEDENTI PAGAMENTI		214.764,28	214.764,28	
TITOLO	2	Spese in conto capitale	PRESENTE IMPORTO		1.984,72	1.984,72	
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	TOTALE PAGATO		216.749,00		
3o Livello	01	Beni materiali	DISPONIBILITA' RESIDUA		24.762,95	25.714,00	
4o Livello	09	Beni immobili					
5o Livello	003	Fabbricati ad uso scolastico					
SIOPE	2020109003						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 4) CONTRIBUTI REGIONALI					Fruttifero	C.U.P. J36E12000660001
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.984,72 dicono MILLENOVECENTOTTANTAQUATTRO/72							
Per : Delibera CIPE n.6 del 20.01.2012 -Programma straordinario stralcio di interventi urgenti nel patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi,							

CREDITORE (Codice: 466)				
ZAGARIA IGNAZIO		VIA ALDO MORO,159		
Cod.Fis. ZGRGNZ62P23C514M / P.Iva 01886750718		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	Cig:Z45130B224 ACCONTO Fatt.n. 3/E del 28/10/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA PRIMARIA GIOSUE CARDUCCI IN VIA EGMONT N. 1 DA REALIZZARE ALL'INTERNO DELL'ABITATO DEL COMUNE DI CERIGNOLA(FG). SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE E C	1.984,72		
			1.984,72	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA INTESA SAN PAOLO BONIFICO IT 16U0306978383100000004494 - CIN:U - ABI:03069 - CAB:78383 - C/C:100000004494			
		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4094 DEL 9/12/2019

REVERSALE N. _____

COLLEGATO CON ALTRO MANDATO N. _____ DEL ____/____/____

CODICE BILANCIO: 04.02-2.02.01.09.003

CAPITOLO 30594 ARTICOLO 0

BIL. RE 2017

IMPEGNO N. Sub. 1033.2 LIQUIDAZIONE N. 1615 DEL 15/11/2019

IMPORTO LIQUIDAZIONE: € 10.888,80

CIG DETERM. Z45130B224 (10) CUP DET. 036E12000660001 (15)

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

Determ. generale di liquidazione N. _____

1079 /249

15/11/2019

SETTORE: Liq. LL.PP - Amb.

IMPONIBILE €

NUM.DET. 249 DEL 05/11/2019

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

DETER.IMPORTO € 16.641,04 N.TOTALE LIQ. 2

RITENUTA €

249Liq. LL.PP - Amb.43774 N.LIQUIDAZ.ATTO 2

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE €

€ 1.984,72

(IMPONIBILE + RITENUTA)

CREDITORE: Codice N.

(466)

ZAGARIA IGNAZIO

PARTIVA IVA (11): IT 01886750718

VIA ALDO MORO,159

CODICE FISCALE (16): ZGRGNZ62P23C514M

CERIGNOLA FG

(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI _ / _ NO _)

PARTIVA IVA (11): IT _____

CODICE FISCALE (16): _____

() FATTURA N. 3/e DEL 28/10/19

PROT. ENTRATA N. _____ DEL ____/____/____ STAMPATA _ SI _ / _ NO _ SDI N. _____

IMPORTO. FATT. € 16.641,04 IMPON. € 13.640,20 IVA € 3.000,84

FATTURA UNICA _ SI _ NO _

CIG FATT. _____ (10) CUP FATT. _____ (15)

SALDO FATTURA _ SI _ / _ NO _ ACCONTO

ACCONTO FATTURA _ SI _ / _ NO _ PER €

SALDO FATTURA IN ACCONTO PRESENTEMENTE _ SI _ / _ NO _

SCISSIONE _ SI _ / _ NO _ (SPESE ESENTI/ESCLUSE _ SI _ / _ NO _) (BOLLO _ SI _ / _ NO _)

EQUITALIA _ SI _ / _ NO _ DEL ____/____/____ (A) DICHIARAZIONE DEL /DURC SCADENZA ____/____/____ (A)

TRACCIABILITA' _ SI _ / _ NO _ (A) (A)=ALLEGATA IN PROCEDURA ALLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

IBAN: IT _ (2)/ _ (L)/ _ (5)/ _ (5)/ _ (12)

COMMISSIONI BANCARIE _ SI _ / _ NO _ BANCA _____

DESCRIZIONE :

Delibera CIPE n.6 del 20.01.2012 -Programma straordinario stralcio di interventi urgenti nel patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non st

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____

UBM RICERCA N. 26 421 DEL 27/11/2019



COMUNE DI CERIGNOLA

Settore Lavori Pubblici, Manutenzione, Ambiente e Verde Pubblico

27 NOV. 2019

Prot.n° 36421

Cerignola, _____

OGGETTO: Delibera CIPE n.6 del 20.01.2012 pubblicata sulla GURI n.88 del 14.4.2012 – secondo stralcio – Regione Puglia - Programma straordinario stralcio di interventi urgenti nel patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, dell'edificio Scolastico "G.Carducci" - Intervento n 00612PUG134- codice MIUR: FG EE028013 – **CUP: J36E12000660001**.- Liquidazione acconto su onorari ancora dovuti per la progettazione della variante, direzione misure, coordinamento sicurezza, emissione certificato di regolare esecuzione dei lavori – **CIG Z45130B224**.

Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio
SEDE

Invito la S.V. a voler disporre il pagamento di € 1.984,72 a favore dell'arch. Ignazio Zagaria, a titolo di acconto sugli onorari ancora dovuti per la progettazione della variante, direzione, misure, contabilità ed emissione di certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, dell'importo di complessivi € 16.641,04 contributo cnpaia 4% compreso, in acconto alla fattura n.3/E del 28/10/2019, sdi 1846666685, acquisita nel sistema Unimatica al protocollo n.20191028E1ZZNWNW00427aa del 28/10/2019, per il corrispondente importo di € 16.641,04, contributo cnpaia pari ad € 640,04 compreso (in franchigia IVA in quanto prestazione effettuata in regime forfettario), la cui liquidazione è stata disposta con Atto di Liquidazione n. 1079/249 del 15/11/2019.

Il suddetto importo dovrà essere corrisposto mediante bonifico da effettuarsi sul conto corrente bancario opportunamente comunicato dalla stessa impresa, giusta comunicazione in atti, ai fini della tracciabilità dei movimenti finanziari in questione (art.3, comma 7 della L.136/2010). Il relativo mandato di pagamento dovrà essere emesso in duplice esemplare, ai fini della rendicontazione delle spese alla Regione Puglia, Ente finanziatore dell'opera..

La spesa di € 1.984,72 (in acconto a quella liquidata di complessivi € 16.641,04) trova disponibilità alle corrispondenti voci di quadro economico dell'opera ed imputazione sul capitolo 30594 codice 4.02-2.02.01.09.003 - impegno n. 1033-2014, sub 2 RE 2017, liquidazione n. 1615 a valere sulle disponibilità di cui all'accredito di € 115.708,00 dalla stessa Regione effettuata a titolo di 2^ erogazione in conto contributo – cap. E.40263 c.bil.4.03.10.01.001 accert.64).

IL DIRIGENTE DI SETTORE
arch. Michele Prencipe

Si Allega:

- * fattura elettronica esibita dal professionista;
- * regolarità contributiva;
- * dichiarazione tracciabilità.

(PAGARE)

CARDUCCI

DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Ufficio Iscrizioni e Contribuzioni Professionisti

361852/21.2.7/STAP04


Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA FG

Roma, 09 settembre 2019

Oggetto: certificato di regolarità contributiva Arch. Ignazio Zagaria - richiesta del 09/08/2019

L'Arch. **Ignazio Zagaria**, nato a CERIGNOLA FG il 23/09/1962, codice fiscale ZGRGNZ62P23C514M, matricola 361852 iscritto nei ruoli previdenziali di Inarcassa, **alla data del 09/09/2019, risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di questa Associazione**, per quanto accertato in relazione alle comunicazioni annuali inviate.

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
(Sergio Ricci)



Il presente certificato viene rilasciato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.50/2016. E' prodotto in carta semplice per gli usi consentiti dalla Legge, ha validità quattro mesi dalla data di rilascio e non preclude l'azione di accertamento e il recupero di eventuali somme che risultassero successivamente dovute.

CITTÀ DI CERIGNOLA

★ 12 DIC. 2018 ★

POSTA IN ARRIVO

Comune di Cerignola

Ufficio Ragioneria

Piazza della Repubblica, 1

71042 - Cerignola (FG)

Oggetto: Comunicazione ai sensi dell'art. 3, comma 7, legge 136/2010, di conto corrente dedicato ai contratti pubblici di lavori / servizi / forniture stipulati con il Comune di Cerignola (FG).

Il sottoscritto arch. **ZAGARIA IGNAZIO** in qualità di unico titolare dello studio di architettura, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3, della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione per i contratti in oggetto

COMUNICA

ai sensi del comma 7 dello stesso art. 3 gli estremi del conto corrente dedicato, in modo non esclusivo per tutti i contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge ed a quelli che saranno sottoscritti successivamente:

Dati Conto Corrente	Conto corrente intestato : 00004494 Codice IBAN : IT16 U030 6978 3831 0000 0004 494 Banca/Posta : BANCA INTESA SANPAOLO FILIALE 66399 - VIA ROMA 56 ANG. VIALE DIVITTORIO - 71042 CERIGNOLA (FG)
---------------------	---

Di seguito vengono riportati gli estremi delle persone fisiche delegate ad operare sul conto: (Cognome e nome - Codice fiscale - Data di nascita - Residenza - Specifica di ruolo e poteri).
Zagaria Ignazio, codice fiscale ZGRGNZ62P23C514M, nato a Cerignola (FG) il 23/09/1962, ed ivi residente in via Aldo Moro 159, unico titolare dello studio di Architettura).


Ci impegniamo a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi.

Distinti saluti.


Cerignola li 12 dicembre 2018

IN FEDE

Ignazio Zagaria
(Arch. IGNAZIO ZAGARIA)

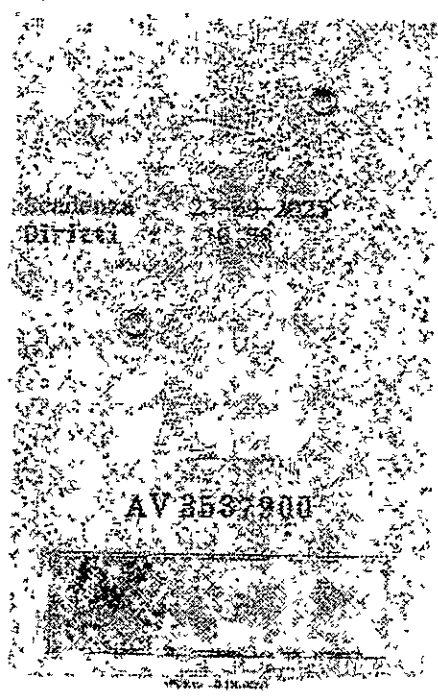

Cognome	PAGARIA
Nome	TOMAZIO
Data di nascita	23-09-1962
Luogo di nascita	171 A 1962
Professione	CERIGNOLA (FG)
Qualifica	PERITTO
Residenza	CERIGNOLA (FG)
Via	CORSO VENEZIA 158
Stato civile	CUNUGATO
Indirizzo	CRESSATI 127/87 ART. 2
CONNOVITA' FONTELESE SALERNI	
Stato	172
Capelli	Grizzolati
Colori	Castani
Segni particolari	NESSUNO

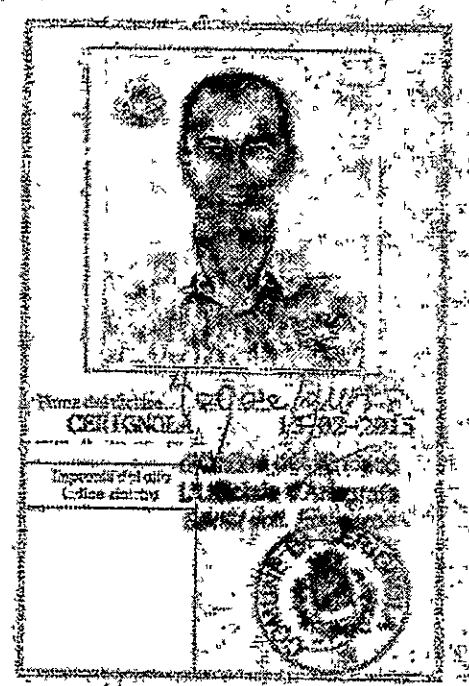

FATTURA ELETTRONICA

Versione
FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: ALB2532460
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: E1ZZNW

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01886750718
Codice fiscale: ZGRGNZ62P23C514M
Nome: IGNAZIO
Cognome: ZAGARIA
Regime fiscale: RF19 (Regime forfettario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA PERUGIA
Numero civico: 6
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Recapiti


Telefono: 0885411142
E-mail: ignazio.zagaria@alice.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola - SETTORE SERVIZI TECNICI
LAVORI PUBBLICI AMBIENTE

IL RESPONSABILE
N. 22/2015
(Arch. MICHELE PRENOCPE)



Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426
Denominazione: Namirial SPA

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione
FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)

Valuta importi: EUR

Data documento: 2019-10-28 (28 Ottobre 2019)

Numero documento: 3/E


Importo totale documento: 16641.04

Causale: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA
SCUOLA PRIMARIA 'GIOSUE' CARDUCCI IN VIA EGMONT N. 1 DA
REALIZZARE ALL'INTERNO DELL'ABITATO DEL COMUNE DI
CERIGNOLA(FG). SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE E C

Causale: OORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI IN
OGGETTO DELL'APPROVAZIONE DELLA VARIANTE COME DA D.D.
N. 62/17 DEL 10/02/2015 E N. 1406/169 DEL 14/11/2017 - QUARTO ED
ULTIMO ACCONTO IMPEGNO SPESA 1033-2014

Causale: SUB 2 RE 2017 - CAPITOLO 30594 - CIG Z45130B224 - CUP
J36E12000660001 E IMPEGNO SPESA 1033-2014 SUB 1 RE 2014 -

IL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI TECNICI
AMBIENTE - MANUTENZIONE
(Arch. MICHELE PRENCIP



CAPITOLO 30594 - CIG Z45130B224 - CUP J36E12000660001,
OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENU
Causale: TA D'ACCONTO

Bollo

Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 2.00

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC04** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
Importo contributo cassa: **640.04**
Imponibile previdenziale: **16001.00**
Aliquota IVA applicata: **0.00**
Tipologia di non imponibilità del contributo: **N2** (non soggette)

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **62/17**
Data ordine di acquisto: **2015-02-10** (10 Febbraio 2015)
Codice Unitario Progetto (CUP): **J36E12000660001**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z45130B224**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura


Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA PRIMARIA 'GIOSUE' CARDUCCI' IN VIA EGMONT N. 1 DA REALIZZARE ALL'INTERNO DELL'ABITATO DEL COMUNE DI CERIGNOLA(FG). SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI IN OGGETTO DELL'APPROVAZIONE DELLA VARIANTE COME DA D.D. N. 62/17 DEL 10/02/2015 E N. 1406/169 DEL 14/11/2017 - QUARTO ED ULTIMO ACCONTO PROGETTAZIONE EDILIZIA .**
Valore unitario: **16001.00**
Valore totale: **16001.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

IL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI TECNICI LL.PP.
MANUTENZIONE
(Arch. MICHELE PRENDIPIRE)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N2** (non soggette)
Totale imponibile/importo: **16641.04**
Totale imposta: **0.00**



Riferimento normativo: **REGIME FORFETTARIO (ART.1, C.54-89, L. 190 /2014)**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)


Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Importo: **16641.04**

Codice IBAN: **IT16U0306978383100000004494**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it



IL CAPOFILA
NOME COGNOME
MAG. MICHELE PRINCIPALONE



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 1079

In data 15-11-2019

Atto Reg. Sett. N. 249

In data 05-11-2019

OGGETTO: Delibera CIPE n.6 del 20.01.2012 -Programma straordinario stralcio di interventi urgenti nel patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, dell'edificio Scolastico "G.Carducci" - Liquidazione saldo onorari progettazione, direzione lavori, variante, coordinamento sicurezza, misure e contabilità, emissione certificato di regolare esecuzione dei lavori.

L'anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di novembre, in Cerignola, nella residenza comunale

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI TECNICI LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

LAVORI PUBBLICI

Prencipe Arch. Michele, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

«Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - sede coordinata di Bari, al fine di prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità di elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici, ha disposto apposito sopralluogo presso l'edificio sede della scuola elementare G. Carducci, effettuato da proprio Tecnico rilevatore in data 02.07.2009, durante il quale sono state riscontrate problematiche appositamente riportate nella predisposta scheda di rilevamento.

Con delibera C.I.P.E. n. 6 del 20.01.2012 pubblicata sulla G.U.R.I. n.88 del 14.04.2012, è stata disposta l'assegnazione di risorse per la realizzazione del "Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici - Secondo Stralcio".

Il MIT Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche - sede coordinata di Bari, con nota prot.0007493 del 04/07/2012 acquisita al protocollo generale n.16014 del 06.07.2012, ha comunicato che il Comune di Cerignola è risultato beneficiario del finanziamento di € 257.130,00 per la messa in sicurezza dell'edificio scolastico G. Carducci cod.n.006612PUG134.

Per l'attuazione dell'intervento in argomento è stata stipulata la "Convenzione" n.19368 del 21/11/2013.

Con nota Ministeriale prot. n.7211 del 06/05/2014, acquisita al prot.n.11362 del 15/05/2014, la Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali - Div.1^a, ha trasmesso la Convenzione regolante i rapporti fra Stato ed Ente attuatore n.19368 del 21.11.2013, approvata con Decreto prot. n.19825 del 26.11.2013, registrato alla Corte dei Conti al reg.1 foglio 714 del 7/02/2014, con il quale è stato definitivamente assunto a favore del Comune di Cerignola l'impegno dell'importo complessivo di € 257.130,00 a valere sul Cap.7384 PG.01 con denominazione "Programma di interventi finalizzati alla prevenzione e riduzione della vulnerabilità degli edifici scolastici" dello stato di previsione della spesa del M.I.T..

La spesa progettuale è stata imputata al bilancio 2014, capitolo 30594, impegno 1033, correlato al finanziamento statale ed al capitolo di entrata 40263, bilancio 2014, accert. 64.

Con determinazione dirigenziale n. 62/17 del 10.02.2015 è stato incaricato, nel rispetto dei principi di cui alla vigente normativa in materia di LL.PP., l'arch. Ignazio Zagaria (CIG Z45130B224), tecnico esterno alla struttura comunale, per la progettazione esecutiva, sicurezza in fase di progettazione, direzione, coordinamento della sicurezza in fase d'esecuzione, misura e contabilità dei lavori in argomento.

In data 09.03.2015 è stato sottoscritto con l'arch. Ignazio Zagaria apposito disciplinare-convenzione d'incarico.

Il progetto, redatto dal suddetto professionista ed acquisito agli atti dell'Ente in data 01/04/2015, è stato sottoposto, come da "Convenzione", all'esame del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche - sede coordinata di Bari.

Con nota pec n.4802 del 18.5.2015 lo stesso Provveditorato, pur accertando che il progetto, compatibilmente con il finanziamento disponibile considerava gli interventi più urgenti ed indicati nel giudizio sintetico di cui alla scheda tecnica di rilevamento del 02.07.2009, ha mosso delle osservazioni fra cui la necessità della relazione di calcolo della capriata posta al secondo piano della scuola stessa, visto che il progetto ne prevede la sostituzione, nonché l'acquisizione del preventivo parere ai sensi dell'art.21 del D.Lgs 42/2004 da parte della Soprintendenza, data la valenza storica artistica dell'immobile di età superiore a 50 anni.

Con determinazione dirigenziale n.570/4 del 24/08/2015 è stato incaricato l'ing.Nicola Rizzo della progettazione esecutiva della capriata in legno posta al secondo piano della scuola elementare "Carducci" (CIG:Z0B1558567). In data 26.08.2015 è stato sottoscritto apposito disciplinare di incarico. Il Professionista, ad espletamento dell'incarico, in data 1.10.2015 ha trasmesso il relativo progetto.

Il progetto rielaborato dall'arch.Ignazio Zagaria in relazione alle integrazioni richieste dal Provveditorato, è stato inviato per l'acquisizione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 42/2004 alla competente Soprintendenza SBAP per le province di Bari, BAT, Foggia, la quale con nota 7091 del 13.11.2015, acquisita al prot.n.30289 del 17/11/2015, ha autorizzato l'esecuzione delle opere con prescrizioni.

Il progetto esecutivo, adeguato nei termini di cui alle prescrizioni del Provveditorato e Soprintendenza, è stato approvato dalla Giunta Comunale con delibera n.369 del 30.12.2015 e sottoposto al definitivo parere da parte del Provveditorato, in osservanza all'art.3, comma 1, della citata "Convenzione".

In data 17.02.2016 è stato acquisito al prot.n.4827 il parere favorevole rilasciato con voto n.20 dell'11.02.2016 dal Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise la Puglia e la Basilicata - sede coordinata di Bari.

In relazione al suddetto parere e ad alcune precisazioni esposte dal CTA è stato rimodulato il quadro economico di spesa secondo le risultanze di cui in seguito.

Con determina della CUC del Tavoliere n. 09 del 07/04/2016, preso atto della determinazione dirigenziale n.258/12 del 06/04/2016 si è proceduto all'indizione della gara di appalto dei lavori, da espletarsi attraverso la procedura negoziata di cui all'art.57, comma 6 del D.Lgs.163/2006,. La lettera di invito prot.n.25 del 07/04/2016 è stata inviata alle Ditte via pec in pari data.

Con determinazione dirigenziale n.561/67 del 14/07/2016, riscontrata la regolarità della procedura seguita nell'esperimento di gara e preso atto del verbale della Commissione del 27/04/2016, si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori a favore

della ditta Cadinvest srl (codice fiscale e partita IVA: 01934460716), con sede in Cerignola alla Via Sestriere n.2, per il prezzo di € 132.677,12 al netto del ribasso offerto del 22,488% sulla base d'asta di € 171.169,78, oltre a € 10.334,31 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, e per un totale complessivo di contratto pari a € 143.011,43, oltre iva come dovuta.

In relazione al risultato di gara, con la citata determinazione n.561/67 del 14/07/2016 è stato rideterminato il quadro economico, secondo le risultanze nella stessa riportate.

Con la citata aggiudicataria è stato stipulato il relativo contratto di appalto repertorio n.184 del 12/10/2016, sottoscritto in modalità digitale e registrato a Cerignola in data 12/10/2016 col n.2672 Serie 1T.

In data 18/10/2016 è stato dato avvio ai lavori, così come certificato con verbale di consegna emesso dal D.L.in pari data.

Successivamente alla consegna dei lavori, il RUP ing. Clorindo Izzillo ha informato il Direttore dei lavori della esistenza di un'indagine diagnostica sugli elementi strutturali e non strutturali dei solai dell'edificio scolastico in argomento - effettuata nell'ambito della Legge 13/07/2015 n.107 e successivo decreto del MIUR n.933 del 10/12/2015 allo scopo di garantire la sicurezza degli edifici scolastici e prevenire eventi di crollo dei relativi solai e controsoffitti - le cui risultanze sono state documentate con elaborati progettuali acquisiti in data 12.09.2016 ed approvati con determinazione dirigenziale n.848/146 del 21/10/2016 (successivi alla redazione del progetto esecutivo appaltato ed anche alla definitiva aggiudicazione dei lavori).

Gli esiti delle indagini effettuate dal tecnico esterno a ciò incaricato, ing. Michele Tufariello, hanno evidenziato delle criticità strutturali e non, di tutta la scuola Carducci, che - come da valutazioni conclusive dello stesso tecnico- *"hanno alla radice il problema della tipologia costruttiva dei solai utilizzati, particolarmente vulnerabili alle infiltrazioni, poco rigidi, eccessivamente sensibili alle sollecitazioni che inducono vibrazioni e poco adattabili alle attuali esigenze impiantistiche"*; dal che la conseguente necessità (suggerita dallo stesso tecnico) di operare interventi di consolidamento strutturale dei solai e, successivamente, nuovi interventi non strutturali (controsoffitti e impianto di illuminazione) più adeguati, atti a migliorare le condizioni di sicurezza dell'edificio stesso.

Nella notte del 25/10/2016, presso la sede del plesso scolastico "Giosuè Carducci" è avvenuto il distacco di una parte del solaio, con pignatte a vista, all'interno del bagno alunni posto al piano terra, provocando il cedimento della controsoffittatura sottostante.

A seguito del suddetto evento e tenuto conto delle risultanze delle indagini, con Ordinanza Sindacale n.92/2016 del 25/10/2016 è

stata disposta la sospensione delle attività didattiche ed amministrative del plesso "G. Carducci" e, con successiva O.S. n.98 del 02/11/2016, la chiusura dell'intera struttura scolastica.

In data 27/10/2017, in relazione a quanto sopra, è stata effettuata la sospensione dei lavori.

Il RUP, ricorrendo i presupposti di legge per le varianti in corso d'opera (art.132 del D.Lgs.163/2006, comma 1 lett.b)), ha autorizzato il direttore dei lavori, arch. Ignazio Zagaria, alla redazione di opportuna perizia di variante e suppletiva volta alla risoluzione delle emerse nuove contingenze e criticità, imprevedute ed imprevedibili nella fase progettuale.

Con determinazione dirigenziale n.1406/169 del 14/11/2017 si è proceduto ad approvare la variante redatta Direttore dei lavori ed acquisita al prot.n.31099 in data 23/10/2017.

L'importo per lavori è stato rideterminato in € 148.786,07 al netto del ribasso d'asta del 22,488% (applicato sull'importo computato di € 191.952,31), mentre gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso in € 16.163,36 stabilendo, pertanto, in € 164.949,43 il nuovo importo contrattuale, con un incremento del 15,34% pari ad € 21.938,00 (€ 16.108,95 per lavori ed € 6.829,05 per o.s.), oltre relativa IVA al 22%, che ha trovato copertura con la utilizzazione delle voce "imprevisti".

Il termine per la esecuzione dei lavori, fissato dall'art.18 del Capitolato Speciale d'Appalto e dall'art.3 del contratto di appalto in 186 giorni consecutivi decorrenti dalla consegna dei lavori, per effetto dei maggiori/diversi lavori di cui alla variante in argomento, è stato prorogato di 30 giorni.

Con la citata D.D. n.1406/169 del 14/11/2017 si è altresì proceduto ad impegnare la spesa per compensi professionali riconosciuti all'arch. Ignazio Zagaria per la redazione della perizia di variante e suppletiva, nonché verifica delle strutture dell'intervento locale di consolidamento dei solai di copertura, prevista nella stessa variante.

Il quadro economico di perizia ha confermato la spesa progettuale in € 257.130,00, come di seguito definita, finanziata con contributo ministeriale, correlato al capitolo di entrata 40263, bilancio 2014, accert.64 ed imputata al capitolo 30594, bil.2014, impegno 1033 cod.bilancio 4.02-2.02.01.09.003:

LAVORI	Come da Precisazioni CTA	Post gara d'appalto	Perizia di variante e suppletiva
importo dei lavori/ lavori al netto del ribasso del 22,488% -	171.169,78	132.677,12	148.786,07
Oneri di sicurezza	10.334,31	10.334,31	16.163,36
TOTALE LAVORI	181.504,09	143.011,43	164.949,43
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Iva sui Lavori (22%)	39.930,90	31.462,52	36.288,87
Spese di natura strumentale ex art.92, comma 7 bis, D.Lgs 163/2006	726,02	726,02	726,02
Imprevisti (comprensivi di IVA)	9.786,56	56.747,60	
Contributo Anac	225,00	225,00	225,00

Progettazione definitiva,esecutiva, coordinamento sicurezza in fase progettazione, direzione lavori,coordinamento sicurezza in fase esecutiva, certificato regolare esecuzione - redazione variante	15.368,85	15.368,85	30.000,00
Calcolo strutturale e deposito presso la struttura territoriale competente	4.301,26	4.301,26	13.301,29
CNPAIA AL 4%	786,80	786,80	1.732,05
Iva AL 22% su spese tecniche e cnpaia 4%	4.500,52	4.500,52	9.907,34
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	75.625,91	114.118,57	92.180,57
TOTALE QUADRO ECONOMICO	257.130,00	257.130,00	257.130,00

In relazione all'intervento di consolidamento del solaio del secondo piano, previsto in variante, il Direttore dei lavori ha predisposto il relativo progetto strutturale sul quale è stata ottenuta l'autorizzazione sismica registrata in data 25/11/2017 con cod.pratica 2017/01377/SIS da parte del preposto Ufficio Edilizia sismica della Provincia di Foggia ed acquisita agli atti di questo Ente in data 05/12/2017 al prot.n.35678.

Sulla perizia di variante sono stati acquisiti i pareri della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di BAT e Foggia, giusta autorizzazione prot.n.419 del 18/01/2018, e dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise la Puglia e la Basilicata - sede coordinata di Bari, giusta nota prot.8487 del 20.09.2018 di comunicazione del parere favorevole rilasciato con voto n.69 dell'11.07.2018 dal Comitato Tecnico Amministrativo dello stesso Provveditorato.

Tra la citata aggiudicataria e l'Amministrazione in relazione all'intervenuta perizi di variante e suppletiva è stato stipulato il relativo atto aggiuntivo, repertorio n.208 del 07/02/2019, sottoscritto in modalità digitale e registrato a Cerignola.

L'arch.Ignazio Zagaria, in qualità di progettista,direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza, in data 16/07/2019 ha emesso il certificato di ultimazione dei lavori, acquisito al prot.16134 del 18/7/2019, che attesta l'avvenuta ultimazione degli stessi in data 12/07/2019, nei termini contrattuali.

Lo stesso professionista con nota, acquisita in data 07/10/2019 al prot.n.21967, ha trasmesso gli atti di contabilità finale, lo stato finale, la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare esecuzione dei lavori (con valenza di collaudo), relazione tecnico-scientifica (art.250 DPR 207/2010).

Il professionista, ritenendo si aver regolarmente espletate le proprie funzioni, ha emesso fattura n.3/E del 28/10/2019, sdi 1846666685, acquisita nel sistema Unimatica al protocollo n.20191028E1ZZNWNW00427aa del 28/10/2019, dell'importo di € 16.001,00, oltre contributo cnpaia 4% pari ad € 640,04, non soggetta ad iva in quanto prestazione effettuata in regime forfettario (operazione effettuata ai sensi dell'art.1, commi da 54 a 89 della L.190/2014) e di complessivi € 16.641,04, a titolo di saldo degli onorari dovuti per la prestazione di progettazione, coordinamento sicurezza, progettazione della variante, direzione,

misura e contabilità dei lavori, come da DD.n.62/17 del 10/2/2015 e DD.n.1406/169 del 14/11/2017.

Verificata la regolarità contributiva del professionista nei confronti dell'inarcassa ed acquisita la dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art.3 comma 7 della L.136/2010.

Dato atto che la relativa spesa di € 16.641,04, contributo cnpaia compreso, trova capienza alle corrispondenti voci di quadro economico dell'opera ed al finanziamento ottenuto per la realizzazione dell'opera, ed imputazione sul capitolo 30594 codice 4.02-2.02.01.09.003 - a valere quanto ad € 10.888,80 sull'impegno n.1033-2014, sub 2, RE 2017 e ad € 5.752,24 sull'impegno n.1033-2014, sub 1, RE 2014.

Si ritiene di procedere al riconoscimento e liquidazione a favore del professionista del credito liquidabile in detti complessivi € 16.641,04.

All'intervento è stato attribuito il CUP: J36E12000660001; ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex Art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12 novembre 2010, n.187 convertito con modificazioni nella legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", all'attività inerente l'affidamento dei lavori è stato attribuito il CIG: 6649669872, mentre a quella relativa alla prestazione professionale di progettazione, coordinamento della sicurezza, D.L., misure e contabilità dei lavori di cui alla liquidazione in argomento il CIG: Z45130B224.»

Visti gli adempimenti ex artt. 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, è disposta la pubblicazione del presente atto, nella sezione del link "Amministrazione trasparente", sotto sezione "bandi di gara e contratti";

Vista la vigente normativa in materia di lavori pubblici;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.203 del 26/07/2019 di adozione del Piano Economico di Gestione (PEG) per il triennio 2019-2021.

Visto l'Allegato n.4/2 al D.Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" il quale prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Vista la D.G.C. n. 246 del 04.10.2019 di approvazione della Architettura Organizzativa di questo Ente;

Visto il decreto del Commissario del 15/10/2019, prot. n. 22748 con il quale si conferisce al dott. Giovanni Buchicchio la Dirigenza del Settore Servizi Gestionali e Finanziari di questo Comune, comprendente i Servizi Ragioneria, Personale e Organizzazione, Tributi, Economato, Provveditorato, per giorni 44 con decorrenza dalla data del decreto stesso;

Visto il decreto del Commissario del 15/10/2019, prot. n. 22755 con il quale si conferisce all'ing. Michele Prencipe, la Dirigenza del Settore Servizi Tecnici: Lavori Pubblici e Ambiente, comprendente i Servizi Lavori Pubblici, Ambiente, Verde Pubblico, Manutenzione e Zona Industriale (PAP).

D E T E R M I N A

1) la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di liquidare a favore dell'arch. Ignazio Zagaria la somma di € 16.001,00, oltre contributo cnpaia 4% pari ad € 640,04 e di complessivi € 16.641,04, a titolo di saldo onorari per la progettazione, redazione variante, direzione, coordinamento della sicurezza, emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori per la "Messa in sicurezza e prevenzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, della scuola elementare G. Carducci" CUP: J36E12000660001 - CIG:Z45130B224, come da relativa fattura dallo stesso professionista esibita n.3/E del 28/10/2019, sdi 1846666685, acquisita nel sistema Unimatica al protocollo n.20191028E1ZZNWNW00427aa del 28/10/2019, per il corrispondente importo di € 16.641,04, contributo cnpaia compreso (in franchigia IVA in quanto prestazione effettuata in regime forfettario);

3) di dare atto che la relativa spesa trova imputazione sul capitolo 30594 codice 4.02-2.02.01.09.003 - a valere quanto ad € 10.888,80 sull'impegno n.1033-2014, sub 2, RE 2017 e ad € 5.752,24 sull'impegno n.1033-2014, sub 1, RE 2014, correlato al capitolo in entrata 40263, bilancio 2014 cod. 4.03.10.01.001, accert. 64, ed al finanziamento Ministeriale assegnato per la realizzazione dell'opera;

4) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza

1
-
finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2019, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

5) di liquidare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 16.641,04 al suddetto capitolo ed impegni, imputandola al bilancio 2019;

6) di dare opportuna comunicazione del presente atto MIT nonché alla competente Struttura del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise la Puglia e la Basilicata - sede coordinata di Bari, nei termini di cui alla citata "Convenzione", ai fini della rendicontazione delle spese.

IL Dirigente DEL SETTORE

Prencipe Arch. Michele

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell'art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000

attesta

la copertura finanziaria.

La spesa complessiva di € 16.641,04 (CIG. Z45130B224) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Delibera CIPE n.6 del 20.01.2012 -Programma straord n. 1615 del 15-11-2019 CIG Z45130B224	
Su Impegno N° 2 sub n° 2 del 09-11-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 1406 D.D. Reg. Gen. N. del 14-11-2017 avente per oggetto Delibera CIPE n.6/2012 - Programma straordinario stralcio interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, prevenzione e riduzione rischio connesso alla vulnerabilità elementi anche non strutturali Scuola elementare	
Missione Programma 5° livello 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	
Capitolo 30594 Articolo MESSA IN SIC. NON STRUTT. SC. ELEM. CARDUCCI - CONTR. STATALE	
Causale	Delibera CIPE n.6 del 20.01.2012 -Programma straordinario stralcio di interventi urgenti nel patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non st
Importo	€, 10.888,80
Beneficiario 466 ZAGARIA IGNAZIO	
Quietanza BANCA INTESA SAN PAOLO BONIFICO IT 16U0306978383100000004494 IBAN IT16U0306978383100000004494	
Delibera CIPE n.6 del 20.01.2012 -Programma straord n. 1616 del 15-11-2019 CIG Z45130B224	
Su Impegno N° 1 sub n° 1 del 06-02-2015 a Residuo 2014 approvato con Atto n. 62 SETTORE LL. PP. MANUT. del 10-02-2015 avente per oggetto "Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici - Secondo	
Missione Programma 5° livello 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	
Capitolo 30594 Articolo MESSA IN SIC. NON STRUTT. SC. ELEM. CARDUCCI - CONTR. STATALE	
Causale	Delibera CIPE n.6 del 20.01.2012 -Programma straordinario stralcio di interventi urgenti nel patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non st
Importo	€, 5.752,24
Beneficiario 466 ZAGARIA IGNAZIO	
Quietanza BANCA INTESA SAN PAOLO BONIFICO IT 16U0306978383100000004494 IBAN IT16U0306978383100000004494	

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal al , come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città,

IL Responsabile AA.GG
VALENTINO MARIA CONCETTA

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: ALB2532460
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: E1ZZNW
Telefono del trasmittente: 0499426171
E-mail del trasmittente: fattura@2csolution.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01886750718
Codice fiscale: ZGRGNZ62P23C514M
Nome: IGNAZIO
Cognome: ZAGARIA
Regime fiscale: RF19 (Regime forfettario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA PERUGIA
Numero civico: 6
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885411142
E-mail: ignazio.zagaria@alice.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola - SETTORE SERVIZI TECNICI LAVORI
PUBBLICI AMBIENTE

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426
Denominazione: Namirial SPA

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-10-28 (28 Ottobre 2019)
Numero documento: 3/E
Importo totale documento: 16641.04
Causale: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA PRIMARIA 'GIOSUE' CARDUCCI' IN VIA EGMONT N. 1 DA REALIZZARE ALL'INTERNO DELL'ABITATO DEL COMUNE DI CERIGNOLA(FG). SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE E C
Causale: OORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI IN OGGETTO DELL'APPROVAZIONE DELLA VARIANTE COME DA D.D. N. 62/17 DEL 10/02/2015 E N. 1406/169 DEL 14/11/2017 - QUARTO ED ULTIMO ACCONTO IMPEGNO SPESA 1033-2014
Causale: SUB 2 RE 2017 - CAPITOLO 30594 - CIG Z45130B224 - CUP J36E12000660001 E IMPEGNO SPESA 1033-2014 SUB 1 RE 2014 - CAPITOLO 30594 - CIG Z45130B224 - CUP J36E12000660001. OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENU

Causale: TA D'ACCONTO

Bollo

Bollo virtuale: SI

Importo bollo: 2.00

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: TC04 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)

Aliquota contributo cassa (%): 4.00

Importo contributo cassa: 640.04

Imponibile previdenziale: 16001.00

Aliquota IVA applicata: 0.00

Tipologia di non imponibilità del contributo: N2 (non soggette)

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 62/17

Data ordine di acquisto: 2015-02-10 (10 Febbraio 2015)

Codice Unitario Progetto (CUP): J36E12000660001

Codice Identificativo Gara (CIG): Z45130B224

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA PRIMARIA 'GIOSUE' CARDUCCI IN VIA EGMONT N. 1 DA REALIZZARE ALL'INTERNO DELL'ABITATO DEL COMUNE DI CERIGNOLA(FG). SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI IN OGGETTO DELL'APPROVAZIONE DELLA VARIANTE COME DA D.D. N. 62/17 DEL 10/02/2015 E N. 1406/169 DEL 14/11/2017 - QUARTO ED ULTIMO ACCONTO PROGETTAZIONE EDILIZIA .

Valore unitario: 16001.00

Valore totale: 16001.00

IVA (%): 0.00

Natura operazione: N2 (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00

Natura operazioni: N2 (non soggette)

Totale imponibile/importo: 16641.04

Totale imposta: 0.00

Riferimento normativo: REGIME FORFETTARIO (ART.1, C.54-89, L. 190/2014)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo) Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Importo: 16641.04

Codice IBAN: IT16U0306978383100000004494

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it
