



Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3819

del 20-11-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	30594	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 2 (04.02-2.02.01.09.003)	Gest.	RESIDUI/2016
MESSA IN SIC. NON STRUTT. SC. ELEM. CARDUCCI - CONTR. STATALE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Tecnici LL.PP. Ambiente		nr.	201 del 12-09-2019
numero 1376/2015 del 25-09-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Delibera CIPE n.6 del 20.01.2012 -Programma straordinario stralcio di interventi urgenti nel patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non st							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio	PREVISIONE ASSESTATA		241.511,95	242.463,00	
Programma	02	Altri ordini di istruzione	PRECEDENTI PAGAMENTI		101.039,34	101.039,34	
Titolo	2	Spese in conto capitale	PRESENTE IMPORTO		90.525,56	90.525,56	
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	TOTALE PAGATO		191.564,90	50.898,10	
3o Livello	01	Beni materiali	DISPONIBILITA' RESIDUA		49.947,05	50.898,10	
4o Livello	09	Beni immobili					
5o Livello	003	Fabbricati ad uso scolastico					
SIOPE	2020109003						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 4) CONTRIBUTI REGIONALI					Fruttifero	C.U.P. J36E12000660001
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 90.525,56 diconsì NOVANTAMILACINQUECENTOVENTICINQUE/56							
Per : Delibera CIPE n.6 del 20.01.2012 -Programma straordinario stralcio di interventi urgenti nel patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, a							

CREDITORE (Codice: 1298)				
CADINVEST S.R.L. P.Iva 01934460716		VIA SESTRIERE 2 71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:6649669872 ACCONTO Fatt.n. 38 del 27/08/2019 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ISTITUTO SCOLASTICO G.CARDUCCI VIA EGMONT N.1 DETERMINA N.561/67 DEL 14/7/16 CONTRATTO DAPPALTO REP 184 DEL 12/10/16 REG. IL 12/10/16 N.2672 SERIE 1T CAPITOL 30594 IMPEGNO 1033-2014 SU Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 74.201,28 *Ritenuta Netto da Pagare:	90.525,56 16.324,28 74.201,28	 74.201,28 16.324,28	2109
(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE		
MODALITA' DI PAGAMENTO	BDN BONIFICO IT 05F0306978383100000001381 - CIN:F - ABI:03069 - CAB:78383 - C/C:100000001381 IBAN:IT05F0306978383100000001381 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio

MANDATO: 381P - 3820



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 381P DEL 20/11/2019

REVERSALE N. 4848

COLLEGATO CON ALTRO MANDATO N. _____ DEL ____/____/____

CODICE BILANCIO:	04.02-2.02.01.09.003			
CAPITOLO	<u>30594</u>	ARTICOLO	<u>0</u>	BIL. RE 2016
IMPEGNO N.	Sub. 1032. 1	LIQUIDAZIONE N.	<u>1376</u>	DEL <u>25/09/2019</u>
IMPORTO LIQUIDAZIONE:	€	<u>90.525,56</u>		
CIG DETERM.	<u>6649669872</u> (10)	CUP DET.	<u>03681200060001</u>	(15)
DOCUMENTI:	Delibera N.			del
	Determ. N.			del
Determ. generale di liquidazione N.		<u>929 /201</u>		del <u>25/09/2019</u>
SETTORE:	<u>Liq. LL.PP - Amb.</u>	IMPONIBILE €		€ <u>74.201,28</u>
NUM.DET.	<u>201</u> DEL	12/09/2019 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)		
DETER.IMPORTO	€ <u>113.724,94</u>	N.TOTALE LIQ.	<u>2</u>	RITENUTA € <u>16.324,28</u>
201Liq. LL.PP - Amb.43720		N.LIQUIDAZ.ATTO	<u>2</u>	(IVA TRATTENUTA) 22%
		TOTALE €		€ <u>90.525,56</u>
		(IMPONIBILE + RITENUTA)		

CREDITORE: Codice N.

(1298)

CADINVEST S.R.L.

PARTIVA IVA (11): IT 01934460716

VIA SESTRIERE 2

CODICE FISCALE (16):

CERIGNOLA FG

(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI _ / _ NO _)

PARTIVA IVA (11): IT _____

CODICE FISCALE (16): _____

() FATTURA N. _____ DEL ____/____/____

PROT. ENTRATA N. _____ DEL ____/____/____ STAMPATA SI / NO SDI N. _____

IMPORTO. FATT. € 113.724,94 IMPON. € 93.217,16 IVA € 20.507,78

FATTURA UNICA SI NO

22%

CIG FATT. _____ (10) CUP FATT. _____ (15)

SALDO FATTURA SI / NO ACCONTO

ACCONTO FATTURA SI / NO PER €

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDETERMINATEMENTE SI / NO

SCISSIONE SI / NO (SPESE ESENTI/ESCLUSE SI / NO) (BOLLO SI / NO)

EQUITALIA SI / NO DEL ____/____/____ (A) DICHIARAZIONE DEL /DURC SCADENZA ____/____/____ (A)

TRACCIABILITA' SI / NO (A) (A)=ALLEGATA IN PROCEDURA ALLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

IBAN: IT05(2)P(L)6306P(5)78383(5)1381 (12)

COMMISSIONI BANCARIE SI / NO BANCA _____

DESCRIZIONE :

Delibera CIPE n.6 del 20.01.2012 -Programma straordinario stralcio di interventi urgenti nel patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non st

SIOPE: 410P 5^ LIVELLO _____



COMUNE DI CERIGNOLA

Settore Servizi Tecnici Lavori Pubblici, Ambiente

Prot. n° 24256

Cerignola, 4 NOV. 2019

OGGETTO: Delibera CIPE n.6 del 20.01.2012 pubblicata sulla GURI n.88 del 14.4.2012 – secondo stralcio – Regione Puglia - Programma straordinario stralcio di interventi urgenti nel patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, dell'edificio Scolastico "G.Carducci" - CUP: J36E1200060001 - Contratto di appalto Rep. n.184 del 12/10/2016, registrato in pari data col n.2672 S 1T - Ditta Cadinvest Srl - Liquidazione corrispettivo 2° SAL - CIG 6649669872.

Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio
SEDE

Invito la SV. a voler disporre il pagamento a favore dell'impresa Cadinvest Srl, a titolo di corrispettivo dei lavori di messa in sicurezza dell'edificio scolastico G.Carducci eseguiti e contabilizzati al 2° SAL, dell'importo di € 93.217,16 oltre iva al 22% pari ad € 20.507,78, e per complessivi € 113.724,94 a saldo della fattura n.38 del 27/08/2019, sdi 148111624, acquisita nel Sistema Unimatica al protocollo n.20190827E1ZZNW00315 del 27/08/2019, del corrispondente importo di complessivi € 113.724,94, giusto quanto disposto con Atto di Liquidazione n. 929/201 del 25.09.2019.

Il suddetto importo dovrà essere corrisposto mediante bonifico da effettuarsi sul conto corrente bancario opportunamente comunicato dalla stessa impresa, giusta comunicazione in atti, ai fini della tracciabilità dei movimenti finanziari in questione (art.3, comma 7 della L.136/2010). Il relativo mandato di pagamento dovrà essere emesso in duplice esemplare, ai fini della rendicontazione delle spese al MIT – attraverso il Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche, sede coordinata di Bari, Ente finanziatore dell'opera.

La spesa di € 113.724,94, trova imputazione sul capitolo 30594 codice 4.02-2.02.01.09.003 – a valere per € 90.525,56 sull'impegno n.1032_2015, sub 1 RE 2016, liquidazione n. 1376 del 25/09/2019 e per € 23.199,38 sull'impegno n.1033-2014, sub 1 RE 2017, liquidazione n. 1377 del 25/09/2019 (a valere sull'accredito di € 115.708,00 dalla stessa Regione effettuata a titolo di seconda erogazione in conto contributo – cap. E.40263 c.bil.4.03.10.01.001 accert.64).

IL DIRIGENTE DI SETTORE
arch. Michele Principe

Si Allega:

- * fattura elettronica esibita dall'appaltatrice;
- * DURC;
- * dichiarazione tracciabilità.

J36E12000

01P34460716

FATTURA ELETTRONICA

Versione
FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT10209790152**
Progressivo di invio: **796**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **E1ZZNW**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01934460716**
Codice fiscale: **01934460716**
Denominazione: **CADINVEST S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA SESTRIERE**
Numero civico: **2**
CAP: **71042**
Comune: **Cerignola**
Provincia: **FG**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **FG**
Numero di iscrizione: **0157699**
Capitale sociale: **118500.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0885422125**
E-mail: **info@cadinvest.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00362170714**

Codice Fiscale: **00362170714**

Denominazione: **COMUNE DI CERIGNOLA**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA DELLA REPUBBLICA**

Numero civico: **2**

CAP: **71042**

Comune: **Cerignola**

Provincia: **FG**

Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione
FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)

Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2019-08-27** (27 Agosto 2019)

Numero documento: **38**

Importo totale documento: **113724.94**

Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ISTITUTO
SCOLASTICO G.CARDUCCI VIA EGMONT N.1 DETERMINA N.561/67
DEL 14/7/16 CONTRATTO D'APPALTO REP 184 DEL 12/10/16 REG. IL
12/10/16 N.2672 SERIE 1T CAPITOLO 30594 IMPEGNO 1033-2014 SUB
1 RE 2017 IMPEGNO 1032-2015 SUB 1 RE 2016 CUP J36E12000660001**

CIG 6649669872 - 2° SAL.

Valore unitario: **93217.16**

Valore totale: **93217.16**

IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **93217.16**
Totale imposta: **20507.78**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-08-27** (27 Agosto 2019)
Importo: **93217.16**
Istituto finanziario: **INTESA SANPAOLO SPA**
Codice IBAN: **IT05F0306978383100000001381**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Fattura_38-2019.pdf**
Formato: **PDF**
Descrizione: **Fattura_38-2019.pdf**

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_17764431	Data richiesta	25/10/2019	Scadenza validità	22/02/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CADINVEST - S.R.L.
Codice fiscale	01934460716
Sede legale	VIA SESTRIERE 2 CERIGNOLA FG 71042

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



SISTEMA GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2008

SINISERT

Cadinvest S.r.l.

Via Sestriere n°2 - 71042 Cerignola (Fg)

Iscr. Registro Imprese C.C.I.A.A. di Foggia n. 01934460716

Capitale sociale sottoscritto e i.v.: € 118.500,00

CITTÀ DI CERIGNOLA - ADO C_0514

PROT. ARRIVO - REGISTRO PROTOCOLLO GENERALE

28-12-2018 - 0039083

Categoria 6 - Classe 4



Spett.le **COMUNE DI CERIGNOLA**
Settore Lavori Pubblici, Manutenzione

OGGETTO: Comunicazione di attivazione o utilizzo di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010.

In relazione all'appalto dei lavori avente per oggetto "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'ISTITUTO SCOLASTICO "G. CARDUCCI" IN VIA EGMONT N.1 NELL'ABITATO DEL COMUNE DI CERIGNOLA (FG)", affidati da codesto Ente, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n.136/2010,

SI COMUNICA

la precedente sussistenza di un conto corrente dedicato utilizzato per la gestione dei movimenti finanziari relativi agli appalti pubblici, essendo destinato a tale funzione, presso il Banco di Napoli - Filiale di Cerignola con i seguenti dati identificativi del conto corrente:


- codice IBAN IT05 F030 6978 3831 0000 0001 381.

Intestatario del conto è la sottoscritta Società e il soggetto delegato ad operare sullo stesso è:

- ing. Donato Calice, nato il 02/01/1949 a Cerignola ed ivi residente in Via M. SS. Ausiliatrice n. 163, C.F.: CLC DNT 49A02 CS14I;

SI SEGNALE

che anche per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con il vostro Ente ci si avvarrà - fatte salve le eventuali modifiche successive, debitamente comunicate, - del medesimo conto corrente dedicato, senza necessità di formulare apposite comunicazioni per ciascuna commessa.



Il Legale Rappresentante



CADINVEST S.r.l.
L'AMMINISTRATORE UNICO
Ing. Donato Calice

Tel +390885422125
Fax +390885422125

e-mail: info@cadinvest.it
PEC: cadinvest@arubapec.it

P.IVA 01934460716

CITTÀ DI CERIGNOLA PROT. N. 39083 DEL 28-12-2018 IN ARRIVO

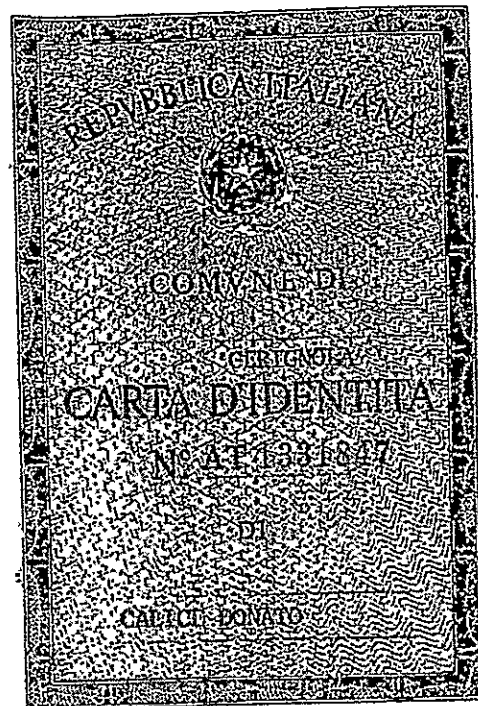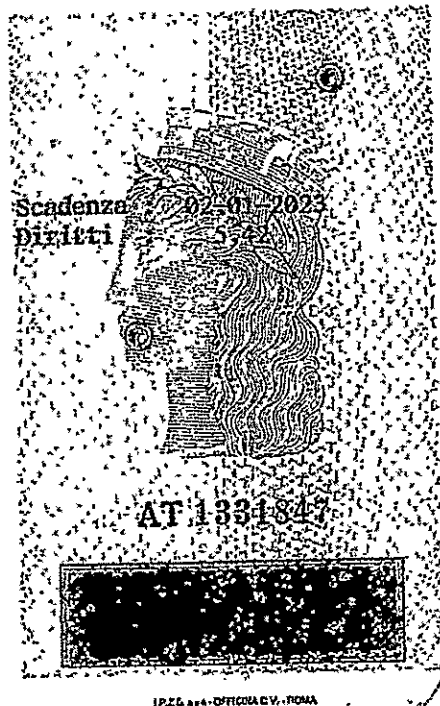

Cognome **CALICE**
Nome **DONATO**
nato il **02-01-1949**
(alla n. **36** P. **1** S. **A 1949**)
a. **CERIGNOLA (FG)**
Cittadinanza **Italiana**
Residenza **CERIGNOLA (FG)**
Via **LE MARIA S.S. AUSILIATRICE 163**
Stato civile **CONIUGATO**
Professione **OMESSA L. 127/97 ART. 2**
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura **180**
Capelli **Castani**
Occhi **Verdi**
Segni particolari **NESSUNO**

Firma del titolare **CERIGNOLA** il **09-07-2012**
Impronta del dito indice sinist. **IL SINDACO L'Ufficiale Anagrafe DEL MUNICIPIO SINISGALLA**



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 929

In data 25-09-2019

Atto Reg. Sett. N. 201

In data 12-09-2019

OGGETTO: Delibera CIPE n.6 del 20.01.2012 -Programma straordinario stralcio di interventi urgenti nel patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, dell'edificio Scolastico "G.Carducci" - Presa d'atto e liquidazione 2° stato di avanzamento lavori.

L'anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di settembre, in Cerignola, nella residenza comunale

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI TECNICI LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

LAVORI PUBBLICI

Prencipe Arch. Michele, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

«Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata - sede coordinata di Bari, al fine di prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità di elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici, ha disposto apposito sopralluogo presso l'edificio sede della scuola elementare G. Carducci, effettuato da proprio Tecnico rilevatore in data 02.07.2009, durante il quale sono state riscontrate problematiche riportate nella predisposta scheda di rilevamento.

Con delibera C.I.P.E. n.6 del 20.01.2012 pubblicata sulla G.U.R.I. n.88 del 14.04.2012, è stata disposta l'assegnazione di risorse per la realizzazione del "Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici - Secondo Stralcio".

Il M.I.T. Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche di Bari, con nota prot.0007493 del 04/07/2012 acquisita al protocollo generale n.16014 del 06.07.2012, ha trasmesso lo schema di convenzione relativo al Programma di cui sopra, nell'ambito del quale è compreso l'intervento finalizzato alla messa in sicurezza dell'edificio scolastico "G. Carducci".

In data 29/10/2012, presso il competente Ufficio del Provveditorato, si è proceduto, tra l'altro, alla sottoscrizione della "Convenzione" inerente l'intervento in argomento.

Con nota Ministeriale prot. n.7211 del 06/05/2014, acquisita al prot.n.11362 del 15/05/2014, la Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali - Div.1^a, ha trasmesso la Convenzione regolante i rapporti fra Stato ed Ente attuatore n.19368 del 21.11.2013, comunicando che l'Ufficio Centrale di Bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, avendo ottenuto la registrazione da parte della Corte dei Conti al reg.1 foglio 714 del 7/02/2014, ha visto col n. 176 del 9.1.2014 il Decreto prot.n.19825 del 26.11.2013 di approvazione della stessa Convenzione relativa all'intervento n.006612PUG134 finalizzato alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali nell'edificio scolastico "G. Carducci" in via Egmont 1 - CUP: J36E12000660001.

Con il medesimo Decreto è stato altresì assunto a favore del Comune di Cerignola l'impegno dell'importo complessivo di € 257.130,00 a valere sul Cap.7384 PG.01 con denominazione "Programma di interventi finalizzati alla prevenzione e riduzione della vulnerabilità degli edifici scolastici" dello stato di previsione della spesa del M.I.T..

Non potendo l'Ufficio Tecnico di questo Comune provvedere alla progettazione esecutiva, Piano sicurezza in fase di progettazione, direzione, coordinamento della sicurezza in fase d'esecuzione, alla misura e contabilità dei lavori, data la ormai accertata e più volte carenza di personale, e preso atto della dichiarata indisponibilità all'espletamento delle stesse prestazioni da parte

di personale del Provveditorato, giusta nota acquisita al prot.n.21188 del 23.9.2014, con determinazione dirigenziale n. 62/17 del 10.02.2015 è stato incaricato l'arch. Ignazio Zagaria (CIG Z45130B224), tecnico esterno alla struttura comunale, in possesso dei requisiti per poter espletare l'incarico in argomento, nel rispetto dei principi di cui alla vigente normativa in materia di LL.PP.

In data 09.03.2015 è stato sottoscritto con l'arch. Ignazio Zagaria apposito disciplinare-convenzione d'incarico.

Il citato professionista, ad espletamento delle sue funzioni, ha trasmesso in data 01.4.2015 il progetto di manutenzione straordinaria finalizzato alla messa in sicurezza dell'edificio scolastico G. Carducci, il quale è stato sottoposto come da "Convenzione" all'esame del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche -sede coordinata di Bari.

Con nota pec n.4802 del 18.5.2015 lo stesso Provveditorato, pur accertando che il progetto, compatibilmente con il finanziamento disponibile comprende gli interventi rilevati più urgenti ed indicati nel giudizio sintetico di cui alla scheda tecnica di rilevamento del 02.07.2009, ha mosso delle osservazioni fra cui la necessità della relazione di calcolo della capriata posta al secondo piano della scuola stessa, visto che il progetto ne prevede la sostituzione, nonché l'acquisizione del preventivo parere ai sensi dell'art.21 del D.Lgs 42/2004 da parte della Soprintendenza, data la valenza storica artistica dell'immobile di età superiore a 50 anni.

Con determinazione dirigenziale n.570/4 del 24/08/2015 è stato incaricato l'ing.Nicola Rizzo della progettazione esecutiva della capriata in legno posta al secondo piano della scuola elementare "Carducci" (CIG:Z0B1558567). In data 26.08.2015 è stato sottoscritto apposito disciplinare di incarico. Il Professionista, ad espletamento dell'incarico, in data 1.10.2015 ha trasmesso il relativo progetto.

Il progetto rielaborato dall'arch.Ignazio Zagaria in relazione alle integrazioni richieste dal Provveditorato, è stato inviato per l'acquisizione dell'autorizzazione ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 42/2004 alla competente Soprintendenza alle Belle Arti e Paesaggio per le province di Bari, B-A-T e Foggia, con sede in Bari, la quale con nota 7091 del 13.11.2015, acquisita al prot.n.30289 del 17/11/2015, ha autorizzato l'esecuzione delle opere con prescrizioni.

Con delibera n.369 del 30.12.2015 la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo, adeguato nei termini di cui alle prescrizioni del Provveditorato ed al parere della Soprintendenza, il quale è stato sottoposto all'acquisizione del prescritto definitivo parere del Provveditorato, in osservanza dell'art.3, comma 1, della citata "Convenzione".

In data 17.02.2016 è stato acquisito al prot.n.4827 il parere favorevole rilasciato con voto n.20 dell'11.02.2016 dal Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato Interregionale.

In relazione al suddetto parere e ad alcune precisazioni esposte dal CTA è stato rimodulato il quadro economico di spesa.

Con determina della CUC del Tavoliere n. 09 del 07/04/2016, preso atto della determinazione dirigenziale n.258/12 del 06/04/2016 con la quale per l'espletamento della gara di appalto dei lavori è stata individuata la procedura negoziata di cui all'art.57, comma6 del D.Lgs. 163/2006, si è proceduto all'indizione della gara. La lettera di invito prot.n.25 del 07/04/2016 è stata inviata alla Ditte via pec in pari data.

Con determinazione della Centrale Unica di Committenza CUC, n. 15 del 26/04/2016 è stata costituita la Commissione di gara composta dal Dirigente ing. Clorindo Izzillo, Presidente e dai componenti Dott.ssa Maria Valentino e dott.ssa Maria Dettori.

Con determinazione dirigenziale del Settore Lavori Pubblici n.561/67 del 14/07/2016, riscontrata la regolarità della procedura seguita nell'esperimento di gara e preso atto del verbale della Commissione del 27/04/2016, si è proceduto all'aggiudicazione definitiva a favore della ditta Cadinvest srl (codice fiscale e partita IVA: 01934460716), con sede in Cerignola alla Via Sestriere n.2, per il prezzo di € 132.677,12 al netto del ribasso offerto del 22,488% sulla base d'asta di € 171.169,78, oltre a € 10.334,31 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, e per un totale complessivo di contratto per lavori pari a € 143.011,43, oltre iva come dovuta.

In relazione al risultato di gara, con la citata determinazione n.561/67 del 14/07/2016 è stato rideterminato il quadro economico, secondo le risultanze nella stessa riportate.

Tra la citata aggiudicataria e l'Amministrazione è stato stipulato il relativo contratto di appalto repertorio n.184 del 12/10/2016, sottoscritto in modalità digitale e registrato a Cerignola in data 12/10/2016 col n.2672 Serie 1T.

I lavori sono stati consegnati in data 18/10/2016, giusto verbale in atti, ed iniziati in pari data.

Successivamente alla consegna dei lavori, il RUP ing. Clorindo Izzillo ha informato il Direttore dei lavori della esistenza di un'indagine diagnostica sugli elementi strutturali e non strutturali dei solai dell'edificio scolastico in argomento - effettuata nell'ambito della Legge 13/07/2015 n.107 e successivo decreto del MIUR n.933 del 10/12/2015 allo scopo di garantire la sicurezza degli edifici scolastici e prevenire eventi di crollo dei relativi solai e controsoffitti - le cui risultanze sono state documentate con elaborati progettuali acquisiti in data 12.09.2016 ed approvati con determinazione dirigenziale n.848/146 del 21/10/2016 (successivi alla redazione del progetto esecutivo appaltato ed anche alla definitiva aggiudicazione dei lavori).

Gli esiti delle indagini effettuate dal tecnico esterno a ciò incaricato, ing. Michele Tufariello, hanno evidenziato delle criticità strutturali e non, di tutta la scuola Carducci, che - come da valutazioni conclusive dello stesso tecnico- *"hanno alla radice il problema della tipologia costruttiva dei solai utilizzati, particolarmente vulnerabili alle infiltrazioni, poco rigidi, eccessivamente sensibili alle sollecitazioni che inducono vibrazioni e poco adattabili alle attuali esigenze impiantistiche"*; dal ch  la conseguente necessit  (suggerita dallo stesso tecnico) di operare interventi di consolidamento strutturale dei solai e, successivamente, nuovi interventi non strutturali (controsoffitti e impianto di illuminazione) pi  adeguati, atti a migliorare le condizioni di sicurezza dell'edificio stesso.

Nella nottata del 25/10/2016, presso la sede del plesso scolastico "Giosu  Carducci"   avvenuto il distacco di una parte del solaio, con pignatte a vista, all'interno del bagno alunni posto al piano terra, provocando il cedimento della controsoffittatura sottostante.

A seguito del suddetto evento e tenuto conto delle risultanze delle indagini, con Ordinanza Sindacale n.92/2016 del 25/10/2016   stata disposta la sospensione delle attivit  didattiche ed amministrative del plesso "G.Carducci"; con successiva O.S.n.98 del 02/11/2016, la chiusura dell'intera struttura scolastica.

In data 27/10/2017, in relazione a quanto sopra,   stata effettuata la sospensione dei lavori.

Il RUP, ricorrendo i presupposti di legge per le varianti in corso d'opera (art.132 del D.Lgs.163/2006, comma 1 lett.b)), ha autorizzato il direttore dei lavori, arch. Ignazio Zagaria, alla redazione di opportuna perizia di variante e suppletiva volta alla risoluzione delle emerse nuove contingenze e criticit , imprevedute ed imprevedibili nella fase progettuale.

Il Direttore dei lavori ha redatto la variante, acquisita in data 23/10/2017 al prot.n.31099, la quale   stata approvata con determinazione dirigenziale n.1406/169 del 14/11/2017.

La stessa ha considerato lavorazioni diverse e maggiori rispetto a quelle inizialmente previste, compensate in parte con minori lavorazioni, che se pure necessarie sono passate in subordine rispetto ad altri interventi aventi carattere prioritario, ed in parte con la utilizzazione delle economie di gara (riportate nella voce "imprevisti"). Le diverse maggiori lavorazioni e/o apprestamenti, finalizzati al miglioramento in termini di sicurezza dell'opera, non hanno modificato la natura del contratto in argomento.

L'importo per lavori   stato rideterminato in € 148.786,07 al netto del ribasso d'asta del 22,488% (applicato sull'importo computato di € 191.952,31), mentre gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso in € 16.163,36 stabilendo, pertanto, in € 164.949,43 il nuovo importo

contrattuale, con un incremento del 15,34% pari ad € 21.938,00 (€ 16.108,95 per lavori ed € 6.829,05 per o.s.), oltre relativa IVA al 22%, che trova copertura con la parziale utilizzazione delle economie di gara (voce "imprevisti").

Il termine per la esecuzione dei lavori, fissato dall'art.18 del CSA e dall'art.3 del contratto di appalto in 186 giorni consecutivi decorrenti dalla consegna dei lavori, a seguito della variante, è stato prorogato di 30 giorni.

Il quadro economico di perizia ha confermato la spesa progettuale di € 257.130,00, come di seguito definita, finanziata con il contributo ministeriale ottenuto per la realizzazione dell'opera, correlato al capitolo di entrata 40263, bilancio 2014, accert. 64, e capitolo di uscita 30594, bil.2014, impegni 1032- 033 cod.bil.4.02-2.02.01.09.003:

LAVORI	Come da Precisazioni CTA	Post gara d'appalto	Perizia di variante e suppletiva
importo dei lavori/ lavori al netto del ribasso del 22,488%	171.169,78	132.677,12	148.786,07
Oneri di sicurezza	10.334,31	10.334,31	16.163,36
TOTALE LAVORI	181.504,09	143.011,43	164.949,43
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Iva sui Lavori (22%)	39.930,90	31.462,52	36.288,87
Spese di natura strumentale ex art.92, comma 7 bis, D.Lgs 163/2006	726,02	726,02	726,02
Imprevisti (comprensivi di IVA)	9.786,56	56.747,60	
Contributo Anac	225,00	225,00	225,00
Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase esecutiva, certificato regolare esecuzione - redazione variante	15.368,85	15.368,85	30.000,00
Calcolo strutturale e deposito presso la struttura territoriale competente	4.301,26	4.301,26	13.301,29
CNPAIA AL 4%	786,80	786,80	1.732,05
Iva AL 22% su spese tecniche e cnpaia 4%	4.500,52	4.500,52	9.907,34
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	75.625,91	114.118,57	92.180,57
TOTALE QUADRO ECONOMICO	257.130,00	257.130,00	257.130,00

Sulla perizia di variante sono stati acquisiti i pareri da parte della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di BAT e Foggia, giusta autorizzazione prot.n.419 del 18/01/2018, e dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise la Puglia e la Basilicata - sede coordinata di Bari, giusta nota prot.8487 del 20.09.2018 di comunicazione del parere favorevole rilasciato con voto n.69 dell'11.07.2018 dal Comitato Tecnico Amministrativo dello stesso Provveditorato.

In relazione all'intervento di consolidamento del solaio del secondo piano, previsto in variante, il Direttore dei lavori ha predisposto il relativo progetto strutturale sul quale è stata ottenuta l'autorizzazione sismica registrata in data 25/11/2017 cod.pratica 2017/01377/SIS da parte del preposto Ufficio Edilizia sismica della Provincia di Foggia ed acquisita agli atti in data 05/12/2017 al prot.n.35678.

Durante la demolizione dei solai delle tre aule poste al terzo piano dell'istituto è emerso che la quasi totalità delle putrelle portanti in acciaio e delle loro barre di collegamento, sono risultate completamente danneggiate da un processo di carbonatazione e che sono ricorse le premesse di cui ai commi 1-2 dell'art.163 per procedure in caso di somma urgenza.

In relazione, con deliberazione della Giunta Comunale n.14 del 18/01/2019, l'Amministrazione ha approvato gli elaborati tecnico-amministrativi predisposti dall'arch.Ignazio Zagaria, del progetto integrativo relativo agli interventi di sostituzione di tutte le armature (putrelle) che costituiscono l'orditura del solaio del terzo piano dell'edificio scolastico, demandando al Dirigente del Settore Servizi Tecnici Lavori Pubblici, ing. Clorindo Izzillo, in qualità anche di RUP, l'adozione di provvedimenti necessari all'attuazione dei lavori di somma urgenza.

Con determinazione dirigenziale n.83/12 dell'8/02/2019 questa Amministrazione ha proceduto ad affidare i suddetti lavori di cui al progetto integrativo -ricorrendo i presupposti di cui al comma 2 dell'art.36 del D.Lgs 50/2016 nonché l'art.1, comma 912, della legge 145 del 30/12/2018- alla stessa ditta Cadinvest Srl, già operante in loco e dichiaratasi immediatamente disponibile all'esecuzione degli stessi, per l'importo di netti € 60.233,85, comprensivo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre iva al 22%, e per complessivi € 73.485,30.

Per l'esecuzione degli stessi è stato concesso il termine di 60 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data dell'ordine di servizio n.1 del 13/02/2019, a cui sono stati aggiunti 10 gg di sospensione lavori per la necessità dell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni.

In data 04/04/2019 è stato emesso dal Direttore dei lavori il Certificato di regolare esecuzione dei suddetti interventi urgenti, del quale si è preso atto con Provvedimento dirigenziale n.345/81 del 19/04/2019.

Ciò stante, in data 18/07/2019 è stato acquisito al prot.16134 il certificato di ultimazione dei lavori appaltati, emesso dal Direttore dei lavori in data 16/07/2019, che attesta l'avvenuta ultimazione degli stessi in data 12/07/2019, in tempo utile rispetto ai termini contrattuali fissati -a seguito della variante e relativa proroga e delle intervenute sospensioni - a tutto il 12/07/2019.

L'arch. Ignazio Zagaria, in qualità di direttore dei lavori, con nota acquisita in data 26/07/2019 al prot.n.16872 ha trasmesso il 2° ed ultimo stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 15/07/2019 per il complessivo importo netto di € 164.618,07 comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 16.163,36, nonché il relativo certificato di pagamento n.2, sottoscritto dal RUP, ing. Clorindo Izzillo in data 26/07/2019, con il quale -

dedotte le ritenute di legge (€ 823,09) e l'acconto di cui al 1° SAL (€ 70.577,82) approvato con D.D.n.54/1 del 23/01/2019 - è stato accertato a favore dell'appaltatrice "Cadinvest Srl", il credito di € 93.217,16, oltre iva al 22% pari ad € 20.507,78 e, quindi, di complessivi € 113.724,94.

L'appaltatrice, in relazione, ha emesso opportuna fattura n. 38 del 27/08/2019, sdi 1482111624, acquisita nel sistema Unimatica al protocollo n.20190827E1ZZNWNW0000315aa del 27/08/2019, dell'importo corrispondente a detti complessivi € 113.724,94, di cui € 93.217,16 per imponibile ed € 20.507,78, per iva al 22%.

Verificata la regolarità contributiva della ditta in questione ed acquisita la dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art.3 comma 7 della L.136/2010.;

Dato atto che

- la relativa spesa di € 113.724,94 trova capienza alle corrispondenti voci di quadro economico dell'opera ed al finanziamento ottenuto per la realizzazione dell'opera, con imputazione sul capitolo 30594 codice 4.02-2.02.01.09.003 - a valere quanto ad € 90.525,56 sull'impegno n. 1032-2015, sub 1, RE 2016 e ad € 23.199,38 sull'impegno n. 1033-2014, sub 1, RE 2017;

- la fattura esibita dall'appaltatrice rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto, si procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore dell'importo imponibile della stessa, mentre la somma corrispondente all'Iva, verrà versata all'Erario con le modalità previste dalla legge.

- all'intervento è stato attribuito il CUP: J36E12000660001; ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex Art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12 novembre 2010, n.187 convertito con modificazioni nella legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", all'attività inerente l'affidamento dei lavori è stato attribuito il CIG: 6649669872.

Si ritiene di procedere alla presa d'atto del 2° ed ultimo stato di avanzamento lavori e relativo certificato di pagamento n.2, con contestuale riconoscimento a favore dell'impresa Cadinvest Srl del credito liquidabile di complessivi € 113.724,93, iva compresa.»

Visto il D. Lgs. n.50 del 18/04/2016;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.203 del 26/07/2019 di adozione del Piano Economico di Gestione (PEG) per il triennio 2019-2021;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il Decreto del Sindaco del 26/07/2019, prot.16878/N.115Gab, con il quale si affida all'arch.Michele Prencipe la Dirigenza del Settore Servizi Tecnici-Lavori Pubblici-Ambiente, comprendente i Servizi Lavori Pubblici, Ambiente e Verde Pubblico con decorrenza dal 01.08.2019 e fino al 30/06/2020;

Visto il decreto del Sindaco del 06/09/2019, prot. n. 19639, con il quale si affida la Dirigenza del Settore Servizi Gestionali e Finanziari al dott Giovanni Buquicchio, immesso nei ruoli del Comune di Cerignola, quale Dirigente a tempo pieno ed indeterminato, con decorrenza 06.09.2019.

D E T E R M I N A

1) la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di prendere atto del 2° ed ultimo stato di avanzamento dei lavori per la "Messa in sicurezza e prevenzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, della scuola elementare G. Carducci" CUP: J36E12000660001, emesso secondo le risultanze in premessa riportate dal Direttore dei lavori, arch. Ignazio Zagaria, nonché il relativo certificato di pagamento n.2, sottoscritto in data 26/07/2019 dal Responsabile del Procedimento, ing. Clorindo Izzillo, con il quale, dedotte le ritenute di legge e l'acconto di cui al 1° SAL, è stato accertato a favore dell'appaltatrice Cadinvest Srl il credito di € 93.217,16, oltre iva al 22% pari ad € 20.507,78 e di complessivi € 113.724,94;

3) di liquidare a favore della citata appaltatrice Cadinvest Srl, la somma di € 113.724,93, IVA al 22% compresa - a titolo di corrispettivo del suddetto 2° SAL e come da fattura n.38 del 27/08/2019, sdi 1482111624, acquisita nel sistema Unimatica al protocollo n.20190827E1ZZNWNW0000315aa del 27/08/2019, dell'importo corrispondente a detti complessivi € 113.724,94, di cui € 93.217,16 per imponibile ed € 20.507,78, per iva al 22% CIG: 6649669872, nell'intesa che all'effettivo pagamento si provvederà

ad avvenuto accredito da parte del MIT delle necessarie somme in conto contributo concesso per la realizzazione dell'opera;

4) di dare atto che la relativa spesa di complessivi € 113.724,94, iva compresa, trova capienza alle corrispondenti voci di quadro economico ed imputazione sul capitolo 30594 codice 4.02-2.02.01.09.003, a valere quanto ad € 90.525,56 sull'impegno n. 1032-2015, sub 1 RE 2016 e ad € 23.199,38 sull'impegno n. 1033-2014, sub 1 RE 2017, correlato al capitolo in entrata 40263, bilancio 2014 cod.4.03.10.01.001, accert.64;

5) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2019, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

6) di liquidare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa al suddetto capitolo ed impegno, imputandola al bilancio 2019;

7) di dare opportuna comunicazione del presente atto MIT nonché alla competente Struttura del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise la Puglia e la Basilicata - sede coordinata di Bari, nei termini di cui alla citata "Convenzione", ai fini della rendicontazione delle spese;

8) la redazione del presente atto è stata assegnata alla rag. Anna Battaglino, in servizio presso l'Ufficio Lavori Pubblici.

IL Dirigente DEL SETTORE

Principe Arch. Michele

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell'art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000

attesta

la copertura finanziaria.

La spesa complessiva di € 113.724,94 (CIG. 6649669872) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Delibera CIPE n.6 del 20.01.2012 -Programma straord n. 1376 del 25-09-2019 CIG 6649669872						
Su Impegno N° 1 sub n° 1 del 04-04-2016 a Residuo 2016 approvato con Atto n. 258 AREA AMM. TECNICA del 06-04-2016 avente per oggetto Delibera CIPE n.6/2012 - Programma straordinario stralcio interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, prevenzione e riduzione rischio connesso alla vulnerabilità elementi anche non strutturali - edificio G.Carduc						
Missione Programma 5° livello 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico						
Capitolo 30594 Articolo MESSA IN SIC. NON STRUTT. SC. ELEM. CARDUCCI - CONTR. STATALE						
Causale	Delibera CIPE n.6 del 20.01.2012 -Programma straordinario stralcio di interventi urgenti nel patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non st					
Importo	€ 90.525,56					
Beneficiario 1298 CADINVEST S.R.L.						
Quietanza BONIFICO BANCO DI NAPOLI (IT 57 D 01010 78382 100000001381) IBAN IT57D0101078382100000001381						
Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
1298 CADINVEST S.R.L.		38 del 27-08-2019	113.724,94	90.525,56		27-08-2019
	Ritenute documento		93.217,16	20.507,78	22,00%	
	IVA PARTE CORRENTE					
	Totale ritenute documento		93.217,16	20.507,78		

Delibera CIPE n.6 del 20.01.2012 -Programma straord n. 1377 del 25-09-2019 CIG 6649669872						
Su Impegno N° 1 sub n° 1 del 04-04-2016 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 258 AREA AMM. TECNICA del 06-04-2016 avente per oggetto Delibera CIPE n.6/2012 - Programma straordinario stralcio interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, prevenzione e riduzione rischio connesso alla vulnerabilità elementi anche non strutturali - edificio G.Carduc						
Missione Programma 5° livello 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico						
Capitolo 30594 Articolo MESSA IN SIC. NON STRUTT. SC. ELEM. CARDUCCI - CONTR. STATALE						
Causale	Delibera CIPE n.6 del 20.01.2012 -Programma straordinario stralcio di interventi urgenti nel patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non st					
Importo	€ 23.199,38					
Beneficiario 1298 CADINVEST S.R.L.						
Quietanza BONIFICO BANCO DI NAPOLI (IT 57 D 01010 78382 100000001381) IBAN IT57D0101078382100000001381						
Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
1298 CADINVEST S.R.L.		38 del 27-08-2019	113.724,94	23.199,38		27-08-2019
	Ritenute documento		93.217,16	20.507,78	22,00%	
	IVA PARTE CORRENTE					
	Totale ritenute documento		93.217,16	20.507,78		

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
--

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal al , come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città,

IL Responsabile AA.GG
VALENTINO MARIA CONCETTA

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_17764431	Data richiesta	25/10/2019	Scadenza validità	22/02/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CADINVEST - S.R.L.
Codice fiscale	01934460716
Sede legale	VIA SESTRIERE 2 CERIGNOLA FG 71042

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_16200187	Data richiesta	27/06/2019	Scadenza validità	25/10/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CADINVEST - S.R.L.
Codice fiscale	01934460716
Sede legale	VIA SESTRIERE 2 CERIGNOLA FG 71042

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



SISTEMA GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2008

SINCERT

Cadinvest S.r.l.

Via Sestriere n°2 - 71042 Cerignola (Fg)

Iscr. Registro Imprese C.C.I.A.A. di Foggia n. 01934460716

Capitale sociale sottoscritto e i.v.: € 118.500,00

CITTÀ DI CERIGNOLA - AOO C_C514
PROT. ARRIVO - REGISTRO PROTOCOLLO GENERALE
28-12-2018 - 0039083
Categoria 6 - Classe 4



Spett.le **COMUNE DI CERIGNOLA**
Settore Lavori Pubblici, Manutenzione

OGGETTO: Comunicazione di attivazione o utilizzo di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010.

In relazione all'appalto dei lavori avente per oggetto "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'ISTITUTO SCOLASTICO "G. CARDUCCI" IN VIA EGMONT N.1 NELL'ABITATO DEL COMUNE DI CERIGNOLA (FG)", affidati da codesto Ente, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n.136/2010,

SI COMUNICA

la precedente sussistenza di un conto corrente dedicato utilizzato per la gestione dei movimenti finanziari relativi agli appalti pubblici, essendo destinato a tale funzione, presso il Banco di Napoli – Filiale di Cerignola con i seguenti dati identificativi del conto corrente:


- codice IBAN IT05 F030 6978 3831 0000 0001 381.

Intestataria del conto è la sottoscritta Società e il soggetto delegato ad operare sullo stesso è:

- ing. Donato Calice, nato il 02/01/1949 a Cerignola ed ivi residente in Via M. SS. Ausiliatrice n. 163, C.F.: CLC DNT 49A02 C514I;

SI SEGNALE

che anche per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con il vostro Ente ci si avvarrà – fatte salve le eventuali modifiche successive, debitamente comunicate, – del medesimo conto corrente dedicato, senza necessità di formulare apposite comunicazioni per ciascuna commessa.



Il Legale Rappresentante



CADINVEST srl
L'AMMINISTRATORE UNICO
Ing. Donato Calice

Tel +390885422125
Fax +390885422125

e-mail: info@cadinvest.it
PEC: cadinvest@arubapec.it

P.IVA 01934460716

CITTA' DI CERIGNOLA PROT. N. 39083 DEL 28-12-2018 IN arrivo

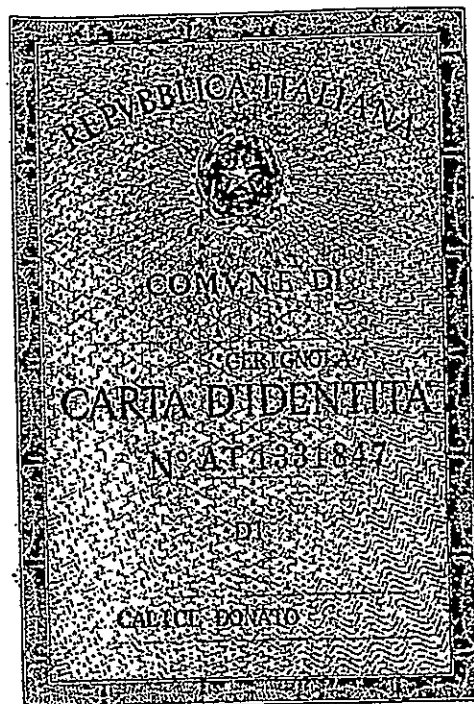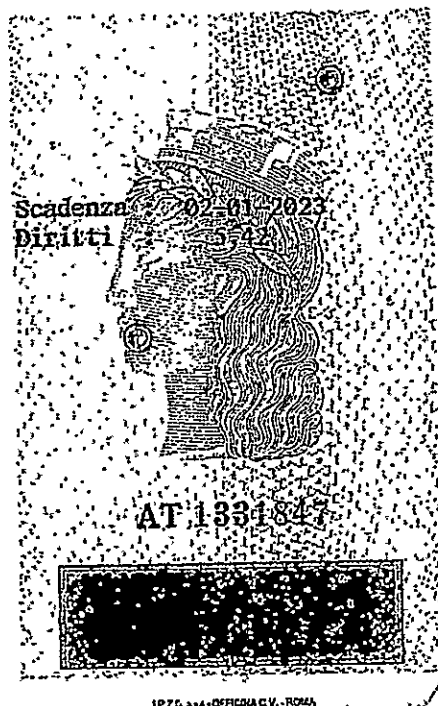

Cognome **CALICE**
Nome **DONATO**
nato il **02-01-1949**
(atto n. **36** P. **1** S. **A 1949**)
a **CERIGNOLA (FG)**
a **Italiana**
Cittadinanza **CERIGNOLA (FG)**
Residenza **LE MARIA S.S. AUSILIATRICE 163**
Via **CONTUGATO**
Stato civile **CONIUGATO**
Professione **MESSA L. 127/97 ART. 2**
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura **180**
Capelli **Castani**
Occhi **Verdi**
Segni particolari **NESSUNO**

Firma del titolare **CERIGNOLA**
09-07-2012
Il sindaco
L'Ufficiale Anagrafe
DELEGA
SINISTRO
CERIGNOLA

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201900003495662

Identificativo Pagamento: FATT.2019

Importo: 93217,16 €

Codice Fiscale: 01934460716

Data Inserimento: 19/11/2019 - 15:08

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA
