



Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2437

del 26-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	30588	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 2 (04 02-2.02 01.09.003)	Gest.	RESIDUI/2018
PROG. MESSA SICUREZZA SISMICA SC. ELEM. MARCONI - CONTR. STATALE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Tecnici LL.PP. Ambiente		nr.	107 del 15-05-2019
numero 664/2018 del 17-05-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
POR PUGLIA 2014-2020 Asse V Azione 5.2 Sub.-Azione 5.2.b. Lavori di "Adeguamento sismico della scuola elementare G.Marconi". Approvazione e liquidazione 1° acconto onorario professionale per le prestazioni inerenti i servizi di ingegneria di dire							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	999.078,13	2.008.751,45	
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	852.700,09	1.238.054,95	
Titolo	2	Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO	1.564,89	1.564,89	
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO	854.264,98		
3o Livello	01	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA	144.813,15	769.131,61	
4o Livello	09	Beni immobili					
5o Livello	003	Fabbricati ad uso scolastico					
SIOPE	2020109003						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 4) CONTRIBUTI REGIONALI					Fruttifero	C.U.P. J39H18000100002
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.564,89 dicensi MILLECINQUECENTOESSANTAQUATTRO/89							
Per : POR PUGLIA 2014-2020 Asse V Azione 5.2 Sub.-Azione 5.2.b. Lavori di "Adeguamento sismico della scuola elementare G.Marconi". Approvazione e liquidazione 1 acconto onorario professionale per le prestazioni inerenti i servizi di ingegneria di dire							

CREDITORE (Codice: 3617)				
IACOBazzi NICOLA		VIA L.DA VINCI,40		
Cod.Fis. CBZNC164C01C514D / P.Iva 03105860716		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:7737959DC2 SALDO Fatt.n. 1/E del 30/04/2019 SPESE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI STRUTTURALI , COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESERCUZIONE, MISURA E CONTABILITA DELLE OPERE - PRIMO ACCONTO	1.564,89		2109
			1.564,89	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BPER banca Spa IT35U0538778380000002914881 - CIN:U - ABI:05387 - CAB:78380 - C/C:000002914881 IBAN:IT35U0538778380000002914881 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2437 DEL 26/07/2019
REVERSALE N. _____

MANDATO UNICO

CODICE BILANCIO: 04.02-2.02.01.09.003
CAPITOLO 30588 ARTICOLO 0 BIL. RE 2018
IMPEGNO N. Sub. 368. 3 LIQUIDAZIONE N. 664 DEL 17/05/2019
IMPORTO LIQUIDAZIONE: € 15.648,90
CIG DETERM. 7737959DC2 (10) CUP DET. _____ (15)
DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____
Determ. N. _____ del / / 2019
Determ. generale di liquidazione N. 465/107 del 17/05/2019

SETTORE: Liq. LL.PP - Amb. IMPONIBILE €
NUM.DET. 107 DEL 15/05/2019 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
ETER.IMPORTO € 15.648,90 N.TOTALE LIQ. 1 RITENUTA €
107Liq. LL.PP - Amb.43600 (IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 1.564,89
(IMPONIBILE + RITENUTA)

CREDITORE: Codice N.

(3617)

IACOBazzi NICOLA

PARTIVA IVA (11): IT 03105860716
CODICE FISCALE (16): CBZNCL64C01C514D
(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI _ / _ NO _)
PARTIVA IVA (11): IT _____
CODICE FISCALE (16): REG. 15 DI KIKIK.

VIA L.DA VINCI,40
CERIGNOLA FG

() FATTURA N. 1/E DEL 21/06/2019
PROT.ENTRATA N. _____ DEL / / STAMPATA _ SI _ / _ NO _ SDI N. _____

IMPORTO. FATT. € 15.648,90 IMPON. € 15.648,90 IVA € -

FATTURA UNICA _ SI _ NO _
CIG FATT. _____ (10) CUP FATT. _____ (15)
SALDO FATTURA _ SI _ / _ NO _ SALDO
ACCONTO FATTURA _ SI _ / _ NO _ PER €
SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDEMENTE _ SI _ / _ NO _
SCISSIONE _ SI _ / _ NO _ (SPESE ESENTI/ESCLUSE _ SI _ / _ NO _) (BOLLO _ SI _ / _ NO _)
EQUITALIA _ SI _ / _ NO _ DEL / / (A) DICHIARAZIONE DEL /DURC SCADENZA / / (A)
TRACCIABILITA' _ SI _ / _ NO _ (A) (A)=ALLEGATA IN PROCEDURA ALLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
IBAN: IT 35 (2) / 1 (L) / (5) / 2114 88 (12)
COMMISSIONI BANCARIE _ SI _ / _ NO _ BANCA _____

DESCRIZIONE :

POR PUGLIA 2014-2020 Asse V Azione 5.2 Sub.-Azione 5.2.b. Lavori di "Adeguamento sismico della scuola elementare G.Marconi". Approvazione e liquidazione 1° acconto onorario professionale per le prestazioni inerenti i servizi di ingegneria di dire

SIOPE: 2109 5° LIVELLO _____



buved

COMUNE DI CERIGNOLA

Settore Servizi Tecnici, Lavori Pubblici, Ambiente

12 LUG. 2019

Prot.n° 15486

Cerignola, ...

OGGETTO: Intervento di "Adeguamento sismico della scuola elementare Marconi – POR Puglia 2014-2020 – Asse V - Azione 5.2 Sub Azione 5.2.b – CUP J39H18000100002 – DD.n.1345/285 del 03/10/2018 e DD.n.177/42 del 05/03/2019 – Disciplinare-convenzione di incarico del 1 09/10/2018 rettificata in data 07/03/2019 – Liquidazione primo e secondo acconto onorari per direzione, coordinamento della sicurezza, misure e contabilità dei lavori - CIG 7737959DC2.

Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio
SEDE

Invito la S.V. a voler disporre pagamenti per complessivi € 44.314,85, a favore dell'A.T.P. composta dall'arch. Nicola Iacobazzi e ing. Michele Cirulli, a titolo di primo e secondo acconto sugli onorari con gli stessi convenzionati per la direzione, coordinamento della sicurezza, misure e contabilità dei lavori - CIG 7737959DC2, come dalle seguenti disposte liquidazioni:

1. € 1.564,89, contributo previdenziale 4% pari ad € 60,19 compreso (non soggetta ad IVA) a favore dell'arch. Nicola Iacobazzi, a saldo della fattura n.1/E del 30/04/2019 acquisita al prot.Unimatica 20190513E1ZZNW00140aa in data 30/04/2019, identificativo sdi 874793208, dell'importo di € 1.546,89 emessa a titolo di 1° acconto, la cui liquidazione è stata disposta con Atto di Liquidazione n.445/107 del 17/05/2019;

2. € 2.866,59, contributo previdenziale 4% pari ad € 110,25 compreso (non soggetta ad IVA) a favore dell'arch. Nicola Iacobazzi, a saldo della fattura n.2/E del 13/05/2019 acquisita al prot.Unimatica 20190520E1ZZNW00150aa in data 20/05/2019, identificativo sdi 912688118, dell'importo di € 2.866,59 emessa a titolo di 2° acconto, la cui liquidazione è stata disposta con Atto di Liquidazione n.590/133 del 20/06/2019;

3. € 14.084,01, contributo previdenziale 4% pari ad € 541,69 compreso (non soggetta ad IVA) a favore dell'ing. Michele Cirulli, a saldo della fattura n.1/E del 06/05/2019 acquisita al prot.Unimatica 20190508E1ZZNW00130aa in data 30/04/2019, identificativo sdi 838148278, dell'importo di € 14.084,01 emessa a titolo di 2° acconto, la cui liquidazione è stata disposta con Atto di Liquidazione n.445/107 del 17/05/2019;

4. € 25.799,36, contributo previdenziale 4% pari ad € 992,28 compreso (non soggetta ad IVA) a favore dell'ing. Michele Cirulli, a saldo della fattura n.2/E del 13/05/2019 acquisita al prot.Unimatica 20190516E1ZZNW00147aa in data 16/05/2019, identificativo sdi 895464661, dell'importo di € 25.799,36 emessa a titolo di 2° acconto, la cui liquidazione è stata disposta con Atto di Liquidazione n.590/133 del 20/06/2019;

I relativi pagamenti dovranno essere effettuati a favore dei citati professionisti mediante bonifico sui corrispondenti conti corrente bancari, opportunamente comunicati ai sensi dell'art.3 comma 7 della L.136/2010.

La suddetta complessiva spesa, dovuta come dalle richiamate fatture, è stata impegnata sul Cap. 30588, codice bilancio 04.02-2.02.01.09.003, impegno 368/1, sub 3, a valere quanto ad € 15.648,00 (€ 1.564,89 + € 14.084,01 PER 1° ACC.) sulla liquidazione 664 RE 2018 del 17.05.2019, € 2.866,59 sulla liquidazione 904 RE 2018 del 20/06/2019 (2° ACC), € 25.799,36 sulla liquid. 905 RE 2018 del 20/06/2019 (2° ACC), correlato al finanziamento assegnato dalla Regione Puglia per la realizzazione dell'opera (iscritto in entrata al cap.40282, cod. bil 4.03.10.01.001, accert. 27).

La stessa trova disponibilità sulle erogazioni (2^) effettuate in conto contributo definitivamente assegnato post-gara dalla Regione Puglia.

Il Responsabile del Procedimento

geon. Rosaria Rinaldi

Si Allega:

Il Sindaco

avv. Francesco Metta

* Fatture elettroniche; - regolarità contributiva.

A rag x liquid. marconi/pc32

FATTURA ELETTRONICA

Versione
FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **ITTMPNNM86C14A859D**
Progressivo di invio: **1**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **E1ZZNW**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03105860716**
Codice fiscale: **CBZNCL64C01C514D**
Nome: **NICOLA**
Cognome: **IACOBAZZI**
Regime fiscale: **RF19** (Regime forfettario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA CASSINO N 51 A**
CAP: **71042**
Comune: **CERIGNOLA**
Provincia: **FG**
Nazione: **IT**


Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00362170714**
Codice Fiscale: **00362170714**
Denominazione: **COMUNE DI CERIGNOLA**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA DELLA REPUBBLICA**
CAP: **71042**
Comune: **CERIGNOLA**
Provincia: **FG**



Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione
FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-04-30** (30 Aprile 2019)
Numero documento: **1/E**
Importo totale documento: **1564.89**
Causale: **SPESE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI STRUTTURALI ,
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESERCUZIONE,
MISURA E CONTABILITA DELLE OPERE - PRIMO ACCONTO**

Bollo

Bollo virtuale: **SI**
Importo bollo: **2.00**

Cassa previdenziale


Tipologia cassa previdenziale: **TC04** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
Importo contributo cassa: **60.19**
Imponibile previdenziale: **1504.70**
Aliquota IVA applicata: **0.00**
Tipologia di non imponibilità del contributo: **N2** (non soggette)

Il Responsabile del Procedimento
geom. **Rosaria Rinaldi**



Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **177-42**
Data ordine di acquisto: **2019-03-05** (05 Marzo 2019)
Codice Unitario Progetto (CUP): **J39H18000100002**
Codice Identificativo Gara (CIG): **7737959DC2**



Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. MARCONI POR PUGLIA 2014-2020 ASSE PRIORITARIO V_AZIONE 5.2 INTERVENTI PER LA RIDUZIONE INCENDI E DEL RISCHIO SISMICO - PRIMO ACCONTO ONORARIO PROFESSIONALE PER I SERVIZI DI INGEGNERIA DI DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITA E CORDINAMENTO PER LA SICUREZZA NELLA FASE ESECUTIVA - D.D. 177-42 DEL 05-03/2019 - CIG 7737959DC2 CUP J39H18000100002 CAPITOLO DI SPESA 30588 - IMPEGNO DI SPESA 368-2018 SUB3**

Valore unitario: **1504.70**

Valore totale: **1504.70**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura


Aliquota IVA (%): **0.00**

Natura operazioni: **N2** (non soggette)

Totale imponibile/importo: **1564.89**

Totale imposta: **0.00**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it



Cerignola, 08/05/2019

LAVORI PUBBLICI

Spett.le COMUNE DI CERIGNOLA
Piazza della Repubblica - Cerignola (FG)

Oggetto: Dichiarazione L.13/08/2010 n.136, art.3 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il sottoscritto IACOBAZZI Nicola, con studio tecnico in Via Cassino n.51A Località Cerignola - CAP 71042, C.F. CBZNCL64C01C514D e P.IVA 03105860716 al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 co. 2 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., in riferimento all'appalto per i servizi di ingegneria relativi ai:

"Lavori di adeguamento sismico della scuola elementare G.Marconi"

C.U.P.: J39H18000100002

C.I.G.: 7737959DC2

CITTÀ DI CERIGNOLA - AOO C_C514
PROV. ARRIVO - REGISTRO PROTOCOLLO GENERALE
09-05-2019 - 0010511
Categoria 6 - Classe 5

DICHIARA



che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, esclusivo (o non esclusivo), sono:

- Istituto di credito: BPER banca S.p.a.,
- Agenzia di Cerignola - Via XX Settembre, 37
- IBAN: IT35 U053 8778 3800 0000 2914 881
- intestato : IACOBAZZI Nicola


che la persona autorizzata ad operare sui predetti conti è il sig. Nicola IACOBAZZI nato a Cerignola il 01/03/1964 e residente in Cerignola alla via Cassino n.51A, C.F. CBZNCL64C01C514D



Di impegnarsi a comunicare ogni successiva modifica ai dati trasmessi;

Di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n.136 e s.m.i.a pena di nullità assoluta del contratto


Distinti saluti.

Nicola Iacobazzi



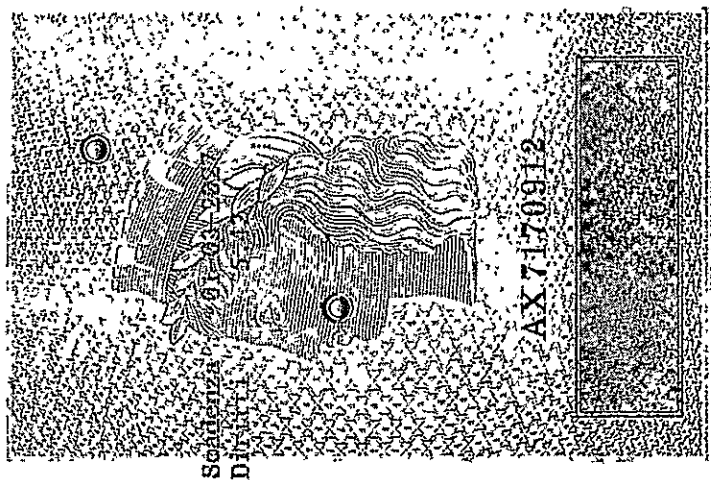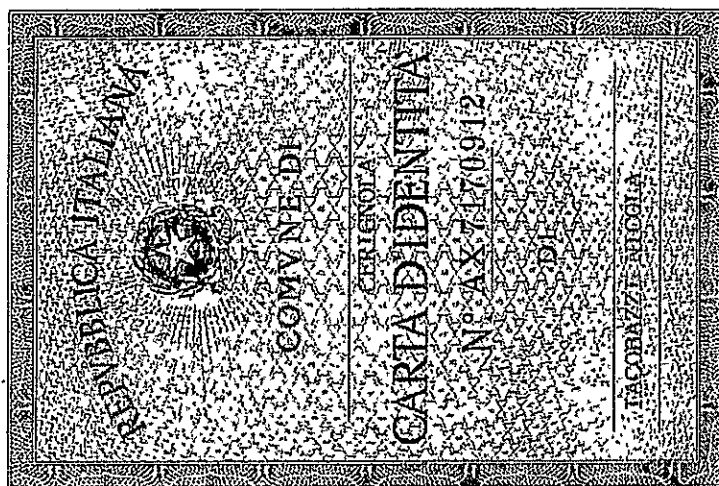

Cognome.....IACOPRAZZI.....
 Nome.....NICOLA.....
 nato il.....01-03-1964.....
 (alto n.....271.....P. I.....S.A. 1964.....)
 a.....CERIGNOLA (FG).....
 Cittadinanza.....Italiana.....
 Residenza.....CERIGNOLA (FG).....
 Via.....CASSINO 51/A.....
 Stato civile.....CONIUGATO.....
 Professione.....MESSA L. 121/97 ART. 2.....
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALENTI.....
 Statura.....174.....
 Capelli.....Brizzolati.....
 Occhi.....Cervoni.....
 Segni particolari.....NESSUNO.....

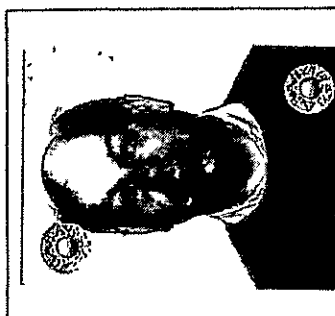


Firma del titolare.....
 CERIGNOLA, li.....18-04-2016.....

Il SINDACO
 d'Ordine del Sindaco
 l'Ufficiale di Agrate
 SINISI dott. Francesco

Imprints del dito
 indice al di sotto





inarcassa

CASSA NAZIONALE
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI
LIBERI PROFESSIONISTI

Protocollo: **Inarcassa.0509041.09-05-2019**

DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Ufficio Ciclo Attivo

676706/171.2.1/STAP03

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA
UFFICIO LAVORI PUBBLICI
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA FG

Roma, 09 maggio 2019

Oggetto: certificato di regolarità contributiva Arch. Nicola Iacobazzi - richiesta del 09/05/2019

L'Arch. **Nicola Iacobazzi**, nato a CERIGNOLA FG il 01/03/1964, codice fiscale CBZNCL64C01G514D, matricola 676706 iscritto nei ruoli previdenziali di Inarcassa, **alla data del 09/05/2019, risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di questa Associazione**, per quanto accertato in relazione alle comunicazioni annuali inviate.

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
(Sergio Ricci)

Il presente certificato viene rilasciato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.50/2016. E' prodotto in carta semplice per gli usi consentiti dalla Legge, ha validità quattro mesi dalla data di rilascio e non preclude l'azione di accertamento e il recupero di eventuali somme che risultassero successivamente dovute.



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 445

In data 17-05-2019

Atto Reg. Sett. N. 107

In data 15-05-2019

OGGETTO: POR PUGLIA 2014-2020 Asse V Azione 5.2 Sub.-Azione 5.2.b. Lavori di "Adeguamento sismico della scuola elementare G.Marconi". Approvazione e liquidazione 1° acconto onorario professionale per le prestazioni inerenti i servizi di ingegneria di direzione, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza nella fase esecutiva.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **quindici** del mese di **maggio**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI TECNICI LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

LAVORI PUBBLICI

Mastroserio Ing. Vito, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

«Con Atto del Dirigente della Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico n. n. 185 del 10.07.2017, pubblicata sul BURP n.86 del 20 luglio 2017, è stato approvato, in esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale n.1102/2017, l'Avviso Pubblico per la selezione di interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio» che assegna risorse finanziarie a valere sul POR 2014/2020.

Questo Comune, nell'ambito dell'attuazione dell'Azione 5.2 "Interventi per la riduzione del rischio incendi e del rischio sismico", specificatamente nella sub Azione 5.2.b "Interventi per la messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio" di cui al suddetto Avviso, ha candidato a finanziamento il progetto esecutivo relativo a "Interventi per la messa in sicurezza ed adeguamento sismico e prevenzione incendi dell'edificio scolastico elementare "Marconi", per l'importo di € 2.230.000,00, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.266 del 16/10/2017.

La Regione Puglia, con D.D.n.073/2017/318 del 22/11/2017, pubblicata sul BURP n.135 del 30/11/2017, ha approvato la graduatoria definitiva di n.16 interventi ammessi a finanziamento (POR Puglia 2014-2020 - Asse V - Azione 5.2 - Sub-Azione 5.2b), tra cui quello proposto da questa Amministrazione, approvato con la citata D.G.C. n.266/2017 e assunto dalla Commissione di valutazione regionale a livello di fattibilità tecnica ed economica in quanto non comprensivo di tutti gli elaborati tecnici e grafici previsti dal Codice Appalti da cui evincere l'indicatore di rischio sismico.

In data 17/01/2018 è stato sottoscritto il "Disciplinare" che regola i rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di Cerignola, quale Soggetto beneficiario del finanziamento in argomento.

Con Determinazione Dirigenziale n.138/40 del 31/01/2018 è stata ratificata la nomina di R.U.P. alla geom. Rosaria Rinaldi, già disposta con atto dirigenziale del 28/09/2017, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.n.50/2016.

In data 31/01/2018 con nota prot.n.3316 è stata inoltrata richiesta di parere sul progetto alla Competente Soprintendenza. Con nota prot.n. 2639 del 03/04/2018, acquisita al protocollo generale in data 12/04/2018 col n.10908, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia ha "Autorizzato", ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/04, con le prescrizioni nella stessa riportate (tra cui la sostituzione della tecnica delle contropareti in betoncino di cm 8 con soluzione ugualmente efficace ma meno invasiva; la rivalutazione della collocazione e caratteristiche della scala metallica di emergenza prevista all'esterno; il rispetto al decoro e caratteristiche dell'edificio delle opere di finiture, impiantistiche e strutturali; l'obbligo della figura professionale di un architetto per le successive fasi di progettazione dei dettagli ed esecuzione dei lavori nel rispetto dell'art.52 del R.D. 23/10/1925 n°2537, trattandosi di intervento di restauro di edificio monumentale), la esecuzione delle opere, restituendo gli atti progettuali debitamente vistati.

In data 08/02/2018 è stata inoltrata richiesta di valutazione del progetto (ai sensi dell'art.3 del DPR 01/08/2011 n.151) al competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia. La stessa per la necessità di sostituire alcuni elaborati depositati è stata integrata in data 06/04/2018. Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia con nota prot.5475 del 30/04/2018, acquisita al prot. 13333 del 04/05/2018, ha espresso parere di conformità del progetto (pratica 20112/2018), alle condizioni riportate nella stessa nota-parere.

Con Determinazione Dirigenziale n.602/130 del 12/04/2018 è stata indetta la gara, mediante procedura aperta di cui all'art.60, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016, con il criterio dell'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95, comma 3, let.a) dello stesso D.Lgs, per l'affidamento dei "Lavori di adeguamento sismico della scuola elementare G. Marconi", per l'importo a base d'asta di € 1.822.078,62, C.U.P.: J39H18000100002 - C.I.G. 7422210972.

Con Determina n.31 del 16.04.2018 la Centrale Unica di Committenza CUC del Tavoliere, della quale il Comune di Cerignola è capofila, ha approvato il bando-disciplinare di gara il quale ha richiesto opportuna dichiarazione da rendersi da parte delle concorrenti: "di aver preso visione della nota 2639 del 3/04/2018 della Soprintendenza dei Beni Architettonici e di accettare la realizzazione di tutte le modifiche imposte dalla stessa Soprintendenza senza alcun aggravio economico a carico di questa Amministrazione Comunale".

Il 07.05.2018 è stato pubblicato l'Avviso di proroga del termine di presentazione delle offerte dal 14.05.2018 al 21.05.2018; con successiva determina n.38 del 24.05.2018 la CUC Tavoliere ha nominato la Commissione di gara.

In data 11/05/2018, per ragioni di complessità, gli elaborati tecnici relativi alla procedura di gara sono stati in parte sostituiti ed integrati, comprendendo elaborati relativi a calcoli strutturali e capitolato d'appalto; l'"Avviso sostituzione ed integrazione elaborati di gara" è stato pubblicato sul sito della Centrale Unica di Committenza CUC del Tavoliere in data 11/05/2018.

La Commissione di gara si è riunita in tre sedute come da relativi verbali in atti: seduta pubblica in data 25.5.2018, riservata in data 01.06.2018 e pubblica conclusiva in data 08/06/2018.

Con verbale della seduta pubblica conclusiva del 08/06/2018, la Commissione ha proposto l'aggiudicazione della gara dei "Lavori di adeguamento sismico della scuola elementare G.Marconi" all'A.T.I. composta dalle Ditte "SAV S.r.l" (mandataria) e "S.C.M. S.r.l." (mandante), che ha offerto il ribasso del 2,20% (duevirgolaventi%), sull'importo posto a base di gara di € 1.776.022,49 soggetto a ribasso, oltre ad € 46.056,13 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso. Con Determina n.58 del 21/06/2018 il Responsabile della Centrale Unica di Committenza C.U.C. del Tavoliere, ha preso atto delle risultanze del verbale di gara di cui alla seduta pubblica conclusiva del 08/06/2018.

Con Determinazione Dirigenziale n.1081/216 del 02/07/2018 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori in argomento all'ATI "SAV S.r.l." (mandataria) e "S.C.M. S.r.l." (mandante), per l'importo di € 1.736.950,00 al netto del ribasso del 2.20%, oltre

ad € 46.056,13 per costi della sicurezza, con un importo contrattuale di € 1.783.006,13, oltre iva al 10% per un totale, quindi, di € 1.961.306,74.

In data 05/10/2018 tra questa Amministrazione e la S.A.V. S.r.l., mandataria dell'A.T.I. aggiudicataria dei lavori - intervenuta in forza dell'atto di costituzione del raggruppamento temporaneo di Imprese e mandato speciale di rappresentanza, a rogito del dott. Antonio Pugliese di Deliceto in data 05/09/2018, Rep/Rac. 3738/2787 - è stato stipulato apposito contratto di appalto con il numero di repertorio n.203, firmato digitalmente e registrato a Cerignola in data 09/10/2018 col n.1934 serie 1T.

Con Determinazione Dirigenziale n.1345/285 del 03/10/2018 è stata aggiudicata definitivamente al R.T.P. arch.Nicola Iacobazzi - ing.Michele Cirulli, l'incarico dei servizi di ingegneria, consistenti nella direzione, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in argomento (CIG:761387506B), per l'importo di € 78.406,00, già dedotto del ribasso offerto del 1,50%, oltre ad € 3.136,24 per oneri previdenziali ed € 17.939,29 per IVA, e per complessivi di € 99.481,53.

In data 09/10/2018 si è proceduto alla sottoscrizione con l'ATP dei professionisti, come sopra composta dall'arch.Nicola Iacobazzi e ing. Michele Cirulli, della Convenzione-Disciplinare di incarico dei servizi di ingegneria in argomento, nella quale per mero errore materiale è stato individuato come capogruppo dell'ATP l'ing. Michele Cirulli.

I citati professionisti per l'espletamento delle funzioni di cui all'incarico in data 08/10/2018 si sono costituiti, per scrittura privata, in Raggruppamento Temporaneo di professionisti di cui agli artt.46 e 48 del D.Lgs 50 del 18/04/2016, riportando -sempre per mero errore materiale- la figura dell'ing. Michele Cirulli come mandatario.

Con determinazione dirigenziale n.1753/375 del 24/12/2018, a seguito della comunicazione per via PEC dell'ANAC di avvenuta cancellazione del CIG 761387506B per mancato perfezionamento della stessa nei termini stabiliti - si è proceduto ad assegnare alla suddetta gara il seguente nuovo CIG: 7737959DC2, da intendersi riportato nei provvedimenti inerenti le attività di affidamento dei servizi di ingegneria di direzione, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza nella fase esecutiva dei lavori in argomento.

Con Determinazione Dirigenziale n. 177/42 del 05/03/2019 si è preso atto del nuovo Atto di Costituzione di Raggruppamento Temporaneo di scopo tra Professionisti, stipulato per scrittura privata in data 28/02/2019 dai professionisti aggiudicatari dell'incarico di direzione, misure e contabilità e ordinamento della sicurezza della fase esecutiva dei lavori inerenti l'intervento di "Adeguamento sismico della scuola elementare G.Marconi" (CIG: 7737959DC2), con il quale, nel rispetto di cui alla normativa vigente, è stato conferito mandato collettivo speciale e irrevocabile e con rappresentanza esclusiva e processuale all'arch. Nicola Iacobazzi (capogruppo).

Con la stessa Determinazione Dirigenziale n. 177/42/2019 si è dato atto che:

- il suddetto Atto Costitutivo di ATP è stato emesso a rettifica e sostituzione della precedente scrittura privata dell'8/10/2018, e che, in relazione, si procederà alla sottoscrizione di nuova Convenzione-Disciplinare di affidamento a sostituzione e rettifica di quella sottoscritta in data 9/10/2018 con i professionisti affidatari, costituenti l'ATP;

- le disposizioni di cui al presente atto devono intendersi riportate nei provvedimenti inerenti le attività di affidamento dei servizi di ingegneria di direzione, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza nella fase esecutiva dei lavori in argomento;

- la spesa complessiva di € 99.481,53 relativa ai compensi dovuti per l'espletamento delle funzioni di cui all'incarico professionale in argomento risulta imputata al cap. 30588, impegno 368, sub. 3, cod. bilancio 04.02-2.02.01.003 - Bilancio 2018, correlato al finanziamento ottenuto per la realizzazione dell'intervento.

In data 07/03/2019 i professionisti hanno sottoscritto apposito disciplinare di incarico.

In data 23/10/2018 con nota prot. 31445, al fine di ottemperare alle prescrizioni di cui al parere 2639 del 03/04/2018 della Soprintendenza sono stati inviati gli elaborati progettuali relativi alle proposte di soluzioni di dettaglio (meno invasive come richiesto nel richiamato parere) predisposti dall'arh. Raffaele De Filippis, tecnico incaricato della Capogruppo dell'ATI aggiudicataria dei lavori, Sav Srl, che hanno tenuto altresì conto delle modifiche atte a ottemperare a quanto osservato dalla Soprintendenza e proposte in sede di gara dall'Appaltatrice.

Con nota prot. n.9025 del 23/10/2018, acquisita al protocollo generale in data 25/10/2018 al n.31858, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia ha comunicato la presa d'atto dell'ottemperamento di quanto dalla stessa Soprintendenza prescritto con la nota autorizzativa prot.2639 del 03/04/2018.

Con Determinazione Dirigenziale n. 1435/313 del 25/10/2018 è stato conferito all'ing. Matteo Morra - C.F.CPBNTN65D05I493D, P.IVA:03189260718, l'incarico per l'espletamento del collaudo statico e tecnico-amministrativo dei lavori (CIG: Z3C254680F).

In data 26/10/2018 si è proceduto alla definitiva consegna dei lavori; gli stessi hanno avuto concreto ed effettivo inizio in pari data, come da verbale e attestazione della D.L., in atti. Con l'avvio dei lavori è stato dato corso ai soli interventi di demolizioni, opere di rifinitura (intonaci, massetti, ecc), rinviando gli interventi strutturali ad avvenuta acquisizione dei superiori pareri dei competenti Servizio Edilizia Sismica provinciale e Servizio Sismico Regionale, vista la necessità di assicurare i tempi di esecuzione, in modo da consegnare l'opera per il prossimo anno scolastico.

Con Determinazione Dirigenziale n.1488/326 del 12/11/2018, si è preso atto ed aderito alla cessione di credito di cui all'atto

autenticato dal dott. Antonio Pugliese Notaio in Deliceto, del 31/10/2018 con Repertorio n. 3850 - Raccolta n.2876, registrato a Foggia il 31/10/2018 al n. 5490/1T e notificato al Comune di Cerignola mediante pec in pari data ed acquisito al protocollo generale 32528 in data 02/11/2018, con il quale:

- la Società SAV S.r.l. (cedente), con il consenso e l'autorizzazione della Società S.C.M. S.r.l. (mandante dell'ATI aggiudicataria), ha ceduto alla Società CREDEMFACTOR S.p.A. "Gruppo Bancario Credito Emiliano- Credem" (cessionaria), con sede in Reggio Emilia, alla Via Ernesto Che Guevara 4/B (codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia 01254050352, iscritta con numero R.E.A. 171386), che ha accettato e acquistato i propri crediti imponibili di impresa futuri, per la sua quota parte di € 1.604.705,52 (unmilione seicentoquattromilasettecentocinquevirgolacinquantaduecentesimi) che la medesima impresa cedente vanta e/o vanterà nei confronti di questo Comune (debitore ceduto) in dipendenza del contratto di appalto stipulato in data 05/10/2018 repertorio n.203, registrato a Cerignola in data 09/10/2018 al n°1934/1T per l'esecuzione dei lavori di "Adeguamento sismico della scuola elementare G.Marconi" a valere sul POR Puglia 2014-2020 Asse Prioritario V - Azione 5.2 Interventi per la riduzione del rischio incendi e del rischio sismico CUP:J39H18000100002 - CIG:7422210972, nonché di ulteriori crediti futuri che potrebbero derivare da varianti e qualunque implementazione allo stesso;

- La Società S.C.M. Srl, mandante dell'A.T.I. aggiudicataria dei lavori in argomento, con la sottoscrizione dello stesso atto di cessione, acconsente alla cessione da parte della mandataria SAV Srl dei propri crediti d'impresa futuri derivanti dal contratto di appalto di cui sopra, stipulato con Comune di Cerignola - potendo essere inclusi, nelle fatture oggetto di cessione a favore di Credemfactor SpA, anche i crediti vantati dalla società mandante in dipendenza di prestazioni eseguite nell'ambito nel citato Raggruppamento Temporaneo di Impresa - e autorizza il debitore ceduto Comune di Cerignola ad effettuare i pagamenti direttamente in favore della cessionaria Credemfactor SpA..

Con la stessa Determinazione Dirigenziale n.1488/326 del 12/11/2018, eseguiti gli adempimenti ex art. 48 bis del DPR 602 del 29/09/73, in conformità dei chiarimenti forniti dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con circolare n.29 dell'08.10.2009, giusti identificativi univoci di richiesta all'Agenzia delle Entrate n.201800002885863, n.201800002885880 e n.201800002886003 nei confronti, rispettivamente della ditta SAV Srl (P.IVA e C.F.:02346000710), della ditta S.C.M. Srl (P.IVA e C.F.:013115700680) e della Credemfactor Spa (P.IVA e C.F.: 01254050352), è stato disposto che tutti i pagamenti che questo Ente andrà ad effettuare a favore della citata Appaltatrice in dipendenza del citato contratto di appalto, per effetto della cessione stessa, dovranno essere effettuati mediante accredito a favore della Società Cessionaria CREDEMFACTOR S.P.A., con sede in Reggio Emilia, Via Che Guevara n.4/B, sul conto corrente bancario

dedicato, ai sensi della legge n.136 del 13 agosto 2010, n.010000090300 presso il Credito Emiliano SpA di Reggio Emilia - Sportello Grandi Relazioni - coordinate bancarie ABI 03032, CAB 12891 CIN Q - IBAN IT55 Q 03032 12891 01 00000 90300, così come stabilito con l'atto di cessione.

In data 10/12/2018 è stato inoltrato al Servizio Edilizia Sismica di FG il progetto strutturale, unitamente alla richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'art.94 del DPR n.380/2001; il predetto Servizi con comunicazione 2018/69828 del 10/12/2018 Codice pratica 2018/01458/SIS, acquisita i data 21/12/2018 al prot.n.38701, ha autorizzato l'esecuzione dei lavori.

In data 14/12/2018 con nota prot. n.38049 è stato inoltrato al Servizio Sismico di Bari il progetto esecutivo pre-gara ed il progetto esecutivo strutturale redatto dalla impresa affidataria, comprensivo delle soluzioni progettuali emendate come da prescrizioni della Soprintendenza, ai fini dell'acquisizione della prescritta autorizzazione. Il Servizio Sismico Regionale con nota prot.n.4724 del 18/12/2018, acquisita in data 21/12/2018 al 38704, ha mosso il rilievo riguardante il mancato perseguimento dell'adeguamento prescritto dall'avviso e richiesto nella istanza di finanziamento sia per il progetto pre gara del maggio 2018 (indicatore 0,83) e sia per quello offerto dell'impresa vincitrice (0,60).

In relazione al suddetto rilievo (in data 08/01/2018 con nota prot.438) sono stati trasmessi elaborati integrativi/sostitutivi (datati 07/01/2019) richieste che hanno costituito una variante progettuale.

Gli elaborati in variante, come sopra redatti in relazione ai rilievi mossi del Servizio Sismico Regionale, sono stati inoltrati al Servizio Edilizia Sismica di FG, il quale esaminati positivamente gli atti progettuali in variante, ha concesso "l'autorizzazione in variante" sul suddetto progetto -a firma dell'ing.Clorindo Izzillo, in qualità di progettista architettonico; ing. Tommaso Monaco, progettista strutturale, incaricato dall'Appaltatrice nei termini contrattuali; arch. Nicola Iacobazzi, direttore dei lavori architettonico e ing. Michele Cirulli direttore lavori strutturali; SAV Costruzioni Srl, impresa costruttrice; dott.Massimo Grieco, geologo; arch. Matteo Morra, collaudatore (statico)-, giusta comunicazione Cod.prat.2018/01458/SIS, acquisita i data 31/01/2019 al prot. n.2728.

Il suddetto parere in variante, unitamente ai conformi elaborati progettuali assentiti, sono stati trasmessi al Servizio Sismico Regionale in data 08/02/2018.

Il suddetto Servizio Sismico con riferimento al progetto strutturale in variante relativo ai "Lavori di adeguamento sismico della scuola elementare G.Marconi" (datato 7.1.2019), ha concesso il Nulla-osta ai sensi dell'art.10 comma 1) lett.b di cui all'Avviso pubblico adottato, conformemente alla DGR 1102/2017,

con Determinazione Dirigenziale n.73/2017/185 del 10/07/2017, pubblicata sul BURP n.86 del 20/07/2017 finalizzato alla selezione di interventi per la messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio.

Con Determinazione Dirigenziale n. 174/40 del 04/03/2019 è stata approvata la variante progettuale relativa all'intervento di "Adeguamento sismico della scuola elementare G.Marconi", come dalla documentazione progettuale assentita dal Servizio Edilizia Sismica della Prov.di Foggia, giusta "Autorizzazione in Variante" con codice pratica 2018/01458/SIS comunicata in data 31/01/2019, e dal Servizio Sismico Regionale, giusto Nulla-osta rilasciato ai sensi dell'art.10, comma 1, lett.b di cui all'Avviso Pubblico adottato con D.D. n.073/2017/185 del 10/07/2017, pubblicata sul BURP n.86 del 20/07/2017 finalizzato alla selezione di interventi per la messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio.

Con la stessa Determinazione Dirigenziale n. 174/40/2019 si è dato atto che:

- il computo metrico delle lavorazioni conseguentemente variate è stato sottoscritto dall'Appaltatrice con esplicita dichiarazione di accettare la realizzazione di tutte le corrispondenti modifiche/variazioni senza alcun aggravio economico a carico dell'Amministrazione, in linea con l'impegno già assunto in sede di gara, così come prescritto dal bando-disciplinare di gara e, quindi, dal contratto di appalto;

- la variante progettuale -in ragione delle dichiarazioni dell'Appaltatrice relative al recepimento delle prescrizioni della Soprintendenza e del progetto esecutivo strutturale in variante approvato dal Servizio Edilizia Sismica di FG e dal Servizio Sismico Regionale con la corrispondente realizzazione senza alcun aggravio economico a carico dell'Amministrazione- l'importo contrattuale dei lavori resta confermato in € 1.783.006,13 (di cui € 1.736.950,00 per lavori al netto del ribasso del 2.20% ed € 46.056,13 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva al 10% per un totale, quindi, di € 1.961.306,74;

- la spesa progettuale rimane confermata in complessivi € 2.230.000,00, mentre quella post gara in relazione ai risultati di gara/affidamenti viene rideterminata in € 2.140.103,55 secondo i quadri economici pre e post gara che si intendono riapprovati secondo le risultanze riportate nelle premesse dello stesso atto, e trova capienza nel finanziamento POR PUGLIA 2014-2020 - Asse V - Azione 5.2 - Sub.-Azione 5.2.b., assegnato dalla Regione Puglia per la realizzazione dell'opera, e risulta impegnata sul capitolo 30588, codice bilancio 04.02-2.02.01.09.003, impegno 368, correlato in entrata al cap.40282, cod. bil 4.03.10.01.001, accert. 27.

Il quadro economico rideterminato pre-gara (in relazione ad un errore riscontrato nella voce di spesa relativa all'IVA sui

lavori) e quello relativo al progetto di variante post-gara, è stato approvato, con la suddetta Determinazione Dirigenziale n. 174/40/2019, secondo le seguenti risultanze:

A IMPORTO DEI LAVORI	Pre-gara Importi in €	Progetto in variante post gara
A.1. Importo dei lavori	1.776.022,49	1.736.950,00
A.2. Costi della sicurezza	46.056,13	46.056,13
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI	1.822.078,62	1.783.006,13
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE		
B.1. Verifiche geologiche e geotecniche	6.000,00	0,00
B.2. Indagini e prove sui materiali e sulle strutture pre-post intervento (sondaggi geognostici, geotermici, ecc.)	35.000,00	0,00
B.3. Direzione lavori e contabilità B.4 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	79.600,00	78.406,00
B.5. Collaudo amministrativo B.6. Collaudo statico	10.600,00	10.600,00
B.7. Oneri previdenziali INPS e Cassa	7.216,00	3.560,24
B.8. Spese per gara e pubblicità	3.000,00	3.000,00
B.9. Imprevisti (IVA compresa)	36.225,66	36.225,66
B.10. Incentivo ex. Art. 113 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.	26.640,34	26.640,34
B.11. Iva al 10% (somma di A.1+A.2)	182.207,86	178.300,61
B.12. Iva al 22% (somma di B.3+B.4+B.5+B.6+B.7)	21.431,52	20.364,57
		2.140.103,55
ECONOMIE CONSEGUITE		89.896,45
TOTALE COSTO PROGETTO	2.230.000,00	2.230.000,00

Ciò stante i DD.LL., arch. Nicola Iacobazzi e ing. Michele Cirulli, con nota acquisita in data 19/04/2019 al prot. n. 9244, hanno trasmesso, ai fini della liquidazione in loro favore del 1° acconto onorario professionale per le prestazioni inerenti i servizi di ingegneria di direzione, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza nella fase esecutiva, maturate in relazione all'avanzamento dei lavori, di cui al 1° e 2° SAL, le parcelle degli importi rispettivi di € 1.504,70 e di € 13.542,32, oltre Cassa previdenziale ed IVA come dovuta.

Vista la fattura emessa dall'arch. Nicola Iacobazzi n. 1/E del 30/04/2019, acquisita al protocollo Unimatica n. 20190513E1ZZNW00140aa - sdi 874793208, dell'importo di € 1.564,89, contributo previdenziale 4% pari ad € 60,19 compreso, non assoggettata ad IVA (codifica N2);

Vista la fattura emessa dall'ing. Michele Cirulli n. 1E del 08/05/2019, acquisita al protocollo Unimatica n. 20190508E1ZZNW00130aa - sdi 838148278, dell'importo di € 14.084,01, contributo previdenziale 4% pari ad € 541,69 compreso, non assoggettata ad IVA (codifica N2);

Dato atto che le fatture non rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti in quanto sono state emesse successivamente all'entrata in vigore (14.07.2018) del D.L. n.87 del 12.07.2018, coordinato con la Legge di conversione 09/08/2018, n. 96, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11/08/2018 n. 186, il quale all'art.12 ha disposto l'abolizione del meccanismo della scissione dei pagamenti, split payment, per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte (compensi dei professionisti);

Dato atto che la spesa complessiva, di cui alle suddette fatture, di € 15.648,90, trova capienza nel finanziamento POR PUGLIA 2014-2020 - Asse V - Azione 5.2 - Sub.-Azione 5.2.b., assegnato dalla Regione Puglia per la realizzazione dell'opera, e risultano impegnate sul Cap. 30588, impegno 368, sub. 3, cod. bilancio 04.02-2.02.01.003 - Bilancio 2018, correlato in entrata al cap.40282, cod. bil 4.03.10.01.001, accert. 27-2018;

Acquisite le dichiarazioni rilasciate, ai sensi dell'art.3 comma 7 della L. 136/2010 e verificata la regolarità contributiva dei professionisti, si ritiene, considerata la regolarità degli atti e su parere del RUP, geom. Rosaria Rinaldi, di procedere al riconoscimento e contestuale liquidazione della spesa complessiva di cui alle esibite fatture, ad avvenuto accredito delle necessarie somme da parte della Regione Puglia, finanziatrice dell'opera.

Al progetto in argomento è stato attribuito il CUP: J39H18000100002; ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex Art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito con modificazioni nella legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", all'attività inerente l'appalto dei lavori è stato assegnato il CIG: 7737959DC2.»

Visti il D. Lgs. 50/2016 ed il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti DPR. 207/2010 per le parti non abrogate;

Visto il T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Visti gli adempimenti ex artt. 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, si dispone la pubblicazione del presente atto, nella sezione del link "Amministrazione trasparente", sotto sezione "bandi di gara e contratti";

Vista la Delibera di G.C. n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita

dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Vista la Delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il Decreto del Sindaco del 25/09/2018, prot. n. 28499, con il quale sono rideterminati gli incarichi dirigenziali, affidando all'ing. Clorindo Izzillo, la Dirigenza del Settore Servizi Tecnici Lavori Pubblici - Ambiente;

Visto il Decreto del Sindaco prot. n. 9123 del 18/04/2019, con il quale è stato incaricato l'ing. Vito Mastroserio di assumere le funzioni dell'Ing. Clorindo Izzillo, assente per congedo ordinario;

Visto il Decreto del Sindaco del 03/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2019;

D E T E R M I N A

1) la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di approvare le parcelle esibite dall'arch. Nicola Iacobazzi e dall'ing. Michele Cirulli, relative al 1° acconto onorario professionale per le prestazioni inerenti i servizi di ingegneria di direzione, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza nella fase esecutiva dei lavori di "Adeguamento sismico della scuola elementare G.Marconi" - CUP: J39H18000100002, maturate in relazione all'avanzamento dei lavori, di cui al 1° e 2° SAL, degli

importi rispettivi di € 1.504,70 e di € 13.542,32, oltre Cassa previdenziale ed IVA come dovuta;

3) di liquidare, ad avvenuto accredito delle necessarie somme da parte della Regione Puglia, finanziatrice dell'opera:

- a favore dell'arch. Nicola Iacobazzi, la somma di € 1.564,89, contributo previdenziale 4% pari ad € 60,19 compreso, non assoggettata ad IVA (codifica N2), come da relativa fattura n. 1/E del 30/04/2019, acquisita al protocollo Unimatica n. 20190513E1ZZNW00140aa - sdi 874793208 - CIG: 7737959DC2;

- a favore dell'ing. Michele Cirulli, la somma di € 14.084,01, contributo previdenziale 4% pari ad € 541,69 compreso, non assoggettata ad IVA (codifica N2), come da relativa fattura n. 1E del 08/05/2019, acquisita al protocollo Unimatica n. 20190508E1ZZNW00130aa - sdi 838148278 - CIG: 7737959DC2;

4) di dare atto che la spesa complessiva, di cui alle esibite fatture, di € 15.648,90, trova capienza nel finanziamento POR PUGLIA 2014-2020 - Asse V - Azione 5.2 - Sub.-Azione 5.2.b., assegnato dalla Regione Puglia per la realizzazione dell'opera, e risulta impegnata sul Cap. 30588, impegno 368, sub. 3, cod. bilancio 04.02-2.02.01.003 - Bilancio 2018, correlato in entrata al cap.40282, cod. bil 4.03.10.01.001, accert. 27-2018;

5) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2019, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

6) di liquidare la detta spesa di € 15.648,90, al suddetto capitolo ed impegno, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n.4/2 al D.Lgs. 118/2011, imputandola al bilancio 2019;

7) di dare giusta ed opportuna comunicazione del presente provvedimento alla Regione Puglia - Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, Lungomare Nazario Sauro n. 33 - Bari, finanziatrice dell'opera;

8) di dare atto che la redazione del presente provvedimento è stata assegnata al geom. Alfonso Dipasquale in servizio presso l'Ufficio Lavori Pubblici.

IL Dirigente DEL SETTORE

Mastroserio Ing. Vito

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell'art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000

attesta

la copertura finanziaria.

La spesa complessiva di € 15.648,90 (CIG. 7737959DC2) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

POR PUGLIA 2014-2020 Asse V Azione 5.2 Sub.-Azio n. 664 del 17-05-2019 CIG 7737959DC2	
Su Impegno N° 3 sub n° 3 del 03-10-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 285 Determinazione Servizi Tecnici del 03-10-2018 avente per oggetto Affidamento dei servizi di ingegneria, consistenti nella direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, inerenti i lavori di adeguamento sismico della scuola elementare G. Marconi. C.I.G. 761387506B. Det	
Missione Programma 5° livello 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	
Capitolo	30588 Articolo PROG. MESSA SICUREZZA SISMICA SC. ELEM. MARCONI - CONTR. STATALE
Causale	POR PUGLIA 2014-2020 Asse V Azione 5.2 Sub.-Azione 5.2.b. Lavori di "Adeguamento sismico della scuola elementare G.Marconi". Approvazione e liquidazione 1° acconto onorario professionale per le prestazioni inerenti i servizi di ingegneria di dire
Importo	€ 15.648,90
Beneficiario	3617 IACOBazzi NICOLA
Quietanza	BONIFICO IBAN IT6810103078380000001884337

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal al , come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città,

IL Responsabile AA.GG
VALENTINO MARIA CONCETTA
