



Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4550

del 07-12-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	30594	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 2 (04.02-2.02.01.09 003)	Gest.	RESIDUI/2017
MESSA IN SIC. NON STRUTT. SC. ELEM. CARDUCCI - CONTR. STATALE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Tecnici LL.PP. Ambiente		nr. 149	del 04-12-2018
numero 1685/2014 del 05-12-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Delibera CIPE n.6 del 20.01.2012 -Programma straordinario stralcio di interventi urgenti nel patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non st							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA		245.671,95	246.623,00
Programma	02	Altri ordini di Istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	0,00
Titolo	2	Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO		4.160,00	4.160,00
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO		4.160,00	
3o Livello	01	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA		241.511,95	242.463,00
4o Livello	09	Beni immobili					
5o Livello	003	Fabbricati ad uso scolastico					
SIOPE	2020109003						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 4) CONTRIBUTI REGIONALI					Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 4.160,00 diconsi QUATTROMILACENTOSESSANTA/00							
Per : Delibera CIPE n.6 del 20.01.2012 -Programma straordinario stralcio di interventi urgenti nel patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non st							

CREDITORE (Codice: 466)				
ZAGARIA IGNAZIO		VIA ALDO MORO,159		
Cod.Fis. ZGRGNZ62P23C514M / P.Iva 01886750718		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:Z45130B224 SALDO Fatt.n. 2/E del 22/11/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA PRIMARIA 'GIOSUE' CARDUCCI' IN VIA EGMONT N. 1 DA REALIZZARE ALL'INTERNO DELL'ABITATO DEL COMUNE DI CERIGNOLA(FG). SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE E	4.160,00		2109
			4.160,00	
MODALITA' DI	C/C BANCARIO 26000018 ABI 01010 CAB 78381 BANCA S.PAULO B.NA AG.2 - CIN:Z - ABI:01010 - CAB:78381 - C/C:000026000018			
PAGAMENTO	IBAN:IT77Z0101078381000026000018		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	

Bollo
dell'ente

Resp/ Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4550 CAP. 3594 BIL. RE 2017

IMPEGNO N. 1033 / 2014 LIQUIDAZIONE N. 1685

(A) ONORARIO	€ <u>4000,00</u>
(B) CONTRIB. CASSA (<u>4</u> %) DI A	€ <u>160,00</u>
(C) IMPONIBILE IVA (TOTALE A + B)	€ <u>4160,00</u>
(D) IVA AL 22 % DI C	€ <u> </u>
(E) SPESE ESENTI	€ <u> </u>
(F) TOT.FATTURA(C + D + E)(TOT.MANDATO)	€ <u>4160,00</u>
(G) RITENUTA DEL 20% SU A	€ <u> </u>
TOTALE DA LIQUIDARE A CREDITORE (F-G)	€ <u> </u>

REVERSALE N.

CREDITORE: COD.N. (466.) Fagnano Iguzzo

PAGAMENTO FATTURA N. 2/E del 21/11/18

PROT. ENTRATA N. 35722 del 03/12/18

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. 5264

DESCRIZIONE: liquidazione onorari di pagella
variante 1st. Sed. Carducci

TOTALE FATTURA € 4160,00

CIG: 845130B224

CUP: 536E12000660001

SIOPE: 209

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 1149 del 04/12/18



COMUNE DI CERIGNOLA

Prot.n° 36457

Settore Lavori Pubblici, Manutenzione, Ambiente e Verde Pubblico

Cerignola,

6 DIC 2018

OGGETTO: Delibera CIPE n.6 del 20.01.2012 pubblicata sulla GURI n.88 del 14.4.2012 – secondo stralcio – Regione Puglia - Programma straordinario stralcio di interventi urgenti nel patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, dell'edificio Scolastico "G.Carducci" - Intervento n 00612PUG134- codice MIUR: FG EE028013 – **CUP: J36E12000660001.**– Liquidazione acconto compensi relativi alla progettazione della variante – **CIG Z45130B224.**

Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Adriano Saracino
SEDE

Invito la S.V. a voler disporre il pagamento a favore dell'arch. Ignazio Zagaria, a titolo di acconto sugli onorari dovuti per la progettazione della variante dei lavori di messa in sicurezza dell'edificio scolastico G. Carducci, dell'importo di complessivi € 4.160,00 contributo cnpaia 4% pari ad € 160,00 compreso, a saldo fattura n.2/E del 22/11/2018, acquisita al protocollo n.35722 del 3/12/2018 - sdi 130300749 (non assoggettata ad iva in quanto prestazione effettuata in regime contribuenti minimi), giusta quanto disposto con Atto di Liquidazione n. 519/149 del 05.12.2018.

Il suddetto importo dovrà essere corrisposto mediante bonifico da effettuarsi sul conto corrente bancario opportunamente comunicato dalla stessa impresa, giusta comunicazione in atti, ai fini della tracciabilità dei movimenti finanziari in questione (art.3, comma 7 della L.136/2010). Il relativo mandato di pagamento dovrà essere emesso in duplice esemplare, ai fini della rendicontazione delle spese alla Regione Puglia, Ente finanziatore dell'opera..

La spesa di € 4.160,00, trova disponibilità alle corrispondenti voci di quadro economico dell'opera ed imputazione sul capitolo 30594 codice 4.02-2.02.01.09.003 - impegno n. 1033_2014, sub 2 RE 2017, liquidazione n. 1685 (a valere sull'accredito di € 115.708,00 dalla stessa Regione effettuata a titolo di 1^ erogazione in conto contributo – cap. E.40263 c.bil.4.03.10.01.001 accert.64).

IL DIRIGENTE DI SETTORE
ing. Clorindo Izzillo

Si Allega:

- * fattura elettronica esibita dal professionista;
- * regolarità contributiva;
- * comunicazione con estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato alla commessa pubblica in argomento.

Notifica Esito Committente

Versione 1.0

Identificativo Sdl: 130300749

Riferimento Fattura

Numero Fattura: 2/E

Anno Fattura: 2018

Posizione Fattura: 1

Esito: **EC01** (Accettazione)

Descrizione: **Fattura accettata**

Message Id Committente: **001**

Prot. 33122 AL 3-12-2018



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: ALB1671115
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01886750718
Codice fiscale: ZGRGNZ62P23C514M
Nome: IGNAZIO
Cognome: ZAGARIA
Regime fiscale: RF19 (Regime forfettario)

5264
666**Dati della sede**

Indirizzo: VIA PERUGIA
Numero civico: 6
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885426142
E-mail: ignazio.zagaria@alice.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA
Numero civico: 1
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426
Denominazione: Namirial SPA

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2018-11-22** (22 Novembre 2018)
 Numero documento: **2/E**
 Importo totale documento: **4160.00**
 Causale: **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA PRIMARIA 'GIOSUE' CARDUCCI' IN VIA EGMONT N. 1 DA REALIZZARE ALL'INTERNO DELL'ABITATO DEL COMUNE DI CERIGNOLA(FG). SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI IN OGGETTO DELL'APPROVAZIONE DELLA VARIANTE COME DA D.D. N. 62/17 DEL 10/02/2015 E N. 1406/169 DEL 14/11/2017 - SECONDO ACCONTO IMPEGNO SPESA 1033-2014 SUB 2**
 Causale: - **CAPITOLO 30594 - CIG Z45130B224 - CUP J36E12000660001. OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA D'ACCONTO**

Bollo

Bollo virtuale: **SI**
 Importo bollo: **2.00**

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC04** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)
 Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
 Importo contributo cassa: **160.00**
 Imponibile previdenziale: **4000.00**
 Aliquota IVA applicata: **0.00**
 Tipologia di non imponibilità del contributo: **N2** (non soggette)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA PRIMARIA 'GIOSUE' CARDUCCI' IN VIA EGMONT N. 1 DA REALIZZARE ALL'INTERNO DELL'ABITATO DEL COMUNE DI CERIGNOLA(FG). SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI IN OGGETTO DELL'APPROVAZIONE DELLA VARIANTE COME DA D.D. N. 62/17 DEL 10/02/2015 E N. 1406/169 DEL 14/11/2017 - SECONDO ACCONTO**
 Valore unitario: **4000.00**
 Valore totale: **4000.00**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N2** (non soggetta)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
 SERVIZI TECNICI
 Lavori Pubblici - Ambiente
 Ing. Ciriaco Luzzo

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
 Natura operazioni: **N2** (non soggette)
 Totale imponibile/importo: **4160.00**
 Totale imposta: **0.00**
 Riferimento normativo: **REGIME FORFETTARIO (ART.1, C.54-89, L. 190/2014)**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Importo: **4160.00**
 Codice IBAN: **IT68S0101078382100000004494**

Versione prodotta con foglio di stile Sei www.fatturapa.gov.it



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N.

In data

Atto Reg. Sett. N. **149**

In data **04-12-2018**

OGGETTO: Delibera CIPE n.6 del 20.01.2012 -Programma straordinario stralcio di interventi urgenti nel patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, dell'edificio Scolastico "G.Carducci" - Liquidazione acconto onorari di progettazione variante.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **quattro** del mese di **dicembre**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI TECNICI LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

LAVORI PUBBLICI

Izzillo Ing. Clorindo, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

«Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, Molise, la Puglia e la Basilicata - sede coordinata di Bari, al fine di prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità di elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici, ha disposto apposito sopralluogo presso l'edificio sede della scuola elementare G. Carducci, effettuato da proprio Tecnico rilevatore in data 02.07.2009, durante il quale sono state riscontrate problematiche appositamente riportate nella predisposta scheda di rilevamento.

Con delibera C.I.P.E. n. 6 del 20.01.2012 pubblicata sulla G.U.R.I. n.88 del 14.04.2012, è stata disposta l'assegnazione di risorse per la realizzazione del "Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici - Secondo Stralcio".

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche - sede coordinata di Bari, con nota prot.0007493 del 04/07/2012 acquisita al protocollo generale n.16014 del 06.07.2012, ha trasmesso lo schema di convenzione relativo al Programma di cui sopra, nell'ambito del quale è compreso l'intervento finalizzato alla messa in sicurezza dell'edificio scolastico "G. Carducci".

In data 29/10/2012, presso il competente Ufficio del Provveditorato, si è proceduto, tra l'altro, alla sottoscrizione della "Convenzione" inerente l'intervento in argomento.

Con nota Ministeriale prot. n.7211 del 06/05/2014, acquisita al prot. n. 11362 del 15/05/2014, la Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali - Div.1^a, ha trasmesso la Convenzione regolante i rapporti fra Stato ed Ente attuatore n. 19368 del 21.11.2013, comunicando che l'Ufficio Centrale di Bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, avendo ottenuto la registrazione da parte della Corte dei Conti al reg.1 foglio 714 del 7/02/2014, ha vistato col n. 176 del 9.1.2014 il Decreto prot. n.19825 del 26.11.2013 di approvazione della stessa Convenzione relativa all'intervento n. 006612PUG134 in argomento.

Con il medesimo Decreto è stato altresì assunto l'impegno a favore del Comune di Cerignola dell'importo complessivo di € 257.130,00 finalizzato alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali nell'edificio scolastico "G. Carducci" in via Egmont 1 - CUP: J36E12000660001.

La spesa progettuale è stata imputata al bilancio 2014, capitolo 30594, impegno 1033, correlato al finanziamento statale ed al capitolo di entrata 40263, bilancio 2014, accert. 64.

Non potendo l'Ufficio Tecnico di questo Comune provvedere alla progettazione esecutiva, sicurezza in fase di progettazione, direzione, coordinamento della sicurezza in fase d'esecuzione, alla misura e contabilità dei lavori, data la ormai accertata e più volte carenza di personale, e preso atto della dichiarata indisponibilità all'espletamento delle stesse prestazioni da parte di personale del Provveditorato, giusta nota acquisita al prot.n.21188 del 23.9.2014, con determinazione dirigenziale n. 62/17 del 10.02.2015 è stato incaricato l'arch. Ignazio Zagaria

(CIG Z45130B224), tecnico esterno alla struttura comunale, in possesso dei requisiti per poter espletare l'incarico in argomento, nel rispetto dei principi di cui alla vigente normativa in materia di LL.PP.

In data 09.03.2015 è stato sottoscritto con l'arch. Ignazio Zagaria apposito disciplinare-convenzione d'incarico.

Il citato professionista, ad espletamento delle sue funzioni, ha trasmesso in data 01.4.2015 il progetto di manutenzione straordinaria finalizzato alla messa in sicurezza dell'edificio scolastico G. Carducci, il quale è stato sottoposto come da "Convenzione" all'esame del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche -sede coordinata di Bari.

Con nota pec n.4802 del 18.5.2015 lo stesso Provveditorato, pur accertando che il progetto, compatibilmente con il finanziamento disponibile comprende gli interventi rilevati più urgenti ed indicati nel giudizio sintetico di cui alla scheda tecnica di rilevamento del 02.07.2009, ha mosso delle osservazioni fra cui la necessità della relazione di calcolo della capriata posta al secondo piano della scuola stessa, visto che il progetto ne prevede la sostituzione, nonché l'acquisizione del preventivo parere ai sensi dell'art.21 del D.Lgs 42/2004 da parte della Soprintendenza, data la valenza storica artistica dell'immobile di età superiore a 50 anni.

Con determinazione dirigenziale n.570/4 del 24/08/2015 è stato incaricato l'ing.Nicola Rizzo, con studio in Cerignola, della progettazione esecutiva della capriata in legno posta al secondo piano della scuola elementare "Carducci" (CIG:Z0B1558567).In data 26.08.2015 è stato sottoscritto apposito disciplinare di incarico. Il Professionista, ad espletamento dell'incarico, ha trasmesso in data 1.10.2015 il progetto esecutivo della capriata.

Il progetto rielaborato dall'arch.Ignazio Zagaria in relazione alle integrazioni richieste dal Provveditorato, è stato inviato per l'acquisizione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 42/2004 alla competente Soprintendenza alle Belle Arti e Paesaggio per le province di Bari, Barletta-Andria- Trani e Foggia, con sede in Bari, la quale con nota 7091 del 13.11.2015, acquisita al prot.n.30289 del 17/11/2015, ha autorizzato l'esecuzione delle opere con prescrizioni.

Con delibera n. 369 del 30.12.2015 la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo, adeguato nei termini di cui alle prescrizioni del Provveditorato ed al parere della competente Soprintendenza, il quale è stato sottoposto all'acquisizione del prescritto definitivo parere da parte del Provveditorato, in osservanza dell'art.3, comma 1, della citata "Convenzione".

In data 17.02.2016 è stato acquisito al prot.n.4827 il parere favorevole rilasciato con voto n.20 dell'11.02.2016 dal Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise la Puglia e la Basilicata - sede coordinata di Bari.

In relazione al suddetto parere e ad alcune precisazioni esposte dal CTA è stato rimodulato il quadro economico di spesa.

Con determina della CUC del Tavoliere n. 09 del 07/04/2016, preso atto della determinazione dirigenziale n.258/12 del 06/04/2016 con la quale per l'espletamento della gara di appalto dei lavori è stata individuata la procedura negoziata di cui

all'art.57, comma6 del D. Lgs. 163/2006, si è proceduto all'indizione della gara. La lettera di invito prot.n.25 del 07/04/2016 è stata inviata alla Ditte via pec in pari data.

Con determinazione della Centrale Unica di Committenza CUC, n. 15 del 26/04/2016 è stata costituita la Commissione di gara composta dal Dirigente ing. Clorindo Izzillo, Presidente e dai componenti Dott.ssa Maria Valentino e dott.ssa Maria Dettori.

Con determinazione dirigenziale del Settore Lavori Pubblici n.561/67 del 14/07/2016, riscontrata la regolarità della procedura seguita nell'esperimento di gara e preso atto del verbale della Commissione del 27/04/2016, si è proceduto all'aggiudicazione definitiva a favore della ditta Cadinvest srl (codice fiscale e partita IVA: 01934460716), con sede in Cerignola alla Via Sestriere n.2, per il prezzo di € 132.677,12 al netto del ribasso offerto del 22,488% sulla base d'asta di € 171.169,78, oltre a € 10.334,31 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, e per un totale complessivo di contratto per lavori pari a € 143.011,43, oltre iva come dovuta.

In relazione al risultato di gara, con la citata determinazione n.561/67 del 14/07/2016 è stato rideterminato il quadro economico, secondo le risultanze nella stessa riportate.

Tra la citata aggiudicataria e l'Amministrazione è stato stipulato il relativo contratto di appalto repertorio n.184 del 12/10/2016, sottoscritto in modalità digitale e registrato a Cerignola in data 12/10/2016 col n.2672 Serie 1T.

I lavori sono stati consegnati in data 18/10/2016, giusto verbale in atti, ed iniziati in pari data.

Successivamente alla consegna dei lavori, il RUP ing. Clorindo Izzillo ha informato il Direttore dei lavori della esistenza di un'indagine diagnostica sugli elementi strutturali e non strutturali dei solai dell'edificio scolastico in argomento - effettuata nell'ambito della Legge 13/07/2015 n.107 e successivo decreto del MIUR n.933 del 10/12/2015 allo scopo di garantire la sicurezza degli edifici scolastici e prevenire eventi di crollo dei relativi solai e controsoffitti - le cui risultanze sono state documentate con elaborati progettuali acquisiti in data 12.09.2016 ed approvati con determinazione dirigenziale n.848/146 del 21/10/2016 (successivi alla redazione del progetto esecutivo appaltato ed anche alla definitiva aggiudicazione dei lavori).

Gli esiti delle indagini effettuate dal tecnico esterno a ciò incaricato, ing. Michele Tufariello, hanno evidenziato delle criticità strutturali e non, di tutta la scuola Carducci, che - come da valutazioni conclusive dello stesso tecnico- *"hanno alla radice il problema della tipologia costruttiva dei solai utilizzati, particolarmente vulnerabili alle infiltrazioni, poco rigidi, eccessivamente sensibili alle sollecitazioni che inducono vibrazioni e poco adattabili alle attuali esigenze impiantistiche"*; dal che la conseguente necessità (suggerita dallo stesso tecnico) di operare interventi di consolidamento strutturale dei solai e, successivamente, nuovi interventi non strutturali (controsoffitti e impianto di illuminazione) più adeguati, atti a migliorare le condizioni di sicurezza dell'edificio stesso.

Nella nottata del 25/10/2016, presso la sede del plesso scolastico "Giosuè Carducci" è avvenuto il distacco di una parte

del solaio, con pignatte a vista, all'interno del bagno alunni posto al piano terra, provocando il cedimento della controsoffittatura sottostante.

A seguito del suddetto evento e tenuto conto delle risultanze delle indagini, con Ordinanza Sindacale n.92/2016 del 25/10/2016 è stata disposta la sospensione delle attività didattiche ed amministrative del plesso "G. Carducci" ad horas e, comunque, la chiusura dell'intera struttura scolastica, salvo diverse determinazioni.

In data 27/10/2017, in relazione a quanto sopra, è stata effettuata la sospensione dei lavori in argomento, appaltati alla Ditta Cadinvest Srl.

Il RUP, ricorrendo i presupposti di legge per le varianti in corso d'opera (art.132 del D.Lgs.163/2006, comma 1 lett.b)), ha autorizzato il direttore dei lavori, arch. Ignazio Zagaria, alla redazione di opportuna perizia di variante e suppletiva volta alla risoluzione delle emerse nuove contingenze e criticità, impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale.

Il Direttore dei lavori ha redatto la variante, acquisita in data 23/10/2017 al prot.n.31099, la quale è stata approvata con determinazione dirigenziale n.1406/169 del 14/11/2017.

La stessa ha considerato lavorazioni diverse e maggiori rispetto a quelle inizialmente previste, compensate in parte con minori lavorazioni, che se pure necessarie sono passate in subordine rispetto ad altri interventi aventi carattere prioritario, ed in parte con la utilizzazione delle economie di gara (riportate nella voce "imprevisti"). Le diverse maggiori lavorazioni e/o apprestamenti non modificano la natura del contratto in argomento.

Gli interventi più significativi previsti in variante, finalizzati al miglioramento in termini di sicurezza dell'opera, riguardano:

interventi previsti nel progetto appaltato e confermati:

- rimozione e sostituzione di un discendente pluviale esterno;
- sostituzione del tetto in legno di copertura del secondo piano (capriate);

interventi in variante;

- consolidamento di solaio esistente in ferro e laterizio;
- sostituzione della guaina impermeabilizzante della copertura piana del secondo piano.

L'importo per lavori è stato rideterminato in € 148.786,07 al netto del ribasso d'asta del 22,488% (applicato sull'importo computato di € 191.952,31), mentre gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso in € 16.163,36 stabilendo, pertanto, in € 164.949,43 il nuovo importo contrattuale, con un incremento del 15,34% pari ad € 21.938,00 (€ 16.108,95 per lavori ed € 6.829,05 per o.s.), oltre relativa IVA al 22%, che trova copertura con la parziale utilizzazione delle economie di gara (voce "imprevisti").

Il termine per la esecuzione dei lavori, fissato dall'art.18 del Capitolato Speciale d'Appalto e dall'art.3 del contratto di appalto in 186 giorni consecutivi decorrenti dalla consegna dei lavori, per effetto dei maggiori/diversi lavori di cui alla variante in argomento, è stato prorogato di 30 giorni.

Il quadro economico di perizia ha confermato la spesa progettuale di € 257.130,00, come di seguito definita, finanziata con il contributo ministeriale ottenuto per la realizzazione dell'opera, correlato al capitolo di entrata 40263, bilancio 2014, accert. 64 ed imputazione al capitolo 30594, bil.2014, impegno 1033 cod. bilancio 4.02-2.02.01.09.003:

LAVORI	Come da Precisazioni CTA	Post gara d'appalto	Perizia di variante e suppletiva
importo dei lavori/ lavori al netto del ribasso del 22,488%	171.169,78	132.677,12	148.786,07
Oneri di sicurezza	10.334,31	10.334,31	16.163,36
TOTALE LAVORI	181.504,09	143.011,43	164.949,43
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Iva sui Lavori (22%)	39.930,90	31.462,52	36.288,87
Spese di natura strumentale ex art.92, comma 7 bis, D.Lgs 163/2006	726,02	726,02	726,02
Imprevisti (comprensivi di IVA)	9.786,56	56.747,60	
Contributo Anac	225,00	225,00	225,00
Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase esecutiva, certificato regolare esecuzione - redazione variante	15.368,85	15.368,85	30.000,00
Calcolo strutturale e deposito presso la struttura territoriale competente	4.301,26	4.301,26	13.301,29
CNPAIA AL 4%	786,80	786,80	1.732,05
Iva AL 22% su spese tecniche e cnpaia 4%	4.500,52	4.500,52	9.907,34
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	75.625,91	114.118,57	92.180,57
TOTALE QUADRO ECONOMICO	257.130,00	257.130,00	257.130,00

Sulla perizia di variante sono stati acquisiti i pareri da parte della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di BAT e Foggia, giusta autorizzazione prot.n.419 del 18/01/2018, e dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise la Puglia e la Basilicata - sede coordinata di Bari, giusta nota prot.8487 del 20.09.2018 di comunicazione del parere favorevole rilasciato con voto n.69 dell'11.07.2018 dal Comitato Tecnico Amministrativo dello stesso Provveditorato.

In relazione all'intervento di consolidamento del solaio del secondo piano, previsto in variante, il Direttore dei lavori ha predisposto il relativo progetto strutturale sul quale è stata ottenuta l'autorizzazione sismica registrata in data 25/11/2017 cod.pratica 2017/01377/SIS da parte del preposto Ufficio Edilizia sismica della Provincia di Foggia ed acquisita agli atti in data 05/12/2017 al prot.n.35678.

Ciò stante, l'arch. Ignazio Zagaria con nota acquisita in data 01/10/2018 al prot. n.29169 ha trasmesso la parcella professionale generale per la prestazione di progettazione della variante, di direzione, misura e contabilità dei lavori, nonché richiesto una quota degli onorari inerenti la redazione della perizia di variante e suppletiva, come da fattura-proforma.

In relazione citato professionista ha emesso opportuna fattura n.2/E del 22/11/2018, acquisita al protocollo n. 35722 del 03/12/2018 - sdi 130300749, dell'importo di € 4.000,00, oltre contributo cnpaia 4% pari ad € 160,00, non soggetta ad iva in quanto prestazione effettuata in regime forfettario (operazione

effettuata ai sensi dell'art.1, commi da 54 a 89 della L.190/2014).

Preso atto della regolarità contributiva del professionista nei confronti dell'inarcassa ed acquisita la dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art.3 comma 7 della L.136/2010.

Dato atto che la relativa spesa di complessivi € 4.160,00 trova capienza alle corrispondenti voci di quadro economico dell'opera ed al finanziamento ottenuto per la realizzazione dell'opera, con imputazione sul capitolo 30594 codice 4.02-2.02.01.09.003 - impegno n. 1033-2014, sub 2, RE 2017.

All'intervento è stato attribuito il CUP: J36E12000660001; ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex Art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12 novembre 2010, n.187 convertito con modificazioni nella legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", all'attività inerente l'affidamento dei lavori è stato attribuito il CIG: 6649669872, mentre a quella relativa alla prestazione professionale di progettazione, coordinamento della sicurezza, D.L., misure e contabilità dei lavori il CIG: Z45130B224.»

Visti gli adempimenti ex artt. 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, si dispone la pubblicazione del presente atto, nella sezione del link "Amministrazione trasparente", sotto sezione "bandi di gara e contratti";

Vista la vigente normativa in materia di lavori pubblici;

Visto il D.Lgs.n.50 del 18/04/2016;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di adozione del Piano Economico di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020;

Visto l'Allegato n.4/2 al D.Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 03/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab. e prorogata con decreto n.160 del 01/09/2017, del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2019;

Visto il decreto del Sindaco del 25/09/2018, prot. n. 28499, con il quale si ridefinisce e si affida all'ing. Clorindo Izzillo, la Dirigenza del Settore Servizi Tecnici-Lavori Pubblici-Ambiente, comprendente i Servizi Lavori Pubblici, Ambiente e Verde Pubblico;

D E T E R M I N A

1) la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di prendere atto della parcella professionale generale esibita dall'arch. Ignazio Zagaria inerente la prestazione di progettazione della perizia di variante e suppletiva, di direzione, misura e contabilità dei lavori per la "Messa in sicurezza e prevenzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, della scuola elementare G. Carducci" CUP: J36E12000660001;

3) di liquidare a favore del citato professionista, arch. Ignazio Zagaria la somma di € 4.160,00, contributo cnpaia 4% pari ad € 160,00 compreso, non soggetta ad iva in quanto prestazione effettuata in regime forfettario, come da relativa fattura n.2/E del 22/11/2018, acquisita al protocollo n. 35722 del 03/12/2018 - sdi 130300749 - CIG: Z45130B224, dandosi atto che la relativa spesa trova imputazione sul capitolo 30594 codice 4.02-2.02.01.09.003 - impegno n. 1033-2014, sub 2, RE 2017, correlato al capitolo in entrata 40263, bilancio 2014 cod. 4.03.10.01.001, accert. 64, ed al finanziamento Ministeriale assegnato per la realizzazione dell'opera;

4) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2018, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

5) di liquidare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la detta spesa di € 4.160,00, al suddetto capitolo ed impegno, imputandola al bilancio 2018;

6) di dare opportuna comunicazione del presente atto alla competente Struttura del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise la Puglia e la Basilicata - sede coordinata di Bari, nei termini di cui alla citata "Convenzione", ai fini della rendicontazione delle spese;

7) di dare atto che la redazione del presente atto è stata assegnata alla sig.ra Battaglini Anna, in servizio presso l'Ufficio Lavori Pubblici.

IL Dirigente DEL SETTORE

Izzillo Ing. Clorindo

inarcassa


CASSA NAZIONALE
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI
LIBERI PROFESSIONISTI

DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Ufficio Ciclo Attivo

Documento pervenuto a mezzo informatico
consultabile integralmente nel Protocollo informatico

Protocollo: -- Inarcassa.1553189.30-11-2018

1/6



361852/171.2.1/STAP03

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA
UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA FG

Roma, 30 novembre 2018

Oggetto: certificato di regolarità contributiva Arch. Ignazio Zagaria - richiesta del 30/11/2018

L'Arch. Ignazio Zagaria, nato a CERIGNOLA FG il 23/09/1962, codice fiscale ZGRGNZ62P23C514M, matricola 361852 iscritto nei ruoli previdenziali di Inarcassa, alla data del 30/11/2018, risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di questa Associazione, per quanto accertato in relazione alle comunicazioni annuali inviate.

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
(Fabrizio Fiore)

Fabrizio Fiore

Il presente certificato viene rilasciato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.50/2016. E' prodotto in carta semplice per gli usi consentiti dalla Legge, ha validità quattro mesi dalla data di rilascio e non preclude l'azione di accertamento e il recupero di eventuali somme che risultassero successivamente dovute.

dott. arch. Ignazio Zagaria
via Perugia n.6 - 71042 Cerignola (FG) - tel. 0885 / 42.61.42 - cell. 338/3363124 - e mail ignazio.zagaria@alice.it
P.IVA 01886750718 - C.F. ZGRGNZ62P23C514M - CODICE IBAN : IT77 2010 1078 3810 0002 6000 018.

Al Dirigente LLPP
Ing. Clorindo IZZILLO
p.zza della Repubblica 1
71042 - Cerignola (FG)

OGGETTO: Lavori di Manutenzione Straordinaria scuola primaria "Carducci",
Via Egmont n. 1 COMUNICAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO.

Il sottoscritto arch. ZAGARIA Ignazio, con studio professionale a Cerignola (FG) in via Perugia n.6, con la presente comunica ai *ai sensi dell'art.3, comma 7, l.n. 136/2010, gli estremi del* conto corrente dedicato da utilizzarsi per tutti i contratti stipulati o che saranno stipulati con il comune di Cerignola, all'uopo trasmette i seguenti dati personali :

Cognome: ZAGARIA
Nome: IGNAZIO
Professione: ARCHITETTO (LIBERO PROFESSIONISTA)
Data di nascita: 23 / 09 / 1962
Luogo di nascita: CERIGNOLA (FG)


Residenza: CERIGNOLA (FG), C.so A. Moro n. 159


Studio Tecnico: CERIGNOLA (FG), via Perugia n. 6
Recapito telefonico : 0885 / 42.61.42
Cellulare: 338/3363124
Posta elettronica : ignazio.zagaria@alice.it - ignazio.zagaria@pec.it
Codice Fiscale: ZGRGNZ62P23C514M
Partita IVA : 01886750718
CODICE IBAN : IT77 2010 1078 3810 0002 6000 018.

Si allega alla presente:

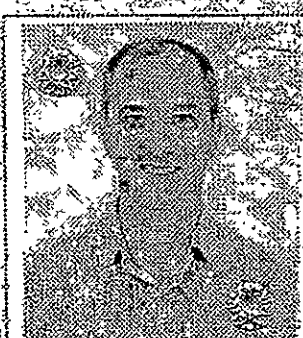
1. Copia del documento di identità;

Cerignola li 19 aprile 2016

IN FEDE

(Arch. ZAGARIA Ignazio)

Cognome	ZANARIA
Nome	IGNAZIO
Data di nascita	24-09-1962
Luogo di nascita	171 1 A 1962
Comune di nascita	CERIGNOLA (FG)
Nazione	Italiana
Cittadinanza	CERIGNOLA (FG)
Residenza	CORSO UGO ALDO 459
Via	CONCORSO
Stato civile	CASSA 1127/97 ART 2
Professione	
Comunità	CONTRASSEGNI SALENTI
Statura	178
Capelli	Grizzolati
Occhi	Castani
Segni particolari	NESSUNO

	Firma del titolare CERIGNOLA 1962-2015
Immagine del capo indice sinistro	
