



Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1792

del 03-05-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	30596	Art	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 2 (04 02-2 02 01 09 003)	Gest.	RESIDUI/2014
MESSA IN SIC. NON STRUTT. SC. ELEM. - ITIS A. RIGHI - CONTR. STATALE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AREA AMM. TECNICA		nr. 316	del. 22-03-2017
numero 316/2014		del 20-03-2017		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Delibera CIPE n.6/2012 - Programma straordinario stralcio interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, prevenzione e riduzione rischio connesso alla vulnerabilità elementi anche non strutturali - Istituto ex ITIS							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA		444.493,40	820.872,14
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI		270.125,62	270.125,62
Titolo	2	Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO		8.467,15	8.467,15
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO		278.592,77	
3o Livello	01	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA		165.900,63	542.279,37
4o Livello	09	Beni immobili					
5o Livello	003	Fabbricati ad uso scolastico					
SIOPE	2020109003						
DESTINAZIONE FONDI		Vincolata (Vincolo n. 4) CONTRIBUTI REGIONALI				Fruttifero	C.U.P. J36E12000670001
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 8.467,15 diconsì OTTOMILAQUATTROCENTOSESSENTASETTE/15							
Per : Delibera CIPE n.6/2012 - Programma straordinario stralcio interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, prevenzione e riduzione rischio connesso alla vulnerabilità elementi anche non strutturali - Istituto ex ITIS							

CREDITORE (Codice: 289)				
RUSSO VINCENZO			VIA PUGLIA 8	
Cod.Fis. RSSVCN66M04C514U / P.Iva 11977970158			71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	CIG:Z57130B217 SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 03/04/2017 Lavori per la messa in sicurezza e la prevenzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali relativi all'istituto scolastico I.T.I.S. Augusto Righi (già caserma Nino Bixio)		325,65	2109
2	CIG:Z57130B217 ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 03/04/2017 Lavori per la messa in sicurezza e la prevenzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali relativi all'istituto scolastico I.T.I.S. Augusto Righi (già caserma Nino Bixio)		8.141,50	2109
	Trib. 1040 AUTONOMI-PROF 20,00% su 6.673,36 *Ritenuta		1.334,67	
	Netto da Pagare:		7.132,48	7.132,48
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	1.334,67
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCO DI NAPOLI (IT79V0101078382088486740153) - CIN: V - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 088486740153 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			
	IBAN: IT79V0101078382088486740153			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1702 DEL 03/5/17 CAP. 30596 BIL. 2014

IMPEGNO N. 1035/1 LIQUIDAZIONE N. 316

(A) ONORARIO	€ <u>6.673,36</u>
(B) CONTRIB. CASSA (___%) DI A	€ <u>266,93</u>
(C) IMPONIBILE IVA (TOTALE A + B)	€ <u>6.940,29</u>
(D) IVA AL 22 % DI C	€ <u>1.526,86</u>
(E) SPESE ESENTI	€ <u>8.467,15</u>
(F) TOT.FATTURA(C +D+ E)(TOT. MANDATO)	€ <u>1</u>
(G) RITENUTA DEL 20% SU A	€ <u>1.334,67</u>
TOTALE DA LIQUIDARE A CREDITORE (F-G)	€ <u>7.132,48</u>

REVERSALE N. 1461

CREDITORE: COD.N. (289) ARCA. RUSSO VINCENZO

PAGAMENTO FATTURA N. 2.17 DCL 03/04/2017

PROT. ENTRATA N. P85P DCL 03/04/2017

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

COORDINAMENTO - PROTEZIONI - CASSA IN SICUREZZA ISTITUTO "A RIGHI" 2 SAC

TOTALE FATTURA € _____

CIG: 357130B217 CUP: 336E12000670001

SIOPE: 2109

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 316/61 del 22/03/2017



CITTA' DI CERIGNOLA

Settore Amministrativo Area Tecnica – Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione

Prot. n° 20153

Cerignola, 05-04-2017

OGGETTO: Delibera CIPE n. 6/2012 – Programma straordinario stralcio interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, prevenzione e riduzione rischio connesso alla vulnerabilità elementi anche non strutturali – Istituto ex ITIS Augusto Righi. Liquidazione compenso arch. Vincenzo Russo a titolo di competenze per la direzione, coordinamento sicurezza, misura e contabilità dei lavori maturati al 2° SAL - CIG Z57130B217.

Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio
SEDE

Invito la S.V. a voler disporre il pagamento di complessivi € 8.467,15 a favore dell'arch. Vincenzo Russo, disposto con determinazione dirigenziale n. 316/61 del 22/03/2017, a titolo di 2° SAL per la direzione, coordinamento sicurezza, misura e contabilità inerenti la "Messa in sicurezza e la prevenzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, nell'Istituto scolastico A. Righi" di Cerignola, così come di seguito specificato:

- € 8.467,15 così come da fattura n. FATTPA 2_17 del 03/04/2017, identificativo Sdl n. 67295605, acquisita al prot. n. 9859 del 03/04/2017, Istituto ex ITIS Augusto Righi – competenze per la direzione, coordinamento sicurezza, misura e contabilità dei lavori maturati al 2° SAL - CIG Z57130B217 – CUP J36E12000670001.

Il suddetto importo dovrà essere corrisposto mediante bonifico sul c/c bancario comunicato dall'interessato, ai sensi dell'art.3, comma 7 della L.136/2010.

La suddetta spesa di complessivi € 8.467,15 trova imputazione all'intervento 4.02-2.02.01.09.003, cap. 30596, impegno n. 1035 RE 2014 sub 1, giusta Determina Dirigenziale 316/61 del 22/03/2017.



Il Dirigente del Settore
Ing. Clorindo Izzillo

Si Allega:
fattura elettronica;
comunicazione ex art.3, comma 7, legge 139/2012 e s.m. e i.

Versione 1.0

Notifica Esito Committente

Identificativo Sdl: 67295605

Riferimento Fattura

Numero Fattura: FATTPA 2_17

Anno Fattura: 2017

Posizione Fattura: 1

Esito: EC01 (Accettazione)

Descrizione: Fattura accettata

Message Id Committente: 001

Prot. n. 9859 del 3/4/2017

IL RESPONSABILE
ALTERNATIVE E MANUTENZIONE
Ing. Clorindo IZZILLO



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **0002370893**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT11977970158**
Codice fiscale: **RSSVCN66M04C514U**
Nome: **vincenzo**
Cognome: **russo**
Albo professionale di appartenenza: **Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori**
Provincia di competenza dell'Albo: **MI**
Numero iscrizione all'Albo: **8356**
Data iscrizione all'Albo: **1994-07-20** (20 Luglio 1994)
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **via puglie 8**
CAP: **71042**
Comune: **Cerignola**
Provincia: **FG**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0885427288**
E-mail: **studio@virusdesign.it**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **00362170714**
Denominazione: **Comune di Cerignola - Uff_eFatturaPA**

Dati della sede

Indirizzo: **Piazza Della Repubblica**
CAP: **71042**
Comune: **Cerignola**
Provincia: **FG**
Nazione: **IT**

**Dati del terzo intermediario soggetto emittente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01879020517**
Denominazione: **Aruba Pec S.p.A.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2017-04-03** (03 Aprile 2017)
 Numero documento: **FATTPA 2_17**
 Importo totale documento: **8467.15**

Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)
 Importo ritenuta: **1334.67**
 Aliquota ritenuta (%): **20.00**
 Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello 770S)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC04** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)
 Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
 Importo contributo cassa: **266.93**
 Imponibile previdenziale: **6673.36**
 Aliquota IVA applicata: **22.00**

Dati della convenzione

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
 Identificativo convenzione: **D.D. 63/18**
 Data convenzione: **2015-02-25** (25 Febbraio 2015)
 Codice commessa/convenzione: **cap.30596 imp. n.1035 RE 2014 sub 1**
 Codice Unitario Progetto (CUP): **J36E12000670001**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z57130B217**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
 Identificativo convenzione: **316/61**
 Data convenzione: **2017-03-22** (22 Marzo 2017)
 Codice commessa/convenzione: **cap 30596 impegno 1035 sub 1 RE 2014 liquidazione 316**
 Codice Unitario Progetto (CUP): **J36E12000670001**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z57130B217**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura*Nr. linea: 1***Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: **ON**

Descrizione bene/servizio: **Lavori per la messa in sicurezza e la prevenzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali relativi all'istituto scolastico I.T.I.S. Augusto Righi (già caserma Nino Bixio) via xxv aprile, Cerignola (FG). Acconto n.3 per direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione a tutto il SAL n.2**

Quantità: **1.00000000**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **6673.36000000**
 Valore totale: **6673.36000000**
 IVA (%): **22.00**
 Soggetta a ritenuta: **SI**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **6940.29**
 Totale imposta: **1526.86**
 Esigibilità IVA: **I** (esigibilità immediata)
 Riferimento normativo: **D.p.r. 633/72**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)



Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2017-05-03** (03 Maggio 2017)
Importo: **7132.48**
Istituto finanziario: **BANCO DI NAPOLI**
Codice IBAN: **IT79V0101078382088486740153**
Codice BIC: **IBSPITNA**
Codice pagamento: **BB30G**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it



ruſso vincenzo
via puglie 8

71042 Cerignola (FG)

P.Iva 11977970158 C.F. RSSVCN66M04C514U

Codice 289

Spett.le
Comune di Cerignola - Uff_eFatturaPA

Piazza Della Repubblica

71042 Cerignola (FG)

P.Iva C.F. 00362170714

Fattura FATTPA 2_17 del 03-04-2017

Protocollo 9859 del 03-04-17

Pag. 1 di 1

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Importo contributo cassa TC04					266,93	22
ON Lavori per la messa in sicurezza e la prevenzione del rischio connesso alla vulnerabilit� degli elementi anche non strutturali relativi all'istituto scolastico I.T.I.S. Augusto Righi (gi� caserma Nino Bixio) via xxv aprile, Cerignola (FG). Acconto CIG Z57130B217	NR	1,000	6.673,360000		6.673,36	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta 1.334,67 Imponibile merce 6.940,29

C. Descrizione		Riepilogo Iva				
	%	Imponibile	Iva	Es.		
	22	6.940,29	1.526,86	I	Imponibile	6.940,29
					Imposta	1.526,86
					Totale	8.467,15
					Ritenuta	-1.334,67
					Netto a pagare	7.132,48

Modalit  pagamento
Bonifico

Scadenza 03-05-2017 Banca BANCO DI NAPOLI

IBAN IT79V0101078382088486740153

VIRUSDESIGN®

v i n c e n z o r u s s o a r c h i t e t t o

8, via puglie - 71042 cerignola (fg) - tel/fax: +39 0885 427288 - mobile: +39 335 5388804 - e.mail: info@virusdesign.it

Preg.mo dott.ing. Clorindo Izzillo

DIRIGENTE SETTORE LL.PP. E
MANUTENZIONE

COMUNE DI CERIGNOLA

OGGETTO: COMUNICAZIONE CONTO CORRENTE BANCARIO DEDICATO AD APPALTI/COMMESSE
PUBBLICHE AI SENSI ART.3 COMMA 7 DELLA L.136/2010 E S.M. E I.

Il sottoscritto arch. Vincenzo Russo nato a Cerignola (FG) il 04-08-1966 (C.F. RSSVCN66M04C514U) nella qualità di architetto libero professionista con sede legale in Cerignola (FG) CAP 71042 , via Puglie 8 regolarmente iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Milano al n. 8356, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 e s.m. e i. relativi ai pagamenti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

l'esistenza del conto corrente bancario dedicato, anche non in via esclusiva, alla gestione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche presso il BANCO DI NAPOLI sede di Cerignola (FG) con i seguenti identificativi:

BANCO DI NAPOLI filiale n.00592 di Cerignola (FG) via Roma 56

n° c/c bancario: 8848674 0153

intestato ad arch. Vincenzo Russo


cod. IBAN IT79 V010 1078 3820 8848 6740 153

Si allega, ai sensi del citato DPR 445/2000, copia fotostatica (non autenticata) del documento di identità.

Cerignola, 19-04-2016

arch. Vincenzo Russo




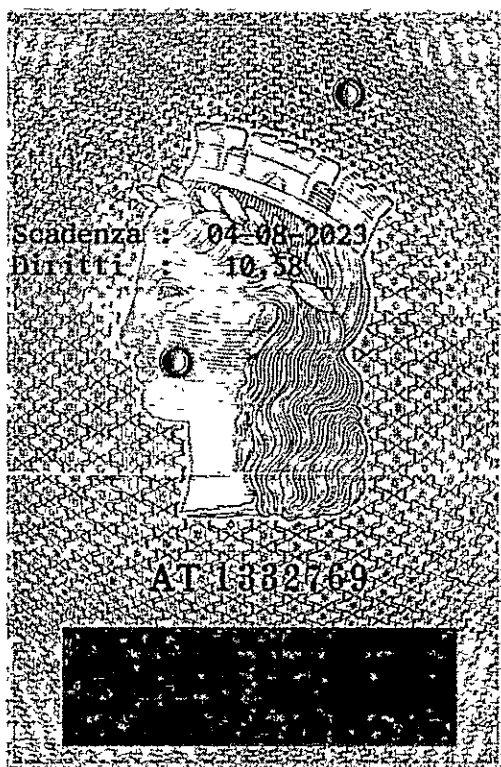

IPZS, s.p.a. - OFFICINA C.V. - ROMA



Cognome	RUSSO
Nome	VINCENZO
nato il	04-08-1966
(alta il	928 1 A 1966
	CERIGNOLA (FG)
	Italiana
Cittadinanza	CERIGNOLA (FG)
Residenza	GENTILE GIOVANNI 11
Via	CONIUGATO
Stato civile	ARCHITETTO
Professione	CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura	185
Capelli	Castani
Occhi	Castani
Segni particolari	NESSUNO

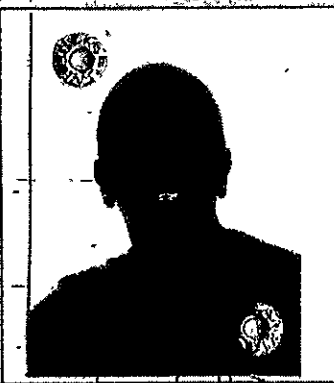	
Firma del titolare	
CERIGNOLA 17-08-2012	
Impronta del dito indice sinistro	L'Ufficio S. 003740 DELEGATO SINISALDO ANTONIO 

C. Russo



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto N.316/61

In data 22-03-17

OGGETTO: Delibera CIPE n.6/2012 - Programma straordinario stralcio interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, prevenzione e riduzione rischio connesso alla vulnerabilità elementi anche non strutturali - Istituto ex ITIS Augusto Righi - 2° SAL e relativa parcella professionale - Liquidazioni.

Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventidue del mese di marzo, in Cerignola, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 22-03-2017

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**LL.PP. - MANUTENZIONI -
AMBIENTE - VERDE PUBBLICO**

OO.PP.-MANUTENZIONE

Izzillo Ing. Clorindo, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, la Molise, la Puglia e la Basilicata - sede coordinata di Bari, al fine di prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità di elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici, ha disposto apposito sopralluogo presso l'edificio sede dell'istituto scolastico "ITIS - Augusto Righi" di Via XXV Aprile, effettuato da proprio Tecnico rilevatore in data 18.09.2009, durante il quale sono state riscontrate problematiche appositamente riportate nella predisposta scheda di rilevamento.

Con delibera C.I.P.E. n. 6 del 20/01/2012 pubblicata sulla G.U.R.I. n. 88 del 14/04/2012, è stata disposta, tra l'altro, l'assegnazione di risorse per la realizzazione del "Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici - Secondo Stralcio".

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche - sede coordinata di Bari, con nota prot. 0007493 del 04/07/2012 acquisita al protocollo Comune di Cerignola n.16014 del 06.07.2012, ha trasmesso lo schema di convenzione relativo al Programma straordinario stralcio di interventi sugli edifici scolastici di cui sopra, nell'ambito del quale è compreso l'intervento finalizzato alla messa in sicurezza dell'edificio sede dell'Istituto scolastico "ITIS - Augusto Righi".

In data 29/10/2012, presso il competente Ufficio del Provveditorato, si è proceduto, tra l'altro, alla sottoscrizione della "Convenzione" inerente l'intervento in argomento.

Con nota prot. 26692 del 20/11/2012 questo Comune ha chiesto di potersi avvalere, per la progettazione dell'opera, della collaborazione di personale del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche, ai sensi dell'art. 90 comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006.

Con nota Ministeriale prot. n.7214 del 06/05/2014, acquisita al prot. n. 11363 del 15/05/2014, la Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali-Div. 1^a, ha trasmesso la Convenzione regolante i rapporti fra Stato ed Ente attuatore n.19369 del 21.11.2013, comunicando che l'Ufficio Centrale di Bilancio del Ministero dell'Economia e Finanze, avendo ottenuto la registrazione da parte della Corte dei Conti al reg.1 foglio 715 del 7.02.2014, ha vistato col n.175 del 9.1.2014 il Decreto prot. n. 19707 del 22/11/2013 di approvazione della stessa Convenzione relativa all'intervento n. 00612PUG135 in argomento.

Con il medesimo Decreto è stato altresì assunto l'impegno a favore del Comune di Cerignola dell'importo complessi-

vo di € 643.800,00 finalizzato alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali nell'edificio scolastico "ITIS Augusto Righi" in XXV Aprile - CUP: J36E12000670001.

La spesa progettuale è stata imputata al capitolo 30596 bilancio 2014, correlato al finanziamento statale ed al capitolo di entrata 40267, bilancio 2014, accert. 66.

Non potendo l'Ufficio Tecnico di questo Comune provvedere alla progettazione esecutiva, sicurezza in fase di progettazione, direzione, coordinamento della sicurezza in fase d'esecuzione, alla misura e contabilità dei lavori, data la ormai accertata carenza di personale, e preso atto della dichiarata indisponibilità all'espletamento delle stesse prestazioni da parte di personale del Provveditorato, giusta nota acquisita al prot. n. 21188 del 23.9.2014, con determinazione dirigenziale n. 63/18 del 10.02.2015 è stato incaricato l'arch. Vincenzo Russo (CIG Z57130B217), tecnico esterno alla struttura comunale, in possesso dei requisiti per poter espletare l'incarico in argomento.

In data 25/02/2015 l'arch. Vincenzo Russo ha sottoscritto con questo Ente apposito disciplinare-convenzione di incarico.

Il citato professionista, ad espletamento dell'incarico, ha trasmesso in data 14/04/2015 il progetto di manutenzione straordinaria finalizzato alla messa in sicurezza dell'edificio scolastico ITIS Augusto Righi, di cui al finanziamento Ministeriale, il quale è stato sottoposto, come da "Convenzione", all'esame del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche -sede coordinata di Bari.

Con nota n.4803 del 18.05.2015 lo stesso Provveditorato, pur accertando che il progetto compatibilmente con il finanziamento disponibile considerava gli interventi più urgenti, riportati nel giudizio sintetico di cui alla scheda tecnica di rilevamento del 18.09.2009, ha richiesto integrazioni al progetto e l'acquisizione del preventivo parere della Soprintendenza, ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 42/2004, data la valenza storica artistica dell'immobile di età superiore a 50 anni.

Il progetto rielaborato dall'arch. Vincenzo Russo in relazione alle integrazioni richieste dal Provveditorato, è stato inviato alla Soprintendenza territorialmente competente per l'acquisizione dell'autorizzazione ai sensi della citata legge.

La Soprintendenza alle Belle Arti e Paesaggio per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, con sede in Bari, con nota 7254 del 17.11.2015, acquisita al prot. n. 31425 del 25/11/2015, ha autorizzato l'esecuzione delle opere.

Con delibera n. 370 del 30/12/2015 la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo, adeguato nei termini di cui alle prescrizioni del Provveditorato ed al parere della competente Soprintendenza, sottoponendolo al definitivo parere da parte del competente Provveditorato, in osservanza dell'art.3, comma 1, della citata "Convenzione".

Con pec del 16/03/2016 è stato acquisito il parere favorevole rilasciato dal C.T.A. del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise la Puglia e la Basilicata - sede coordinata di Bari. In relazione al suddetto parere e ad alcune precisazioni esposte dal CTA è stato rimodulato il quadro economico di spesa.

Con determina della CUC del Tavoliere n. 08 del 07/04/2016, preso atto della determinazione dirigenziale n.259/13 del 06/04/2016 con la quale per l'espletamento della gara di appalto dei lavori è stata individuata la procedura negoziata di cui all'art.57, comma6 del D. Lgs. 163/2006, si è proceduto all'indizione della gara. La lettera di invito prot. n. 24 del 07/04/2016 è stata inviata alle Ditte via pec in pari data.

Con determinazione del Responsabile del procedimento CUC, ing. Clorindo Izzillo prot. n. 13 del 26/04/2016 è stata costituita la Commissione di gara composta dal Dirigente ing. Clorindo Izzillo, Presidente e dai componenti Dott.ssa Maria Valentino e dott.ssa Maria Dettori.

Con determinazione dirigenziale del Settore Lavori Pubblici n.650/86 del 18/08/2016, riscontrata la regolarità della procedura seguita nell'esperimento di gara e preso atto del verbale della Commissione del 26/04/2016, si è proceduto all'aggiudicazione definitiva a favore della ditta Cadinvest srl (codice fiscale e partita IVA: 01934460716), con sede in Cerignola alla Via Sestriere n.2, per il prezzo di € 322.184,29 al netto del ribasso offerto del 22,500% sulla base d'asta di € 415.721,66, oltre a € 68.112,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, e per un totale complessivo di contratto per lavori pari a € 390.296,59, oltre iva come dovuta.

In relazione al risultato di gara, con la citata determinazione n.650/86 del 18/08/2016 è stato rideterminato il quadro economico, secondo le risultanze in essa riportate.

Tra la citata aggiudicataria e l'Amministrazione è stato stipulato il relativo contratto di appalto repertorio n.185 del 12/10/2016, sottoscritto in modalità digitale e registrato a Cerignola in data 12/10/2016 col n.2673 Serie 1T.

I lavori sono stati consegnati in data 18/10/2016, giusto verbale in atti, e regolarmente iniziati in pari data.

Con determinazione dirigenziale n.194/34 del 27/02/2017, fatta salva l'acquisizione dei prescritti pareri da parte della competente Soprintendenza e del Provveditorato Inter-

regionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise la Puglia e la Basilicata - sede coordinata di Bari, è stata approvata una perizia di variante e suppletiva finalizzata alla risoluzione delle emerse nuove contingenze e criticità, dettagliatamente riportate nella stessa determinazione e negli elaborati di perizia, redatti dal direttore dei lavori, arch. Vincenzo Russo, su autorizzazione del RUP.

Per effetto della suddetta perizia di variante e suppletiva, che prevede prevalentemente lavorazioni diverse imprevedute ed imprevedibili in fase progettuale ed in parte lavori di miglioramento delle caratteristiche costruttive e di finitura, l'importo dei lavori è stato rideterminato in € 396.026,15 al netto del ribasso d'asta del 22,50% (applicato sull'importo computato di € 511.001,48), mentre gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso in € 77.613,03 stabilendo, pertanto, in € 473.639,17 il nuovo importo contrattuale, con l'incremento di € 83.342,58 che trova copertura con la parziale utilizzazione delle economie di gara (voce "imprevisti").

Per la redazione della perizia di variante e suppletiva all'arch. Vincenzo Russo sono stati riconosciuti compensi professionali pari ad € 13.500,00 oltre contributo cnpaia ed IVA, con prelievo della relativa spesa dalla voce imprevisti del quadro economico di progetto.

La spesa progettuale resta confermata in complessivi € 643.800,00, secondo il nuovo quadro economico analitico di perizia di seguito riportato, finanziata con fondi ministeriali ottenuti per la realizzazione dell'opera:

LAVORI	Come da Precisazioni CTA	Post gara d'appalto	Perizia di variante e suppletiva
importo dei lavori al netto del ribasso del 22,50%	415.721,66	322.184,29	396.026,15
Oneri di sicurezza	68.112,30	68.112,30	77.613,02
TOTALE LAVORI	483.833,96	390.296,59	473.639,17
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Iva sui Lavori (22%)	106.443,47	85.865,25	104.200,62
Spese per pubblicità bando di gara	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Imprevisti (comprensivi di IVA)	8.837,57	122.953,16	
Contributo Anac	225,00	225,00	225,00
Progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	31.368,22	31.368,22	44.868,22
collaudo	3.000,00	3.000,00	3.000,00
CNPAIA AL 4%	1.254,73	1.254,73	2.040,83
Iva AL 22% su spese tecniche e cnpaia al 4%	7.837,05	7.837,05	11.673,56
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	159.966,04	253.503,41	170.160,83
TOTALE QUADRO ECONOMICO	643.800,00	643.800,00	643.800,00

Ciò stante il progettista e direttore dei lavori, arch. Vincenzo Russo, con nota acquisita in data 07.03.2017 al prot. n.6957, ha trasmesso il 2° stato di avanzamento dei lavori, eseguiti a tutto il 04/03/2017 dalla ditta aggiudicataria, "Cadinvest Srl", per il complessivo importo netto di € 324.195,30 comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 60.991,66, nonché il relativo certificato di pagamento n.2, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, ing. Clorindo Izzillo, con il quale, dedotto l'acconto di cui al 1° SAL e le ritenute di legge, è stato accertato e riconosciuto a favore della predetta Ditta appaltatrice il credito di € 167.816,93, oltre Iva nella misura come dovuta del 22% pari ad € 36.919,72 e, quindi, di complessivi € 204.736,65.

Unitamente allo stato di avanzamento il professionista ha altresì trasmesso la parcella inerente gli onorari per la direzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità dei lavori in argomento, maturati con la emissione del detto 2°SAL, dell'importo di € 6.673,36, oltre Cassa previdenziale 4% pari ad € 266,93 ed iva al 22% pari ad € 1.526,86 e, quindi, per un importo complessivo di € 8.467,15, come da relativa parcella pro forma emessa dallo stesso professionista.

Considerata la regolarità degli atti, si ritiene di procedere all'approvazione del 2° stato di avanzamento lavori e relativo certificato di pagamento, nonché della parcella professionale, con contestuale riconoscimento dei crediti di seguito liquidabili per complessivi € 213.203,80 a favore:

- dell'impresa "Cadinvest Srl di complessivi € 204.736,65, iva al 22% compresa, a titolo di corrispettivo 2° SAL, che trova capienza al finanziamento assunto per la realizzazione dell'opera ed imputazione al capitolo p. 30596, cod. bilancio 4.02-2.02.01.09.003, a valere per € 43.752,18 sull'impegno 1034-2015 RE 2016 sub 4 e per € 160.984,47 sull'impegno 1035-2014 RE 2016 sub 2;
- dell'arch. Vincenzo Russo, dell'importo di € 8.467,15 contributo cnpaia 4% ed iva al 22% compresi, che trovano altresì capienza al finanziamento assunto per la realizzazione dell'opera ed imputazione al capitolo p. 30596, cod. bilancio 4.02-2.02.01.09.003, - impegno n. 1035-2014 - sub 1 RE 2014.

Dato atto che all'intervento è stato attribuito il CUP: J36E12000670001; ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex Art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12 novembre 2010, n.187 convertito con modificazioni nella legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", all'attività inerente l'affidamento dei lavori è stato attribuito il CIG: 66494389D1, mentre a quella relativa alla prestazione professionale di progettazione, coordinamento della sicurezza, D.L., misure e contabilità dei lavori il CIG: Z57130B217.»

Visto la normativa inerente i lavori pubblici;

Ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, si dispone la pubblicazione del presente atto, nella sezione del link "*Amministrazione trasparente*", sotto sezione "bandi di gara e contratti";

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che : "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 21/03/2016, prot. n. 60/Gab., con il quale si affida all'ing. Clorindo Izzillo, la Dirigenza del Settore comprendente i Servizi Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente e Verde Pubblico;

Visto il decreto del Sindaco del 18/09/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquichio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

- 1) la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di approvare il 2° stato di avanzamento dei lavori per la "Messa in sicurezza e la prevenzione del rischio connesso

alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, nell'Istituto scolastico A. Righi" CUP: J36E12000670001 CIG: 66494389D1, emesso dal Direttore, arch. Vincenzo Russo, importo netto di € 324.195,30 comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 60.991,66, nonché il relativo certificato di pagamento n.2, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, ing. Clorindo Izzillo, con il quale, dedotto l'acconto di cui al 1° SAL e le ritenute di legge, è stato accertato e riconosciuto a favore della predetta Ditta appaltatrice il credito di € 167.816,93, oltre iva nella misura come dovuta del 22% pari ad € 36.919,72 e, quindi, di complessivi € 204.736,65;

3) di approvare la parcella esibita dall'arch. Vincenzo Russo relativa alla prestazione di direzione, contabilità, misura e coordinamento della sicurezza dei lavori in argomento, maturati in relazione all'emissione del 2°SAL, dell'importo di € 6.673,36, oltre Cassa previdenziale 4% pari ad € 266,93 ed iva al 22% pari ad € 1.526,86 e, quindi, di complessivi di € 8.467,15, come da relativa fattura pro forma emessa dallo stesso professionista;

4) di liquidare e pagare gli accertati crediti a favore degli aventi causa di cui in seguito, su disposizione del RUP, che terrà conto delle disponibilità di cui all'erogazione già effettuata in conto finanziamento nonché dell'ulteriore erogazione da effettuarsi da parte del Ministero dell'Interno, finanziatore dell'opera:

- impresa Cadinvest Srl di € 204.736,65, iva al 22% compresa, a titolo di corrispettivo 2° SAL - CIG: 66494389D1, come da relativa fattura pro forma emessa dalla stessa Impresa;
- professionista Arch. Vincenzo Russo di € 8.467,15, contributo cnpaia 4% ed iva al 22% compresi, a titolo di competenze per la per direzione, coordinamento sicurezza, misura e contabilità dei lavori maturati al 2° SAL - CIG Z57130B217, giusta fattura proforma emessa dal professionista;

5) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2017, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

6) di dare atto che la spesa di complessivi € 213.203,80 trova imputazione all'intervento 4.02-2.02.01.09.003, cap. 30596, a valere quanto ad € 8.467,15 sull'impegno n.1035-2014 sub 1 RE 2014 e ad € 204.736,65 sugli impegni 1034-2015 RE 2016 sub 4 per € 43.752,18 e 1035-2014 RE 2014, sub 2 per € 160.984,47;

7) di liquidare la detta spesa di € 213.203,80, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato

n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, al suddetto capitolo ed impegni, imputandola al bilancio 2017;

8) di dare opportuna comunicazione del presente atto alla competente Struttura del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise la Puglia e la Basilicata - sede coordinata di Bari, nei termini di cui alla citata "Convenzione", ai fini della rendicontazione delle spese;

9) di dare atto che la redazione del presente atto è stata assegnata alla Sig.ra Battaglino Anna, in servizio presso l'Ufficio Lavori Pubblici.

**CITTÀ DI CERIGNOLA**

(Provincia di Foggia)

Piazza della Repubblica N. 1

71042 – Cerignola

Partita Iva e C.F. 00362170714

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Atto N. 316/61

In data 22-03-17

OGGETTO: Delibera CIPE n.6/2012 - Programma straordinario stralcio interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, prevenzione e riduzione rischio connesso alla vulnerabilità elementi anche non strutturali - Istituto ex ITIS Augusto Righi - 2° SAL e relativa parcella professionale - Liquidazioni.

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 213.203,80 (CIG, 66494389D1) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione
43.752,18	04.02-2.02.01.09.003	30596/	2016	314	31-12-2015
160.984,47	04.02-2.02.01.09.003	30596/	2016	315	31-12-2014
8.467,15	04.02-2.02.01.09.003	30596/	2014	316	31-12-2014

*Cerignola, lì 22-03-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA****F.to Buquicchio Dott. Giovanni**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Izzillo Ing. Clorindo

Copia conforme all'originale, **22-03-2017**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **23-03-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **8866** del **22-03-17** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **22-03-17**.

Dal Palazzo di Città, **22-03-2017**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **23-03-17** al **06-04-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **07-04-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria
