



Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO

157

del 26-01-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	34436	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 09 Prog. 02 Titolo 2 (09 02-2.02 01 09 003)	Gest.	RESIDUI/2008
RISTRUTTURAZIONI E REALIZZAZIONI ATTIVITA' SOCIO-AMBIENTALE ARREDO URBANO							
SUB-IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 685	del. 02-09-2016
numero 4580/ 5/2008 del 31-08-2016				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Presenza d'atto del verbale di gara e aggiudicazione definitiva dei lavori di " Adeguamento e ristrutturazione dell'area sportiva scuola media di 1° grado G. Pavoncelli.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		PREVISIONE ASSESTATA	145.243,72	145.243,72	
Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	2	Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO	35.127,59	35.127,59	
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO	35.127,59	35.127,59	
3o Livello	01	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA	110.116,13	110.116,13	
4o Livello	09	Beni immobili					
5o Livello	003	Fabbricati ad uso scolastico					
SIOPE	2020109003						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P. J39D16000200007
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 35.127,59 dicensi TRENTACINQUEMILACENTOVENTISETTE/59							
Per : Presenza d'atto del verbale di gara e aggiudicazione definitiva dei lavori di " Adeguamento e ristrutturazione dell'area sportiva scuola media di 1° grado G. Pavoncelli. Pagamento ditta IMPRESA PUGLIESE COSTRUZIONI E SERVIZI SRL. 1 sal							

CREDITORE (Codice: 16746)				
PUGLIESE COSTRUZIONE E SERVIZI SRL			VIA PIETRO MASCAGNI 44	
Cod.Fis. 03923810711 / P.Iva 03923810711			71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:6643821E84 SALDO Fatt.n. 1/E del 01/12/2016 LAVORI DI RECUPERO DELLE AREE SPORTIVE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 'PAVONCELLI' - LIQ. 1° SAL. CAPITULO 34436 IMPEGNO 4580 SUB 5 BILANCIO 2016 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 685/98 DEL 02/09/2016 CUP J39D16000	35.127,59		2115
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 31.934,17 *Ritenuta	3.193,42		
	Netto da Pagare:	31.934,17	31.934,17	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	3.193,42	
MODALITA' DI PAGAMENTO	Bonifico Credito Coop di canosa Loconia(IT 47 C 08606 78380 000000001327) - CIN: C - ABI: 08606 - CAB: 78380 - C/C: 000000001327			
	IBAN: IT47C0860678380000000001327			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			



Bollo dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 157 DEL 26/01/17 CAP. 34436 BIL. 2016

IMPEGNO N. 4580/5 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 31934,17
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 3.193,42
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 35127,59
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 32

CREDITORE: COD.N. (16746) IMPRESA PUBBLICHE COOPERATIVE
DI SERVIZI SRL

PAGAMENTO FATTURA N. 1/E DEL 01/12/2016

PROT. ENTRATA N. 35576 DEL 02/12/2016

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE :

LAVORI DI RECUPERO AREE SPORTIVE SCUOLA "PAVONCELLI"

TOTALE FATTURA € _____

CIG: 6643821E84

CUP: 538 D16 000 2000 07

SIOPE: 2175

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(Liquidazione) Determ. N. 1205/221 del 23/12/2016



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto N. **1205/221**

In data **23-12-16**

OGGETTO: Adeguamento e ristrutturazione dell'area sportiva della scuola secondaria di 1° grado "G.Pavoncelli" - Approvazione perizia di variante e suppletiva, 1° stato di avanzamento lavori e parcella professionale - Liquidazione corrispettivi.

Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 23-12-2016

Il Responsabile del Settore

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno **duemilasedici**, il giorno **ventitre** del mese di **dicembre**, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**LL.PP. - MANUTENZIONI -
AMBIENTE - VERDE PUBBLICO**

OO.PP.-MANUTENZIONE

Izzillo Ing. Clorindo, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 375 del 16/12/2014 si programmava la spesa di € 85.000,00 per la manutenzione e riattamento dello spazio sportivo ubicato all'interno dell'area della Scuola Media "G. Pavoncelli" per renderlo fruibile sia agli alunni della scuola che alla collettività, mirando altresì all'obiettivo di rifunionalizzare un'area a scopo di socializzazione e prevenire fenomeni di devianza minorile.

Con determinazione dirigenziale n. 112/18 del 20/02/2015, data la ormai constatata carenza di personale interno alla struttura ed in attuazione della citata delibera G.C. n.375/2014, si è provveduto ad incaricare l'Arch. Fedele Antonio Rosaria, con studio in foggia al Viale 1° Maggio n. 20, della progettazione definitiva ed esecutiva, direzioni lavori, misure e contabilità, rilievi topografici, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e certificazione di regolare esecuzione dell'intervento di "Recupero di due spazi d'attività esistenti nell'area della Scuola Media Pavoncelli.

In data 26 marzo 2015, acquisita al protocollo n.7333, l'arch. Fedele Antonio Rosania ha trasmesso il progetto in oggetto che veniva approvato con atto della Giunta comunale n. 272 del 23/10/2015.

La spesa progettuale di € 85.000,00 è stata imputata al capitolo 34436 dei RR.PP. 2008 - imp. n. 4580/sub 4 e l'intervento è inserito nel Piano Triennale dei LL.PP. 2015-2017, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.198 del 30/07/2015.

Considerato che l'importo dei lavori per la realizzazione dell'intervento in argomento è inferiore alla soglia di cui all'art. 37 del D. Lgs. 50/2016 (€ 150.000,00), con determinazione dirigenziale n.504/53 del 04/07/2016 si è proceduto all'indizione della gara di appalto, individuando nella procedura negoziata il procedimento di scelta del contraente, di cui all'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50 del 18/04/2016, con il sistema di aggiudicazione di cui all'art.95 dello stesso D.Lgs n.50/2016.

L'invito di gara, prot. n. 19105 del 05/07/2016, è stato diramato in pari data via pec a n. 17 Ditte. Con ordine di servizio del 19/10/2016 è stata costituita la Commissione di gara.

Entro il termine fissato per la ricezione delle offerte (ore 12,00 del 18/07/2016) è pervenuto un solo plico contenente la documentazione e l'offerta della Ditta Pugliese Costruzioni e Servizi Srl.

Con determinazione dirigenziale n. 685/98 del 02/09/2016, preso atto della regolarità della procedura di gara - CUP: J39D16000200007 CIG: 6643821E84 - si è proceduto ad approvare il verbale di gara del 19/07/2016 ed aggiudicare definitivamente i lavori alla ditta Pugliese Costruzioni

e Servizi srl -con sede in Cerignola alla Via P. Mascagni n. 44 - per il prezzo di € 58.641,85, al netto del ribasso offerto del 7,825% (sconto di € 4,978,27) sulla base d'asta soggetta a ribasso di € 63.620,12, oltre € 886,42 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e, quindi, per l'importo di € 59.528,27, oltre IVA al 10% pari ad € 5.952,83.

Tra la citata aggiudicataria e l'Amministrazione è stato stipulato, per scrittura privata, il relativo contratto di appalto repertorio n.441 del 23/09/2016, registrato a Cerignola in data 30/09/2016 al n. 1035 S.3^ aa.pp.

I lavori sono stati consegnati in data 13/10/2016, giusto verbale in atti, e regolarmente e concretamente iniziati in pari data.

In fase esecutiva dei lavori sono emerse delle criticità in merito alla sostituzione della pavimentazione sportiva esistente sulla pista di atletica e sull'area del campo di basket nonché dalla constatazione del motivo di pericolo, per l'incolumità degli alunni durante lo svolgimento dell'attività sportiva, creati: dalla tubazione di adduzione del gas allocata sulla muratura di mattoni posta a ridosso della pista di salto in lungo; dal cassone di metallo con spigoli vivi nel quale è posizionato il contatore di misurazione del gas metano, collegato alla suddetta tubazione; da pali della illuminazione posti a ridosso del parapetto della recinzione.

In relazione, per la risoluzione di queste problematiche, ricorrendo i presupposti di cui al comma 1 dell'art. 149 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, la Direzione lavori, sentito per le vie brevi ed avendo ricevuto adeguata autorizzazione dall'ing. Clorindo Izzillo, Responsabile del Procedimento del progetto, ha proceduto alla redazione di apposita perizia di variante e suppletiva, contenuta nell'importo complessivo del finanziamento assunto per la realizzazione dell'opera.

Il Direttore dei lavori, arch. Fedele Rosania, con nota acquisita in data 30/11/2016 al prot. n. 35353, ha provveduto a trasmettere la variante tecnica al progetto - determinata dalle motivazioni di cui innanzi e dettagliatamente riportate nella relazione tecnica- la quale prevede due tipologie di intervento: la prima inerente a modifiche indispensabili all'esecuzione di categorie di lavoro per la pratica dell'attività sportiva; la seconda l'esecuzione di categorie di lavori finalizzate alla migliore gestione in sicurezza della pratica dell'attività sportiva.

Per la realizzazione della variante, più onerosa di quella inizialmente adottata nella progettazione, si è reso necessario procedere a revisionare il progetto, senza alterarne l'importazione originaria, per il recupero e l'ottimale distribuzione delle somme a disposizione da destinare ai lavori a corpo.

La stessa si compone dei seguenti elaborati tecnico-amministrativi, debitamente vistati dal RUP:

- R.01 Elenco atti tecnico-amministrativi ed elaborati grafici;
- R.02 Relazione tecnico illustrativa;
- R.03 Computo metrico estimativo e Q.E. di spesa;
- R.04 Quadro comparativo di spesa;
- R.05 Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
- Abvar.01 Stato futuro - Planimetria generale sc 1:200;
- Abvar.02 Stato futuro - Particolari costruttivi sc 1:200.

La variante ridetermina l'importo per lavori in € 61.953,82 al netto del ribasso d'asta del 7,825% (applicato sull'importo computato di 67.213,26), mentre conferma gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso in € 886,42 stabilendo, pertanto, in € 62.840,24 il nuovo importo contrattuale, con l'incremento (rispetto all'originario di € 59.528,27) di € 3.311,97 pari al 5,56% e, quindi, nei limiti previsti dalla vigente normativa, che trova copertura attraverso la parziale utilizzazione delle economie di gara (riportate nella voce "imprevisti").

Con la sottoscrizione dell'atto di sottomissione la ditta aggiudicataria dei lavori, Pugliese Costruzioni e Servizi Srl, dichiara e si obbliga di accettare l'esecuzione dei lavori di perizia agli stessi patti e condizioni previsti nel contratto principale repertorio n. 441 stipulato in data 23/09/2016 ed prezzi unitari in esso contemplati (con modifica di alcune voci in più ed in meno o azzerate, per le sole quantità) nonché ai nuovi prezzi individuati e concordati sulla base dei prezzi elementari del citato contratto, tra la Stazione Appaltante/D.L. e l'impresa, assoggettati anch'essi al ribasso contrattuale del 7,825%.

Il termine per la esecuzione dei lavori, già fissato al 28/12/2016, per effetto della variante in argomento, viene prorogato al 03/01/2017, fatte salve eventuali sospensioni dei lavori.

Il quadro economico di perizia conferma la spesa progettuale di € 85.000,00, come di seguito definita, e trova imputazione al capitolo 34436, cod. bilancio 09.02-2.02.01.09.000, impegno 4580:

	Pre-gara €	Post-gara €	Variante €
Lavori			
lavori	54.452,22		
Incidenza manodopera	9.167,90		
A. Lavori	63.620,12	58.641,85	61.953,82
costi diretti sicurezza	580,78	580,78	
costi indiretti sicurezza	305,64	305,64	
C) COSTI PER ATTUAZIONE SICUREZZA	886,42	886,42	886,42
	64.506,54	59.528,27	62.840,24
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA sui lavori 10% di (A+B)	6.450,65	5.952,83	6.284,02
spese tecniche			

Progettazione esecutiva. Direzione lavori, misure e contabilità. Rilievi topografici. Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.	9.500,00	9.500,00	10.950,00
Certificato di regolare esecuzione	650,00	650,00	650,00
CNPAIA 4% di d2 + d3	406,00	406,00	464,00
IVA su spese tecniche E CNPAIA 22%	2.322,32	2.322,32	2.654,08
incentivo RUP	1.161,12	1.161,12	1.157,65
per lavori a fattura ed imprevisti	3,37	5.479,47	0,00
D) IN UNO A DISPOSIZIONE	20.493,46	25.471,73	22.159,75
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL PROGETTO	85.000,00	85.000,00	85.000,00

Lo stesso direttore dei lavori, arch. Fedele A. Rosania, ha trasmesso, con nota acquisita in data 01.11.2016 al prot. n. 35523, il 1° stato di avanzamento dei lavori, eseguiti a tutto il 30/11/2016 dalla ditta aggiudicataria, "Pugliese Costruzioni e Servizi Srl", per il complessivo importo netto di € 32.093,23, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 282,04, nonché il relativo certificato di pagamento n.1, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, ing. Clorindo Izzillo, con il quale, dedotte le ritenute di legge, è stato accertato e riconosciuto a favore della predetta Ditta appaltatrice il credito di € 31.934,17, oltre Iva nella misura come dovuta del 10% pari ad € 3.193,42 e, quindi, di complessivi € 35.127,59.

Unitamente allo stato di avanzamento il professionista ha altresì trasmesso la parcella inerente gli onorari per la redazione della perizia di variante e suppletiva dell'importo di € 1.450,00, nonché per la direzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità dei lavori in argomento, maturati con la emissione del detto 1°SAL, dell'importo di € 3.000,00, oltre Cassa previdenziale 4% ed iva al 22% e, quindi per un importo complessivo di 5.646,16.

Considerata la regolarità degli atti, si ritiene di procedere all'approvazione:

- della perizia di variante e suppletiva;
- del 1° stato di avanzamento lavori e relativo certificato di pagamento;
- della parcella professionale;

con contestuale riconoscimento dei crediti di seguito liquidabili a favore:

- dell'impresa "Pugliese Costruzioni e Servizi Srl", dell'accertato credito di complessivi € 35.127,59, iva al 10% compresa, a titolo di corrispettivo 1° SAL, che trova capienza al finanziamento assunto per la realizzazione dell'opera ed imputazione al capitolo 34436 dei RR.PP. 2008, imp. n. 4580 sub 5, il quale per effetto della perizia dovrà essere aumentato di € 3.643,17 (da originari € 65.481,10 ad € 69.124,27);
- dell'arch. Fedele Antonio Rosania, dell'importo di € 5.646,16, contributo cnpaia 4% ed iva al 22% compresi, che trovano altresì imputazione al capitolo 34436 dei RR.PP.2008, imp.n. 4580 sub 4 liquidazione 71, la quale,

per effetto dei riconosciuti compensi per la redazione della perizia di variante e suppletiva, pari ad € 1.450,00 oltre contributo cnpaia ed IVA, dovrà essere aumentata di € 1.839,76 (da originarie 12.878,32 a € 14.718,08).

Al progetto in argomento, è stato assegnato il seguente CUP: J39D16000200007; ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex Art.3 L. n.136 del 13 agosto 2010, recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12/11/2010, n.187 convertito con modificazioni nella legge n.217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", all'attività inerente l'esecuzione dei lavori è stato assegnato il codice CIG:6643821E84 mentre a quella relativa le prestazioni tecnico-professionali il CIG:Z491321D03.»

Visto il D. Lgs. 50 del 18/04/2016;

Ai sensi dell'artt. 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, si dispone la pubblicazione del presente atto, nella sezione del link "*Amministrazione trasparente*", sotto sezione "bandi di gara e contratti";

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che : "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 21/03/2016, prot. n. 60/Gab., con il quale si affida all'ing. Clorindo Izzillo, la Dirigenza del Settore comprendente i Servizi Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente e Verde Pubblico;

Visto il decreto del Sindaco del 18/09/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquichio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

Visto il decreto del Sindaco del 03/08/2016, prot. n. 169/GAB., con il quale il Dirigente del Settore Risorse Umane - Servizi Demografici - Sviluppo Economico, Valentino dott.ssa Maria Concetta, sostituisce temporaneamente il Segretario Generale, nonché Dirigente del Settore Segreteria Affari Generali, Claudione dott.ssa Rosaria, in ferie dal 16/08/2016 al 02/09/2016;

D E T E R M I N A

1) la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di approvare la perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di recupero delle aree sportive della scuola secondaria della scuola secondaria G. Pavoncelli - CUP: J39D16000200007 CIG: 6643821E84 - in corso di esecuzione a cura dell'impresa "Pugliese Costruzioni e Servizi Srl", in virtù del contratto di appalto stipulato in data 23/09/2016 repertorio n.441, registrato a Cerignola in data 30/09/2016 al n. 1035 S.3^ aa.priv., redatta dal Direttore dei lavori, arch. Fedele Antonio Rosania, in conformità alle vigenti norme in materia di LL.PP. e favorevolmente vistata dal Direttore del Settore, ing. Clorindo Izzillo, in qualità anche di Responsabile del Procedimento;

3) di approvare l'atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa "Pugliese Costruzioni e Servizi Srl", immediatamente esecutivo per la stessa, in base al quale essa Impresa si impegna e si obbliga ad eseguire i maggiori lavori di cui alla presente perizia agli stessi patti e condizioni previsti nel citato contratto principale repertorio n.441/2016 ed ai prezzi in esso contemplati, nonché ai nuovi prezzi, individuati e concordati tra la Stazione Appaltante/D.L. e l'Impresa, quali riportati nello stesso atto di sottomissione, assoggettati anch'essi al ribasso contrattuale del 7,825%;

4) di dare atto che con la presente perizia di variante e suppletiva:

- l'importo per lavori viene rideterminato in € 61.953,82 al netto del ribasso d'asta del 7,825%, mentre vengono confermati gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso in € 886,42, stabilendo in € 62.840,24 il nuovo importo contrattuale, con l'incremento (rispetto all'originario di € 59.528,27) di € 3.311,97 pa-

- ri al 5,56% e, quindi, nei limiti previsti dalla vigente normativa, che trova copertura unitamente alla corrispondente IVA attraverso la parziale utilizzazione delle economie di gara (riportate nella voce "imprevisti");
- la intera spesa progettuale resta confermata in complessivi € 85.000,00, secondo il quadro nuovo economico analitico di spesa in narrativa dettagliatamente riportato, che si approva;
 - il termine per la esecuzione dei lavori, già fissato al 28/12/2016, viene prorogato al 03/01/2017, fatte salve eventuali sospensioni dei lavori;

5) ~~di approvare il 1° stato di avanzamento dei lavori emesso dal direttore dei lavori per il complessivo importo netto di € 32.093,23, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 282,04, ed eseguiti a tutto il 30/11/2016 dall'appaltatrice, in dipendenza del contratto di appalto rep.441/2016, nonché il relativo certificato di pagamento n.1, con il quale è stato accertato e riconosciuto a favore della predetta Ditta Pugliese Costruzioni e Servizi Srl il credito di € 31.934,17, oltre Iva nella misura come dovuta del 10% pari ad € 3.193,42 e, quindi, di complessivi € 35.127,59;~~

6) di approvare la parcella esibita dall'arch.Fedele Antonio Rosania inerente gli onorari per la redazione della perizia di variante e suppletiva pari ad € 1.450,00, nonché per la direzione, coordinamento della sicurezza, misura e contabilità dei lavori in argomento, maturati con la emissione del detto 1°SAL, pari ad € 3.000,00, oltre Cassa previdenziale 4% ed iva al 22% e, quindi, per un importo complessivo di 5.646,16;

→ 7) di liquidare e pagare, conseguentemente, gli accertati crediti a favore degli aventi causa di cui in seguito:

- ~~dell'impresa Pugliese Costruzioni e Servizi Srl di € 35.127,59, iva compresa, a titolo di corrispettivo 1° SAL CIG:6643821E84, giusta fattura elettronica n.1/E del 01.12.2016, acquisita al prot.n.35576 del 02/12/2016 - file n.56357117;~~
- del professionista Arch. Fedele Antonio Rosania di € 5.646,16, contributo cnpaia 4% ed iva al 22% compresi, a titolo di competenze per la redazione della perizia di variante e suppletiva, nonché per direzione, coordinamento sicurezza, misura e contabilità dei lavori maturati al 1°SAL - Z491321D03, giusta fattura elettronica n.04PA/2016 del 02.12.2016, acquisita al prot.n.37697 del 20/12/2016 - file n. 58068886;

8) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2016, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

9) di dare atto che la spesa di complessivi € 40.773,75 trova imputazione; quanto ad € 35.127,59 sul capitolo 34436 dei RR.PP. 2008, imp.n.4580 sub 5, il quale per effetto della intervenuta perizia dovrà essere aumentato di € 3.643,17 (da originari € 65.481,10 ad € 69.124,27), e ad € 5.646,16 sul medesimo capitolo 34436 dei RR.PP. 2008, imp.n.4580 sub 4 liquidazione 71, la quale, per effetto dei riconosciuti compensi per la redazione della perizia di variante e suppletiva, pari ad € 1.839,76 contributi cnpaia ed IVA compresi, dovrà essere aumentata di detti € 1.839,76 (da originarie 12.878,32 a € 14.718,08);

10) di impegnare la detta spesa di € 40.773,75, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n.4/2 al D. Lgs. 118/2011, al suddetto capitolo ed impegni, imputandola al bilancio 2016;

11) di dare atto che la redazione del presente atto è stata assegnata alla sig.ra Battaglino Anna, in servizio presso l'Ufficio Lavori Pubblici.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Izzillo Ing. Clorindo

Copia conforme all'originale, **23-12-2016**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **24-12-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **38101** del **23-12-16** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **23-12-16**.

Dal Palazzo di Città, **23-12-2016**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **24-12-16** al **07-01-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **09-01-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

PUGLIESE COSTRUZIONI E SERVIZI S.R.L.
VIA PIETRO MASCAGNI,44

71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva 03923810711 C.F. 03923810711

Codice 16746

Spett.le
Comune di Cerignola

PIAZZA DELLA REPUBBLICA,1

71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 1/E del 01-12-2016

Protocollo 35576 del 02-12-16

Pag. 1 di 1

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
LAVORI DI RECUPERO DELLE AREE SPORTIVE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 'PAVONCELLI' - LIQ. 1A° SAL. CAPITOLO 34436 IMPEGNO 4580 SUB 5 BILANCIO 2016 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 685/98 DEL 02/09/2016 CUP J39D16000200007 CIG 6643821E84 CIG 6643821E84			31.934,170000		31.934,17	10

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	31.934,17
Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	10	31.934,17	3.193,42	S
			Imponibile	31.934,17
			Imposta	3.193,42
			Totale	35.127,59
			IVA Vs.carico art.17-ter	-3.193,42
			Netto a pagare	31.934,17

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
31-12-2016

IBAN
IT47C086067838000000001327



CITTA' DI CERIGNOLA

Settore Amministrativo Area Tecnica – Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione

Prot.n° 32

Cerignola, 02 - 01 - 2017

OGGETTO: Lavori di recupero delle aree sportive della Scuola Media di 1° grado "G. Pavoncelli" di Cerignola. Liquidazione 1° SAL - CIG 6643821E84.

Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio
SEDE

Invito la S.V. a voler disporre il pagamento di complessivi € 35.127,59 a favore dell'impresa Pugliese Costruzioni e Servizi Srl, disposto con determinazione dirigenziale n. 1205/221 del 23/12/2016, a titolo di corrispettivo per di recupero delle aree sportive della Scuola Media di 1° grado "G. Pavoncelli" di Cerignola, Liquidazione 1° SAL, come di seguito specificato:

- € 35.127,19, così come da fattura n. 1/E del 01/12/2016, identificativo Sdl n. 56357117, acquisita al prot. n. 35576 del 02/12/2016, Scuola Media di 1° grado "G. Pavoncelli" - CIG 6643821E84 – CUP J39D16000200007.

Il suddetto importo dovrà essere corrisposto mediante bonifico sul c/c bancario comunicato dall'interessato, ai sensi dell'art.3, comma 7 della L.136/2010.

La suddetta spesa di complessivi € 35.127,19 trova imputazione sul capitolo 34436 – residui passivi 2008 - impegno n. 4580 sub 5, giusta D.D. 1205/221 del 23/12/2016.

Il Dirigente del Settore
Ing. Clorindo Izzillo

Si Allega:
fatture elettroniche esibite dal professionista;
comunicazione ex art.3, comma 7, legge 139/2012 e s.m. e i.

Versione 1.0

Notifica Esito Committente

Identificativo SdI: 56357117

Riferimento Fattura

Numero Fattura: 1/E

Anno Fattura: 2016

Posizione Fattura: 1

Esito: EC01 (Accettazione)

Descrizione: Fattura accettata

Message Id Committente: 001

Prot. N. 35576 hl 2.12.2016

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT04030410288**
Progressivo di invio: **ALB789126**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**
Telefono del trasmittente: **049 9426171**
E-mail del trasmittente: **fattura@2csolution.it**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03923810711**
Codice fiscale: **03923810711**
Denominazione: **PUGLIESE COSTRUZIONI E SERVIZI S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA PIETRO MASCAGNI**
Numero civico: **44**
CAP: **71042**
Comune: **CERIGNOLA**
Provincia: **FG**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0885417489**
Fax: **0885417489**
E-mail: **info@pugliesecostruzioni.com**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **00362170714**
Denominazione: **Comune di Cerignola**

Dati della sede


Indirizzo: **PIAZZA DELLA REPUBBLICA**
Numero civico: **1**
CAP: **71042**
Comune: **CERIGNOLA**
Provincia: **FG**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02046570426**
Denominazione: **Namirial SPA**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

IL RESPONSABILE
DELLA FATTURA ELETTRONICA
HA SOTTOSCRITTO E CONFERMATO
LA VERIDICITÀ E L'ACCURATEZZA
DEI DATI FISCALI E COMMERCIALI
INVIATI ALLA FATTURA


Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-12-01** (01 Dicembre 2016)
Numero documento: **1/E**
Importo totale documento: **35127.59**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo contratto: **N. 441**
Data contratto: **2016-09-23** (23 Settembre 2016)
Codice Unitario Progetto (CUP): **J39D16000200007**
Codice Identificativo Gara (CIG): **6643821E84**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **LAVORI DI RECUPERO DELLE AREE SPORTIVE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 'PAVONCELLI' - LIQ. 1° SAL. CAPITOLO 34436 IMPEGNO 4580 SUB 5 BILANCIO 2016 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 685/98 DEL 02/09/2016 CUP J39D16000200007 CIG 6643821E84**
Valore unitario: **31934.17**
Valore totale: **31934.17**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **31934.17**
Totale imposta: **3193.42**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **OPERAZIONE SOGGETTA ALLO SPLIT PAYMENT ART 17 TER DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2016-12-01** (01 Dicembre 2016)
Termini di pagamento (in giorni): **30**
Data scadenza pagamento: **2016-12-31** (31 Dicembre 2016)
Importo: **31934.17**
Codice IBAN: **IT47C0860678380000000001327**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

x 26/12/2016
16746

TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI
(art. 7, comma 1, lettera a, del D.L. 12/11/2010 n. 187)



Comune di Cerignola

Piazza della Repubblica, n. 1

71042 CERIGNOLA

OGGETTO: Appalto dei lavori di recupero delle aree sportive della Scuola secondaria di 1° grado "G. Pavoncelli" – contratto di appalto n. 441 del 23 settembre 2016. - Comunicazione resa ai sensi dell'art. 3, comma 7, Legge 13/08/2010, n. 136

Il sottoscritto: PUGLIESE GIROLAMO, nato a Cerignola il 2 marzo 1964 e residente a Cerignola in Viale G. Di Vittorio, n. 88, C.F.: PGL GLM 64C02 C514L, nella qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della Società **PUGLIESE COSTRUZIONI E SERVIZI S.r.l.**, con sede in Cerignola alla via Pietro Mascagni, n. 44, C.F. e P. IVA 03923810711, mail: info@pugliesecostruzioni.co. – pec.: pugliesecostruzionisrl@pec.it.

DICHIARA

che in relazione ai lavori in oggetto, il proprio conto corrente dedicato a commesse pubbliche, per gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ex legge n. 136/2010 s.m.i. è il seguente:

Istituto Bancario: **Banca di Credito Cooperativo di Canosa - Loconia Srl** sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti tramite bonifico bancario, così come previsto dalla L. 136/2010.

Filiale di CERIGNOLA:

COD. IBAN

I	T	4	7	C	0	8	6	0	6	7	8	3	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

I seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) delegati ad operare sul conto corrente dedicato:

a) Sig. **PUGLIESE GIROLAMO**, nato a Cerignola il 2 marzo 1964 e residente a Cerignola in Viale G. Di Vittorio, n. 88, C.F.: PGL GLM 64C02 C514L, operante in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della predetta Società.

Eventuali successive variazioni saranno comunicate alla Stazione Appaltante con le stesse modalità.

Di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi, previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.


Di essere informato, a norma dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è presentata.

Cerignola, primo dicembre 2016.

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Pugliese Costruzioni e Servizi Srl
Via R. Mascagni, 44
71042 CERIGNOLA (FG)
P.IVA: 03903810711

Si allega copia documento di identità

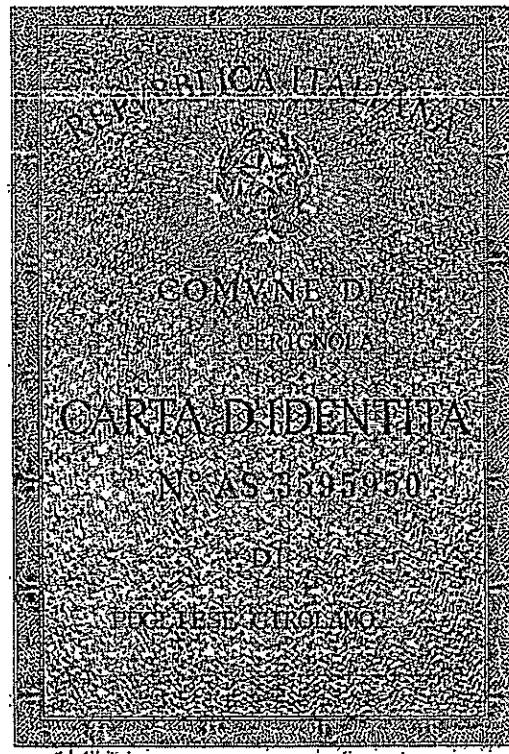

Cognome **PUGLIESE**
Nome **GIROLAMO**
nato il **02-03-1964**
(atto **00285** p.1 **A 1964**)
CERIGNOLA (FG)
Cittadinanza **Italiana**
Residenza **CERIGNOLA (FG)**
Via **LE DI VITTORIO GIUSEPPE 82 L.1**
Stato civile **CONIUGATO**
Professione **OMESSA L. 127/97 ART. 2**
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura **176**
Capelli **Brizzolati**
Occhi **Castani**
Segni particolari **NESSUNO**

Firma del titolare **PUGLIESE**
CERIGNOLA **15-08-2010**
Imposta del dolo
Indice sinistro
Ufficio Anagrafe
Ufficio Amministrativo
SINISI FRANCESCO

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLE FINANZE
Codice fiscale **PUGLIESE GIROLAMO**
Cognome **PUGLIESE**
Nome **GIROLAMO**
Indirizzo **CERIGNOLA**
Prov. **FG**
Data nascita **02-03-1964**
1993



Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201700000103004	Codice Fiscale: 03923810711
Identificativo Pagamento: PROT. 32/2017	Data Inserimento: 26/01/2017 - 10:48
Importo: 31934,17 €	Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente
Codice Utente: MRLNNL005	
Denominazione ente Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA	

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_5629306	Data richiesta	30/11/2016	Scadenza validità	30/03/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PUGLIESE COSTRUZIONI E SERVIZI SRL
Codice fiscale	03923810711
Sede legale	VIA PIETRO MASCAGNI, 44 71042 CERIGNOLA (FG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.
