



Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1475

del 11-04-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO


2017

Capitolo	34436	Art	0	Codice bilancio	Miss. 09 Prog. 02 Titolo 2 (09 02-2 02 01 09 016)	Gest.	RESIDUI/2008
RISTRUTTURAZIONI E REALIZZAZIONI ATTIVITA' SOCIO-AMBIENTALE ARREDO URBANO							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento SETTORE AMBIENTE		nr. 112	del. 20-02-2015
numero 71/2008		del 20-02-2015		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Affidamento incarico progettazione, direzione lavori e sicurezza intervento "RECUPERO AREE SPORTIVE SCUOLA PAVONCELLI". Attuazione D.G.C. n. 375/2014.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		PREVISIONE ASSESTATA		145.243,72	145.243,72
Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		PRECEDENTI PAGAMENTI		74.429,69	74.429,69
Titolo	2	Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO		3.806,40	3.806,40
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO		78.236,09	
3o Livello	01	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA		67.007,63	67.007,63
4o Livello	09	Beni immobili					
5o Livello	016	Impianti sportivi					
SIOPE	2020109016						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 3.806,40 diconsì TREMILAOTTOCENTOSEI/40							
Per : Affidamento incarico progettazione, direzione lavori e sicurezza intervento "RECUPERO AREE SPORTIVE SCUOLA PAVONCELLI". Attuazione D.G.C. n. 375/2014. PAGAMENTO FATTURA TECNICO ROSANIA FEDELE ANTONIO							

CREDITORE (Codice: 5352)				
ROSANIA FEDELE ANTONIO			VIA G.DORSO,30	
Cod.Fis. RSNFLN59P09D643N / P.Iva 01748520713			71100 FOGGIA	
			(FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:Z491321D03 SALDO Fatt.n. 02PA/2017 del 30/03/2017 DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA E PIANO DI SICUREZZA 2 SAL DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE AREE SPORTIVE SCUOLA MEDIA DI 1 GRADO G. PAVONCELLI DI CERIGNOLA Trib. 1040 AUTONOMI-PROF 20,00% su 3.000,00 *Ritenuta 600,00 Netto da Pagare: 3.206,40	3.806,40		2115
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	600,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	Unicredit filiale di Foggia (IT7100200815714000003940720) - CIN: O - ABI: 02008 - CAB: 15714 - C/C: 000003940720 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bagnicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1675 DEL 11/01/17 CAP. 34436 BIL. 2016

IMPEGNO N. 6580/4 LIQUIDAZIONE N. 71

(A) ONORARIO	€ <u>3.000,00</u>
(B) CONTRIB. CASSA (___%) DI A	€ <u>120,00</u>
(C) IMPONIBILE IVA (TOTALE A + B)	€ <u>3.120,00</u>
(D) IVA AL 22 % DI C	€ <u>684,40</u>
(E) SPESE ESENTI	€ <u>/</u>
(F) TOT.FATTURA(C +D+ E)(TOT. MANDATO)	€ <u>3.804,40</u>
(G) RITENUTA DEL 20% SU A	€ <u>600,00</u>
TOTALE DA LIQUIDARE A CREDITORE (F-G)	€ <u>3.206,40</u>

REVERSALE N. 1102

CREDITORE: COD.N. (5352) ROSANIA FEDELE ANTONIO

PAGAMENTO FATTURA N. 02PA 2017 DEL 30/03/2017

PROT. ENTRATA N. 9614 DEL 30/03/2017

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

DIREZIONI LAVORI - RISTRUTTURAZIONI ALBERGHI SPORTIVI "PANTONICOLA"

TOTALE FATTURA € 3.806,40

CIG: 849132D103 CUP: 539116000200007

SIOPE: 2115

DOCUMENTI: Delibera N. 375 del 16/12/2014

Determ. N. * 112/18 del 20/02/2015
685/18 02/08/2016

380/76

3/03/2017



CITTA' DI CERIGNOLA

Settore Amministrativo Area Tecnica – Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione

Prot. n° 9906

Cerignola, 6-6-2017

OGGETTO: Progettazione perizia di variante, direzione lavori, misure e contabilità e piano sicurezza dei lavori di adeguamento e ristrutturazione aree sportive Scuola Media di 1° grado "G. Pavoncelli" di Cerignola. Liquidazione 2° SAL - CIG Z491321D03.

Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio
SEDE

Invito la S.V. a voler disporre il pagamento di complessivi € 3.806,40 a favore dell'arch. Rosania Fedele Antonio, disposto con determinazione dirigenziale n. 380/76 del 31/03/2017, a titolo di 2° SAL per direzione lavori, misure e contabilità e piano sicurezza dei lavori di adeguamento e ristrutturazione aree sportive Scuola Media di 1° grado "G. Pavoncelli" di Cerignola, come di seguito specificato:

- € 3.806,40, così come da fattura n. 02PA/2017 del 30/03/2017, identificativo Sdl n. 67005546, acquisita al prot. n. 9614 del 30/03/2017, Scuola Media di 1° grado "G. Pavoncelli" - CIG Z491321D03 – CUP J39D16000200007.

Il suddetto importo dovrà essere corrisposto mediante bonifico sul c/c bancario comunicato dall'interessato, ai sensi dell'art.3, comma 7 della L.136/2010.

La suddetta spesa di complessivi € 3.806,40 trova imputazione sul capitolo 34436 – residui passivi 2008 - impegno n. 4580 sub 4, liquidazione n. 71, giusta D.D. 380/76 del 31/03/2017.



Il Dirigente del Settore
Ing. Clorindo Izzillo

Si Allega:
fatture elettroniche esibite dal professionista;
comunicazione ex art.3, comma 7, legge 139/2012 e s.m. e i.

Versione 1.0

Notifica Esito Committente

Identificativo SdI: **67005546**

Riferimento Fattura

Numero Fattura: **02PA/2017**

Anno Fattura: **2017**

Posizione Fattura: **1**

Esito: **EC01** (Accettazione)

Descrizione: **Fattura accettata**

Message Id Committente: **001**

Prot. 9614 del 30.3.2017

IL RESPONSABILE
SERVIZIO PUBBLICI E MANUTENZIONE
Ing. Claudio IZZILLO



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **ITDRNMHL66E30Z401W**
Progressivo di invio: **0000036270**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01748520713**
Codice fiscale: **RSNFLN59P09D643N**
Nome: **FEDELE ANTONIO**
Cognome: **ROSANIA**
Titolo: **ARCHITETTO**
Albo professionale di appartenenza: **ARCHITETTI P.P.C.**
Provincia di competenza dell'Albo: **FG**
Numero iscrizione all'Albo: **294**
Data iscrizione all'Albo: **1987-10-16** (16 Ottobre 1987)
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIALE PRIMO MAGGIO**
Numero civico: **20**
CAP: **71122**
Comune: **FOGGIA**
Provincia: **FG**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0881619040**
Fax: **0881619040**
E-mail: **fedeleantonio.rosania@fastwebnet.it**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00362170714**
Denominazione: **COMUNE DI CERIGNOLA**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA DELLA REPUBBLICA**
CAP: **71042**
Comune: **CERIGNOLA**
Provincia: **FG**
Nazione: **IT**

**Dati del terzo intermediario soggetto emittente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
Codice Fiscale: **01641790702**
Denominazione: **Teamsystem Service srl**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatture.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2017-03-30** (30 Marzo 2017)
 Numero documento: **02PA/2017**
 Importo totale documento: **3806.40**
 Causale: **DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA E PIANO DI SICUREZZA 2° SAL**
 Causale: **DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE AREE SPORTIVE SCUOLA MEDIA**
DI 1° GRADO "G. PAVONCELLI" DI CERIGNOLA
 Causale: **CAPITOLO 34436 - RESIDUI PASSIVI 2008, IMPEGNO DI SPESA N.4580 SUB 4**
-C.I.G.6643821E84 - CUP J39D16000200007

Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)
 Importo ritenuta: **600.00**
 Aliquota ritenuta (%): **20.00**
 Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello 770S)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC04** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)
 Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
 Importo contributo cassa: **120.00**
 Imponibile previdenziale: **3000.00**
 Aliquota IVA applicata: **22.00**

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: **Determ Dirigenziale**
 Data convenzione: **2015-02-20** (20 Febbraio 2015)
 Numero linea convenzione: **112/18**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z491321D03**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **Saldo onorario per la direzione dei lavori, misure e contabilità ed esecuzione piano sicurezza 2° SAL dei "lavori di adeguamento e ristrutturazione aree sportive scuola 1° "G. Pavoncelli" di Cerignola**
 Data inizio periodo di riferimento: **2016-10-13** (13 Ottobre 2016)
 Data fine periodo di riferimento: **2017-03-22** (22 Marzo 2017)
 Valore unitario: **3000.00**
 Valore totale: **3000.00**
 IVA (%): **22.00**
 Soggetta a ritenuta: **SI**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **3120.00**
 Totale imposta: **686.40**
 Esigibilità IVA: **D** (esigibilità differita)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **ARCHITETTO ROSANIA FEDELE ANTONIO**
 Modalità: **MP05** (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: **2017-03-30** (30 Marzo 2017)
 Termini di pagamento (in giorni): **30**



Data scadenza pagamento: **2017-04-30** (30 Aprile 2017)
Importo: **3206.40**
Cognome del quietanzante: **ROSANIA**
Nome del quietanzante: **FEDELE ANTONIO**
CF del quietanzante: **RSNFLN59P09D643N**
Titolo del quietanzante: **ARCHITETTO**
Istituto finanziario: **UNICREDIT**
Codice IBAN: **IT7100200815714000003940720**
Codice ABI: **02008**
Codice CAB: **15714**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it



Dott. Arch. Fedele Antonio Rosania

Viale 1° Maggio, 20 - 71100 Foggia – tel. 0880619040 - 360513522

p.iva 01748520713 C.F. RSNFLN59P09D643N

e.mail fedeleantonio.rosania@fastwebnet.it

Al Responsabile Settore LL.PP. - Urbanistica ed edilizia
Piazza della Repubblica
71042 Cerignola

Oggetto: "progetto di adeguamento e ristrutturazione aree sportive scuola media di 1° grado "G. Pavoncelli" di Cerignola.

Comunicazione Conto Corrente dedicato ai sensi dell'Art.3-L.13 Agosto 2010 n. 136

Relativamente all'affidamento del servizio in oggetto, il sottoscritto arch. Fedele A. Rosania con studio in Foggia al viale Primo Maggio,20 - P.IVA 00376860714, con la presente, dichiara che il Conto Corrente dedicato ai flussi finanziari della propria attività ai sensi dell'Art. 3 – Legge 13 Agosto 2010 n. 136 è il seguente:

Cod. IBAN IT71 O 02008 15714 000003940720 presso la BANCA Unicredit Filiale di Foggia.

Dichiara altresì, che sul succitato Conto Corrente Dedicato può accedere solo il sottoscritto arch. Fedele A. Rosania nato a Foggia il 09/09/1959 –

Cod. Fisc. RSN FLN 59P09D643N.

Dichiara altresì di non avere dipendenti nel proprio studio professionale.

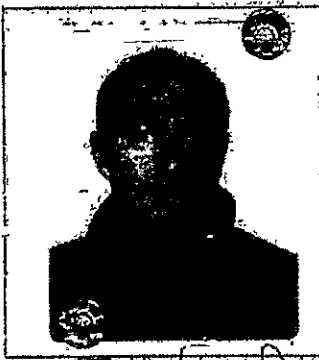


L'occasione è gradita per porgerle

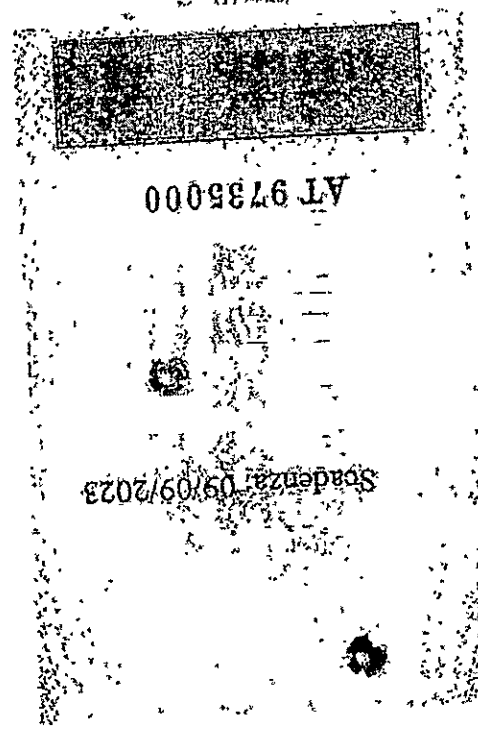
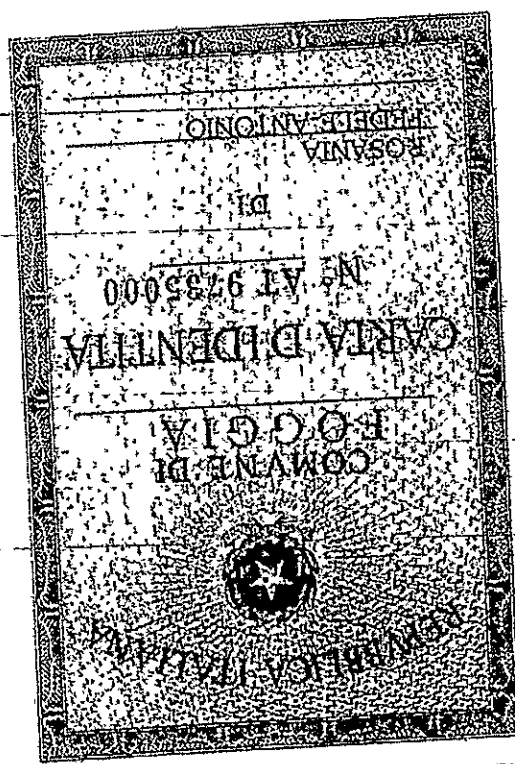
Distinti Saluti.

Foggia, 28 luglio 2015

f.to arch. Fedele A. Rosania

Cognome **ROSANIA**
 Nome **FEDERLE ANTONIO**
 Data di nascita **09/09/1959**
 Sesso **M**
 Comune di nascita **FOGGIA (FG)**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **Foggia**
 Via **VIALE I MAGGIO n.20**
 Stato civile **Marito**
 Professione **ARCHITETTO**
 Coniugati e contrassegni **SALIENTI**
 Statura **190 cm**
 Capelli **BRIZZOLATI**
 Occhi **VERDI**
 Segni particolari


 Firma del titolare 
FOGGIA il **28/06/2013**
 Imprimatur del notaio 
 Il prof. SINDACO
 IL FUNZIONARIO
 (Fernando Fischetti)

ROSANIA FEDELE ANTONIO
VIALE PRIMO MAGGIO,20

71122 FOGGIA (FG)

P.Iva 01748520713 C.F.
RSNFLN59P09D643N

Codice 5352

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA

71042 CERIGNOLA (FG)

P.Iva 00362170714 C.F.

Fattura 02PA/2017 del 30-03-2017

Protocollo 9614 del 30-03-17

Pag. 1 di 1

DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA' E PIANO DI SICUREZZA 2° SAL

Convenzione Determ Dirigenziale del 20-02-2015 CIG Z491321D03

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Importo contributo cassa TC04					120,00	22
	Saldo onorario per la direzione dei lavori, misure e contabilit� ed esecuzione piano sicurezza 2� SAL dei "lavori di adeguamento e ristrutturazione aree sportive scuola 1� "G. Pavoncelli" di Cerignola			3.000,000000		3.000,00	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta 600,00 Imponibile merce 3.120,00

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	3.120,00	686,40 D

Imponibile	3.120,00
Imposta	686,40
Totale	3.806,40
Ritenuta	-600,00
Netto a pagare	3.206,40

Modalit  pagamento
Bonifico

Scadenza 30-04-2017
Banca UNICREDIT

IBAN
IT7100200815714000003940720



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto N.380/76

In data 31-03-17

OGGETTO: Adeguamento e ristrutturazione dell'area sportiva della scuola secondaria di 1° grado "G.Pavoncelli" - 2° stato di avanzamento lavori e parcella professionale - Liquidazione corrispettivi.

Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 31-03-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di **marzo**, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**LL.PP. - MANUTENZIONI -
AMBIENTE - VERDE PUBBLICO**

OO.PP.-MANUTENZIONE

Izzillo Ing. Clorindo, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 375 del 16/12/2014 è stata programmata la spesa di € 85.000,00 per la manutenzione e riattamento dello spazio sportivo ubicato all'interno dell'aria della Scuola Media "G. Pavoncelli" per renderlo fruibile sia agli alunni della scuola che alla collettività, mirando altresì all'obiettivo di rifunionalizzare un'area a scopo di socializzazione e prevenire fenomeni di devianza minorile.

Con determinazione dirigenziale n. 112/18 del 20/02/2015, data la ormai constatata carenza di personale interno alla struttura ed in attuazione della citata delibera G.C.n.375/2014, si è provveduto ad incaricare l'Arch. Fedele Antonio Rosaria, con studio in foggia al Viale 1° Maggio n.20, della progettazione definitiva ed esecutiva, direzioni lavori, misure e contabilità, rilievi topografici, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e certificazione di regolare esecuzione dell'intervento di "Recupero di due spazi d'attività esistenti nell'area della Scuola Media Pavoncelli.

In data 26 marzo 2015, acquisita al protocollo n.7333, l'arch. Fedele Antonio Rosania ha trasmesso il progetto in oggetto che veniva approvato con atto della Giunta comunale n. 272 del 23/10/2015.

La spesa progettuale di € 85.000,00 è stata imputata al capitolo 34436 dei RR.PP. 2008 - imp. n. 4580 e l'intervento è inserito nel Piano Triennale dei LL.PP. 2015-2017, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.198 del 30/07/2015.

Considerato che l'importo dei lavori per la realizzazione dell'intervento in argomento è inferiore alla soglia di cui all'art. 37 del D. Lgs. 50/2016 (€ 150.000,00), con determinazione dirigenziale n.504/53 del 04/07/2016 si è proceduto all'indizione della gara di appalto, individuando nella procedura negoziata il procedimento di scelta del contraente, di cui all'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50 del 18/04/2016, con il sistema di aggiudicazione di cui all'art.95 dello stesso D.Lgs n.50/2016.

L'invito di gara, prot. n. 19105 del 05/07/2016, è stato diramato in pari data via pec a n. 17 Ditte. Con ordine di servizio del 19/10/2016 è stata costituita la Commissione di gara.

Entro il termine fissato per la ricezione delle offerte (ore 12,00 del 18/07/2016) è pervenuto un solo plico contenente la documentazione e l'offerta della Ditta Pugliese Costruzioni e Servizi Srl.

Con determinazione dirigenziale n. 685/98 del 02/09/2016, preso atto della regolarità della procedura di gara - CUP: J39D16000200007 CIG: 6643821E84 - si è proceduto ad approvare il verbale di gara del 19/07/2016 ed aggiudicare definitivamente i lavori alla ditta Pugliese Costruzioni

e Servizi srl -con sede in Cerignola alla Via P. Mascagni n. 44 - per il prezzo di € 58.641,85, al netto del ribasso offerto del 7,825% (sconto di € 4,978,27) sulla base d'asta soggetta a ribasso di € 63.620,12, oltre € 886,42 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e, quindi, per l'importo di € 59.528,27, oltre IVA al 10% pari ad € 5.952,83.

Tra la citata aggiudicataria e l'Amministrazione è stato stipulato, per scrittura privata, il relativo contratto di appalto repertorio n.441 del 23/09/2016, registrato a Cerignola in data 30/09/2016 al n. 1035 S.3^ aa.pp.

I lavori sono stati consegnati in data 13/10/2016, giusto verbale in atti, e regolarmente e concretamente iniziati in pari data.

In fase esecutiva dei lavori sono emerse delle criticità per la risoluzione delle quali, su parere del RUP, il Direttore dei lavori ha proceduto alla redazione di apposita perizia di variante e suppletiva, contenuta nell'importo complessivo del finanziamento assunto per la realizzazione dell'opera.

La variante tecnica, approvata con determinazione dirigenziale n.1205/221 del 23/12/2016, più onerosa rispetto alla iniziale progettazione, ha previsto la revisione del progetto, senza alterarne l'importazione originaria, per il recupero e l'ottimale distribuzione delle somme a disposizione da destinare ai lavori a corpo.

Per effetto della stessa l'importo per lavori è stato rideterminato in € 61.953,82 al netto del ribasso d'asta del 7,825% (applicato sull'importo computato di 67.213,26), mentre gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso sono rimasti confermati in € 886,42 stabilendo, pertanto, in € 62.840,24 il nuovo importo contrattuale, che ha trovato copertura attraverso la parziale utilizzazione delle economie di gara (riportate nella voce "imprevisti").

La ditta aggiudicataria dei lavori, Pugliese Costruzioni e Servizi Srl, con la sottoscrizione dell'atto di sottomissione, datato 30 novembre 2016, ha accettato l'esecuzione dei lavori di perizia agli stessi patti e condizioni previsti nel contratto principale repertorio n. 441 stipulato in data 23/09/2016 nonché ai nuovi prezzi individuati e concordati sulla base dei prezzi elementari del citato contratto, tra la Stazione Appaltante/D.L. e l'impresa, assoggettati anch'essi al ribasso contrattuale.

Il termine per la esecuzione dei lavori è stato prorogato di 10 giorni, fatte salve eventuali sospensioni dei lavori.

Il quadro economico di perizia ha confermato la spesa progettuale di € 85.000,00, come di seguito ridefinita, e

trova imputazione al capitolo 34436, cod. bilancio 09.02-2.02.01.09.000, impegno 4580:

	Pre-gara €	Post-gara €	Variante €
Lavori			
lavori	54.452,22		
Incidenza manodopera	9.167,90		
A. Lavori	63.620,12	58.641,85	61.953,82
costi diretti sicurezza	580,78	580,78	
costi indiretti sicurezza	305,64	305,64	
C) COSTI PER ATTUAZIONE SICUREZZA	886,42	886,42	886,42
	64.506,54	59.528,27	62.840,24
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA sui lavori 10% di (A+B)	6.450,65	5.952,83	6.284,02
spese tecniche			
Progettazione esecutiva. Direzione lavori, misure e contabilità. Rilievi topografici. Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.	9.500,00	9.500,00	10.950,00
Certificato di regolare esecuzione	650,00	650,00	650,00
CNPAIA 4% di d2 + d3	406,00	406,00	464,00
IVA su spese tecniche E CNPAIA 22%	2.322,32	2.322,32	2.654,08
incentivo RUP	1.161,12	1.161,12	1.157,65
per lavori a fattura ed imprevisti	3,37	5.479,47	0,00
D) IN UNO A DISPOSIZIONE	20.493,46	25.471,73	22.159,75
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL PROGETTO	85.000,00	85.000,00	85.000,00

Ciò stante, il direttore dei lavori, arch. Fedele A. Rosania, ha trasmesso, con nota acquisita in data 23/03/2017 al prot. n. 9020, il 2° ed ultimo stato di avanzamento dei lavori, eseguiti a tutto il 09/03/2017 dalla ditta aggiudicataria, "Pugliese Costruzioni e Servizi Srl", per il complessivo importo netto di € 62.840,24, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 886,43, nonché il relativo certificato di pagamento n.2, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, ing. Clorindo Izzillo, con il quale, dedotti le ritenute di legge e l'acconto di cui al 1° SAL, è stato accertato e riconosciuto a favore della predetta Ditta appaltatrice il credito di € 30.596,31, oltre Iva nella misura come dovuta del 10% pari ad € 3.059,63 e, quindi, di complessivi € 33.655,94.

Unitamente allo stato di avanzamento il professionista ha altresì trasmesso la parcella inerente gli onorari per la direzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità dei lavori in argomento, maturati con la emissione del detto 2° ed ultimo SAL, dell'importo di € 3.000,00, oltre Cassa previdenziale 4% ed iva al 22% e, quindi per un importo complessivo di € 3.806,40.

Considerata la regolarità degli atti, si ritiene di procedere all'approvazione:

- del 2° ed ultimo stato di avanzamento lavori e relativo certificato di pagamento;
- della parcella professionale a tutto il 2° ed ultimo SAL;

con contestuale riconoscimento dei crediti di seguito liquidabili a favore:

- dell'impresa "Pugliese Costruzioni e Servizi Srl", dell'accertato credito di complessivi € 33.655,94, iva al 10% compresa, a titolo di corrispettivo 2° SAL, che trova capienza al finanziamento assunto per la realizzazione dell'opera ed imputazione al capitolo 34436 dei RR.PP. 2008, imp. n. 4580 sub 5;
- dell'arch. Fedele Antonio Rosania, dell'importo di € 3.806,40, contributo cnpaia 4% ed iva al 22% compresi, che trovano altresì imputazione al capitolo 34436 dei RR.PP. 2008, imp. n. 4580 sub 4 liquidazione 71.

Al progetto in argomento, è stato assegnato il seguente CUP: J39D16000200007; ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex Art.3 L. n.136 dell'13 agosto 2010, recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12/11/2010, n.187 convertito con modificazioni nella legge n.217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", all'attività inerente l'esecuzione dei lavori è stato assegnato il codice CIG:6643821E84 mentre a quella relativa le prestazioni tecnico-professionali il CIG:Z491321D03.»

Visto il D. Lgs. 50 del 18/04/2016;

Ai sensi dell'artt. 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, si dispone la pubblicazione del presente atto, nella sezione del link "*Amministrazione trasparente*", sotto sezione "bandi di gara e contratti";

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità

finanziaria" che prevede che : "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 21/03/2016, prot. n. 60/Gab., con il quale si affida all'ing. Clorindo Izzillo, la Dirigenza del Settore comprendente i Servizi Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente e Verde Pubblico;

Visto il decreto del Sindaco del 18/09/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquichio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

Visto il decreto del Sindaco del 03/08/2016, prot. n. 169/GAB., con il quale il Dirigente del Settore Risorse Umane - Servizi Demografici - Sviluppo Economico, Valentino dott.ssa Maria Concetta, sostituisce temporaneamente il Segretario Generale, nonché Dirigente del Settore Segreteria Affari Generali, Claudione dott.ssa Rosaria, in ferie dal 16/08/2016 al 02/09/2016;

D E T E R M I N A

1) la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di approvare il 2° stato di avanzamento dei lavori di recupero delle aree sportive della scuola secondaria della scuola secondaria G. Pavoncelli - CUP: J39D16000200007 CIG: 6643821E84 - emesso dal direttore dei lavori, arch. Fedele Antonio Rosania, per il complessivo importo netto di € 62.840,24, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 886,43, ed eseguiti a tutto il 30/11/2016 dall'appaltatrice "Pugliese Costruzioni e Servizi Srl", in dipendenza del contratto di appalto stipulato in data 23/09/2016 repertorio n.441 e successivo atto di sottomissione approvato con determinazione n.1205/221 del 23.12.1026, nonché il relativo certificato di pagamento n.2, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, ing. Clorindo Izzillo, con il quale, dedotti le ritenute di legge e l'acconto di cui al 1° SAL, è stato accertato e riconosciuto a favore della predetta Appaltatrice il credito di € 30.596,31, oltre Iva nella misura come dovuta del 10% pari ad € 3.059,63 e, quindi, di complessivi € 33.655,94;

3) di approvare la parcella esibita dall'arch. Fedele Antonio Rosania inerente gli onorari per la direzione, coordinamento della sicurezza, misura e contabilità dei lavori in argomento, maturati con la emissione del detto 1°SAL, pari ad € 3.000,00, oltre Cassa previdenziale 4% ed iva al 22% e, quindi, per un importo complessivo di € 3.806,40;

4) di liquidare gli accertati crediti a favore degli aventi causa di cui in seguito:

- dell'impresa Pugliese Costruzioni e Servizi Srl di € 33.655,94, iva compresa, a titolo di corrispettivo 2° SAL CIG:6643821E84, giusta fattura elettronica n.1/E del 24.03.2017, acquisita al prot.n. 9147 del 27/03/2017-file n.66600676;
- del professionista Arch. Fedele Antonio Rosania di € 3.806,40, contributo cnpaia 4% ed iva al 22% compresi, a titolo di competenze per direzione, coordinamento sicurezza, misura e contabilità dei lavori maturati al 1°SAL - Z491321D03, giusta fattura elettronica n.02PA/2017 del 30.03.2017, acquisita al prot.n.9614 del 30/03/2017 - file n. 67005546;

5) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2017, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

6) di dare atto che la spesa di complessivi € 37.462,34 trova imputazione sul capitolo 34436, cod.bilancio 09.02-2.02.01.09.000, RE 2008, imp.n.4580, a valere quanto ad € 33.655,94 sub 5, e ad € 3.806,40 sul medesimo capitolo 34436 dei RR.PP.2008, imp.n.4580 sub 4 liquidazione 71;

7) di liquidare la spesa di € 33.655,94, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n.4/2 al D. Lgs. 118/2011, al suddetto capitolo ed impegni, imputandola al bilancio 2017;

8) di dare atto che la redazione del presente atto è stata assegnata alla sig.ra Battaglino Anna, in servizio presso l'Ufficio Lavori Pubblici.

**CITTÀ DI CERIGNOLA**

(Provincia di Foggia)

Piazza della Repubblica N. 1

71042 – Cerignola

Partita Iva e C.F. 00362170714

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA**

Atto N. 380/76

In data 31-03-17

OGGETTO: Adeguamento e ristrutturazione dell'area sportiva della scuola secondaria di 1° grado "G.Pavoncelli" - 2° stato di avanzamento lavori e parcella professionale - Liquidazione corrispettivi.

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 33.655,94 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione
33.655,94	09.02-2.02.01.09.003	34436/	2008	350	31-12-2008

*Cerignola, li 31-03-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA****F.to Buquicchio Dott. Giovanni**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Izzillo Ing. Clorindo

Copia conforme all'originale, **31-03-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **01-04-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **9746** del **31-03-17** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **31-03-17**.

Dal Palazzo di Città, **31-03-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **01-04-17** al **15-04-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **17-04-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria
