



Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1509

del 13-04-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	30596	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 2 (04 02-2 02 01 09 003)	Gest.	RESIDUI/2016
MESSA IN SIC. NON STRUTT. SC. ELEM. - ITIS A. RIGHI - CONTR. STATALE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 316	del. 22-03-2017
numero 315/2014 del 16-03-2017				Immed. Esequibile/Esecutiva			
Delibera CIPE n.6/2012 - Programma straordinario stralcio interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, prevenzione e riduzione rischio connesso alla vulnerabilità elementi anche non strutturali - Istituto ex ITIS							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA		444.493,40	820.872,14
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI		199.970,22	199.970,22
Titolo	2	Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO		69.930,40	69.930,40
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO		269.900,62	
3o Livello	01	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA		174.592,78	550.971,52
4o Livello	09	Beni immobili					
5o Livello	003	Fabbricati ad uso scolastico					
SIOPE	2020109003						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 4) CONTRIBUTI REGIONALI					Fruttifero	C.U.P. J36E12000670001
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 69.930,40 diconsì SESSANTANOVEMILANOVECENTOTRENTA/40							
Per : Delibera CIPE n.6/2012 - Programma straordinario stralcio interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, prevenzione e riduzione rischio connesso alla vulnerabilità elementi anche non strutturali - Istituto ex ITIS							

CREDITORE (Codice: 1298)				
CADINVEST S.R.L. P.Iva 01934460716		VIA SESTRIERE 2 71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:66494389D1 ACCONTO Fatt.n. 3/EL del 23/03/2017 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ISTITUTO SCOLASTICO A. RIGHI-VIA XXV APRILE. DETERMINA N. 316/61 DEL 22/03/2017 CONTR. APPALTO REP. 185 DEL 12/10/16 REG. 12/10/16 AL N. 2673 SERIE 1T-CAPITOLO 30596 IMPEG Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 57.320,00 *Ritenuta Netto da Pagare:	69.930,40 12.610,40 57.320,00	 57.320,00	2109
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE		12.610,40
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCO DI NAPOLI (IT 57 D 01010 78382 100000001381) - CIN: D - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 100000001381 IBAN: IT57D0101078382100000001381 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1509 DEL 13/04/17 CAP. 30596 BIL. _____

IMPEGNO N. 10355082 LIQUIDAZIONE N. 315

IMPONIBILE € 57.320,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 12.610,40
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 69.930,40
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1136

CREDITORE: COD. N. (1298) CASINUS S.R.L.

PAGAMENTO FATTURA N. 3/EL DEL 23/03/2017

PROT. ENTRATA N. 9168 DEL 27/03/2017

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

LAVORI DI RESSA IN SICUREZZA ISTITUTO SCOLASTICO "A. RIBATTI"
ACCONTO FATTURA

TOTALE FATTURA € 204.736,65

CIG: 66494389D1 CUP: 536 E 120006 0001

SIOPE: 2109

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(Liquidazione) Determ. N. 316/61 del 22/03/17



CITTA' DI CERIGNOLA

Settore Amministrativo Area Tecnica – Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione

Prot.n° 9551

Cerignola, 30-03-2017

OGGETTO: Delibera CIPE n. 6/2012 – Programma straordinario stralcio interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, prevenzione e riduzione rischio connesso alla vulnerabilità elementi anche non strutturali – Istituto ex ITIS Augusto Righi – 2° SAL. Liquidazione compensi Cadinvest Srl - CIG 66494389D1.

Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio
SEDE

Invito la S.V. a voler disporre il pagamento di complessivi € 69.930,40 a titolo di acconto sulla maggiore somma di € 204.736,65 così come da fattura n. 3/EL del 23/03/2017, identificativo Sdl n. 66617505, acquisita al prot. n. 9148 del 27/03/2017, Istituto ex ITIS Augusto Righi – 2° SAL - CIG 66494389D1 – CUP J36E12000670001 a favore dell'impresa Cadinvest Srl, disposto con determinazione dirigenziale n. 316/61 del 22/03/2017, a titolo di 2° SAL dei lavori per la "Messa in sicurezza e la prevenzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, nell'Istituto scolastico A. Righi" di Cerignola.

Il suddetto importo dovrà essere corrisposto mediante bonifico sul c/c bancario comunicato dall'interessato, ai sensi dell'art.3, comma 7 della L.136/2010.

La suddetta spesa di complessivi € 69.930,40 trova imputazione all'intervento 4.02-2.02.01.09.003, cap. 30596, impegni 1034-2015 RE 2016 sub 4 per € 43.752,18 e 1035-2014 RE 2014 sub 2 per € 26.178,22 giusta Determina Dirigenziale n. 316/61 del 22/03/2017.



Il Dirigente del Settore
Ing. Clelio Izzillo

Si Allega:
durc;
fattura elettronica;
comunicazione ex art.3, comma 7, legge 139/2012 e s.m. e i.

Versione 1.0

Notifica Esito Committente

Identificativo Sdi: 66617505

Riferimento Fattura

Numero Fattura: 3/EL

Anno Fattura: 2017

Posizione Fattura: 1

Esito: **EC01** (Accettazione)

Descrizione: **Fattura accettata**

Message Id Committente: 001

Prot. 9148 dl 28-3-2017



IL DIRIGENTE
 SOSTITUTO DIRETTORE
 Ing. **Clorindo IZZILLA**

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: ALB946270
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01934460716
Codice fiscale: 01934460716
Denominazione: CADINVEST S.R.L.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA SESTRIERE
Numero civico: 2
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FG
Numero di iscrizione: 157699
Capitale sociale: 118500.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0885422125
Fax: 0885422125
E-mail: donato.calice@cadinvest.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA
Numero civico: SN
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426
Denominazione: Namirial SPA

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)



Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2017-03-23** (23 Marzo 2017)
 Numero documento: **3/EL**
 Importo totale documento: **204736.65**
 Causale: **LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ISTITUTO SCOLASTICO A. RIGHI-VIA XXV APRILE. DETERMINA N. 316/61 DEL 22/03/2017 CONTR. APPALTO REP. 185 DEL 12/10/16 REG. 12/10/16 AL N. 2673 SERIE 1T-CAPITOLO 30596 IMPEG**
 Causale: **NO 1034-2015 RE 2016 SUB. 4 LIQUIDAZIONE 314; IMPEGNO 1035-2014 RE 2016 SUB. 2 LIQUIDAZIONE 315. II SAL. CUP J36E12000670001 CIG 66494389D1**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
 Identificativo ordine di acquisto: **DETERMINA 316/61**
 Data ordine di acquisto: **2017-03-22** (22 Marzo 2017)
 Codice commessa/convenzione: **CAP.30596-IMP.1034-2015 RE2016 SUB4 LIQ. 214**
 Codice Unitario Progetto (CUP): **J36E12000670001**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **66494389D1**

 Identificativo ordine di acquisto: **DETERMINA 316/61**
 Data ordine di acquisto: **2017-03-22** (22 Marzo 2017)
 Codice commessa/convenzione: **CAP.30596 IMP.1035-2014 RE2016 SUB2 LIQ.315**
 Codice Unitario Progetto (CUP): **J36E12000670001**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **66494389D1**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
 Identificativo contratto: **REP. 185**
 Data contratto: **2016-10-12** (12 Ottobre 2016)
 Codice Unitario Progetto (CUP): **J36E12000670001**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **66494389D1**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura*Nr. linea: 1*

Descrizione bene/servizio: **LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ISTITUTO SCOLASTICO A. RIGHI-VIA XXV APRILE. DETERMINA N. 316/61 DEL 22/03/2017 CONTR. APPALTO REP. 185 DEL 12/10/16 REG. 12/10/16 AL N. 2673 SERIE 1T-CAPITOLO 30596 IMPEGNO 1034-2015 RE 2016 SUB. 4 LIQUIDAZIONE 314; IMPEGNO 1035-2014 RE 2016 SUB. 2 LIQUIDAZIONE 315. II SAL. CUP J36E12000670001 CIG 66494389D1**
 Quantità: **1.00**
 Unità di misura: **N**
 Valore unitario: **167816.93**
 Valore totale: **167816.93**
 IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **167816.93**
 Totale imposta: **36919.72**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: **ART. 17 TER DPR 633/72**

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **CADINVEST SRL**

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2017-03-23** (23 Marzo 2017)
Termini di pagamento (in giorni): **30**
Importo: **167816.93**
Codice IBAN: **IT57D0101078382100000001381**
Codice ABI: **01010**
Codice CAB: **78382**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Fattura 3.el.pdf**
Formato: **PDF**
Descrizione: **FATTURA 3/EL**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_6504946	Data richiesta	23/02/2017	Scadenza validità	23/06/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CADINVEST SRL
Codice fiscale	01934460716
Sede legale	VIA SESTRIERE,, 2 71042 CERIGNOLA (FG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Spett.le COMUNE DI CERIGNOLA
Settore Lavori Pubblici, Manutenzione

OGGETTO: Comunicazione di attivazione o utilizzo di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010.

In relazione all'appalto dei lavori avente per oggetto "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL' ISTITUTO SCOLASTICO RIGHI A CERIGNOLA (FG)", affidati da codesto Ente, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n.136/2010,

SI COMUNICA

la precedente sussistenza di un conto corrente dedicato utilizzato per la gestione dei movimenti finanziari relativi agli appalti pubblici, essendo destinato a tale funzione, presso il Banco di Napoli – Filiale di Cerignola con i seguenti dati identificativi del conto corrente:

- codice IBAN IT57D0101078382100000001381.

Intestatario del conto è la sottoscritta Società e il soggetto delegato ad operare sullo stesso è:

- ing. Donato Calice, nato il 02/01/1949 a Cerignola ed ivi residente in Via M. SS. Ausiliatrice n. 163, C.F.: CLC DNT 49A02 C514I;

SI SEGNALE

che anche per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con il vostro Ente ci si avvarrà – fatte salve le eventuali modifiche successive, debitamente comunicate, – del medesimo conto corrente dedicato, senza necessità di formulare apposite comunicazioni per ciascuna commessa.




Il Legale Rappresentante

Scadenza 02-01-2023
Diritti 5.42

AT 1331847

IPZS 394-OFFICIA CV. ROMA

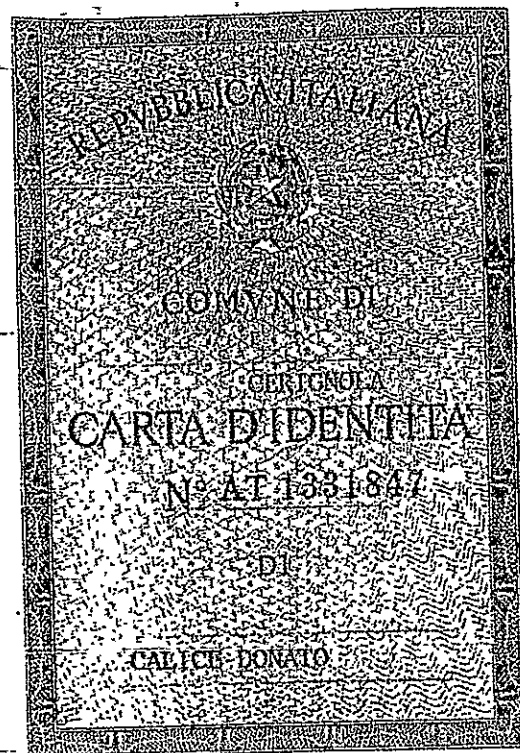

Cognome	CALICE
Nome	DONATO
nato il	02-01-1949
(atto n. P. 1 S. A 1949)	
a	CERIGNOLA (FG)
	italiana
Cittadinanza	CERIGNOLA (FG)
Residenza	LE MARIA S.S. AUSILIATRICE 163
Via	CONIUGATO
Stato civile	MESSA: L. 127/97 ART. 2
Professione	
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura	180
Capelli	Castani
Occhi	Verdi
Segni particolari	NESSUNO

Firma del titolare <i>[Signature]</i>	
CERIGNOLA, il 09-07-2012	
Impronta del dito Indice sinistro	IL SINDACO L'Ufficiale Anagrafe DELEGATO SINISTRO



CADINVEST S.R.L.
VIA SESTRIERE,2

71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva 01934460716 C.F. 01934460716
Codice 1298

Spett.le
Comune di Cerignola

PIAZZA DELLA REPUBBLICA,SN
71042 CERIGNOLA (FG)
P.Iva C.F. 00362170714

Fattura 3/EL del 23-03-2017

Protocollo 9148 del 27-03-17 Pag. 1 di 1

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ISTITUTO SCOLASTICO A. RIGHI-VIA XXV APRILE. DETERMINA N. 316/61 DEL 22/03/2017 CONTR.
APPALTO REP. 185 DEL 12/10/16 REG. 12/10/16 AL N. 2673 SERIE 1T-CAPITOLO 30596 IMPEG

Ordine DETERMINA 316/61 del 22-03-2017 CIG 66494389D1 CUP J36E12000670001

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
CUP J36E12000670001 CIG 66494389D1	N	1,000	167.816,930000		167.816,93	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	167.816,93
----------------	-------	----------	------------------	------------

C.	Descrizione	%	Riepilogo Iva	Imponibile	Iva	Es.
		22		167.816,93	36.919,72	S

Imponibile	167.816,93
Imposta	36.919,72
Totale	204.736,65
IVA Vs. carico art.17-ter	-36.919,72
Netto a pagare	167.816,93

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
22-04-2017

IBAN
IT57D0101078382100000001381

Via Sestriere n°2 - 71042 Cerignola (Fg)
Tel. 0885.422125 - Fax 0885.321525
Partita Iva: 01934460716
e-mail: info@cadinvest.it
N°REA 157699 di Foggia
Capitale Sociale € 118.500,00 int.versato

SISTEMA GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2008

SIN CERT

COMUNE DI CERIGNOLA
P.ZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA

TIPO DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO
Fattura	3/EL	23/03/2017

DATAORDINE CLIENTE COD CLIENTE LUOGO DI DESTINAZIONE / SE DIVERSO ;
0137

PARTE IVA - COD FISC COD AG COD ZONA CAUSA DEL TRASPORTO
00362170714

PAGAMENTO

COME CONVENUTO

BANCA D'APPOGGIO

BANCO DI NAPOLI

COD ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	% SC	IMPORTO €	% IVA
-	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ISTITUTO SCOLASTICO A.RIGHI VIA XXV APRILE. DETERMINA N.316/61 DEL 22/3/2017 CONTR. D'APPALTO REP.185 DEL 12/10/16 REG.IL 12/10/16 AL N.2673 SERIE 1T. CAPITOLO 30596 IMPEGNO 1034-2015 RE 2016 SUB 4 LIQUIDAZIONE 314; IMPEGNO 1035-2014 RE 2016 SUB 2 LIQUIDAZIONE 315. CUP J36E12000670001 CIG 66494389D1 OPERAZIONE ASSOGGETTATA A "SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART.17 TER DPR 633/72. 2° SAL.		1.0	167816.93		167816.93	22

Cod. IBAN: IT57D01010783821000000001381

IMPORTO MERCE	TOTALE SCONTI	IMPORTO NETTO	BOLLI	SPESA INCASSO	RISPONIBILE	TIVA	IMPOSTA
		167.816,93			167.816,93	22	36.919,72

TOTALE IMPOSSIBILE	TOTALE IVA	ACCONTO	NETTO PAGARE
167816,93	36.919,72		204.736,65

informativa art. 13 D Lgs 196/03

1. I dati da Voi forniti erano: dati della attività lavorativa presso la nostra sede legale esclusi i momenti per i quali l'attività lavorativa è sospesa, con la risultante della percentuale corrispondente.

SCADENZE IMPORTI

TOTALE FATTURA IN EURO

204,736,65

CONDIZIONI DI VENDITA: la presente è a titolo di vendita del bene descritto in questa offerta. Il bene è venduto "come visto e toccato". Il compratore accetta di acquistare il bene in stato di fatto e di diritto, senza che il venditore si assuma alcuna responsabilità per vizi o difetti, visibili o non visibili, e per qualsiasi altro motivo. Il compratore è responsabile di verificare lo stato del bene prima di acquistarlo. Il venditore non è responsabile per qualsiasi danno o perdita, diretta o indiretta, derivante dall'uso del bene. Il compratore è responsabile di pagare il prezzo di acquisto entro il termine stabilito. Il venditore non è responsabile per qualsiasi danno o perdita, diretta o indiretta, derivante dall'uso del bene. Il compratore è responsabile di pagare il prezzo di acquisto entro il termine stabilito.

DITTA VETTORE

DATARIPO

* COPARTIRO FIRMA DEL VETERE

DATAPARITENZA

ORA PATENZA: FIRMA DEL DESTINATARIO

ANNOTAZIONI E VARIAZIONI



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto N.316/61

In data 22-03-17

OGGETTO: Delibera CIPE n.6/2012 - Programma straordinario stralcio interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, prevenzione e riduzione rischio connesso alla vulnerabilità elementi anche non strutturali - Istituto ex ITIS Augusto Righi - 2° SAL e relativa parcella professionale - Liquidazioni.

Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 22-03-2017
Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventidue del mese di marzo, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**LL.PP. - MANUTENZIONI -
AMBIENTE - VERDE PUBBLICO**

OO.PP.-MANUTENZIONE

Izzillo Ing. Clorindo, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, la Molise, la Puglia e la Basilicata - sede coordinata di Bari, al fine di prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità di elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici, ha disposto apposito sopralluogo presso l'edificio sede dell'istituto scolastico "ITIS - Augusto Righi" di Via XXV Aprile, effettuato da proprio Tecnico rilevatore in data 18.09.2009, durante il quale sono state riscontrate problematiche appositamente riportate nella predisposta scheda di rilevamento.

Con delibera C.I.P.E. n. 6 del 20/01/2012 pubblicata sulla G.U.R.I. n. 88 del 14/04/2012, è stata disposta, tra l'altro, l'assegnazione di risorse per la realizzazione del "Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici - Secondo Stralcio".

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche - sede coordinata di Bari, con nota prot. 0007493 del 04/07/2012 acquisita al protocollo Comune di Cerignola n.16014 del 06.07.2012, ha trasmesso lo schema di convenzione relativo al Programma straordinario stralcio di interventi sugli edifici scolastici di cui sopra, nell'ambito del quale è compreso l'intervento finalizzato alla messa in sicurezza dell'edificio sede dell'Istituto scolastico "ITIS - Augusto Righi".

In data 29/10/2012, presso il competente Ufficio del Provveditorato, si è proceduto, tra l'altro, alla sottoscrizione della "Convenzione" inerente l'intervento in argomento.

Con nota prot. 26692 del 20/11/2012 questo Comune ha chiesto di potersi avvalere, per la progettazione dell'opera, della collaborazione di personale del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche, ai sensi dell'art. 90 comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006.

Con nota Ministeriale prot. n.7214 del 06/05/2014, acquisita al prot. n. 11363 del 15/05/2014, la Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali-Div. 1^a, ha trasmesso la Convenzione regolante i rapporti fra Stato ed Ente attuatore n.19369 del 21.11.2013, comunicando che l'Ufficio Centrale di Bilancio del Ministero dell'Economia e Finanze, avendo ottenuto la registrazione da parte della Corte dei Conti al reg.1 foglio 715 del 7.02.2014, ha vistato col n.175 del 9.1.2014 il Decreto prot. n. 19707 del 22/11/2013 di approvazione della stessa Convenzione relativa all'intervento n. 00612PUG135 in argomento.

Con il medesimo Decreto è stato altresì assunto l'impegno a favore del Comune di Cerignola dell'importo complessi-

vo di € 643.800,00 finalizzato alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali nell'edificio scolastico "ITIS Augusto Righi" in XXV Aprile - CUP: J36E12000670001.

La spesa progettuale è stata imputata al capitolo 30596 bilancio 2014, correlato al finanziamento statale ed al capitolo di entrata 40267, bilancio 2014, accert. 66.

Non potendo l'Ufficio Tecnico di questo Comune provvedere alla progettazione esecutiva, sicurezza in fase di progettazione, direzione, coordinamento della sicurezza in fase d'esecuzione, alla misura e contabilità dei lavori, data la ormai accertata carenza di personale, e preso atto della dichiarata indisponibilità all'espletamento delle stesse prestazioni da parte di personale del Provveditorato, giusta nota acquisita al prot. n. 21188 del 23.9.2014, con determinazione dirigenziale n. 63/18 del 10.02.2015 è stato incaricato l'arch. Vincenzo Russo (CIG Z57130B217), tecnico esterno alla struttura comunale, in possesso dei requisiti per poter espletare l'incarico in argomento.

In data 25/02/2015 l'arch. Vincenzo Russo ha sottoscritto con questo Ente apposito disciplinare-convenzione di incarico.

Il citato professionista, ad espletamento dell'incarico, ha trasmesso in data 14/04/2015 il progetto di manutenzione straordinaria finalizzato alla messa in sicurezza dell'edificio scolastico ITIS Augusto Righi, di cui al finanziamento Ministeriale, il quale è stato sottoposto, come da "Convenzione", all'esame del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche -sede coordinata di Bari.

Con nota n.4803 del 18.05.2015 lo stesso Provveditorato, pur accertando che il progetto compatibilmente con il finanziamento disponibile considerava gli interventi più urgenti, riportati nel giudizio sintetico di cui alla scheda tecnica di rilevamento del 18.09.2009, ha richiesto integrazioni al progetto e l'acquisizione del preventivo parere della Soprintendenza, ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 42/2004, data la valenza storica artistica dell'immobile di età superiore a 50 anni.

Il progetto rielaborato dall'arch. Vincenzo Russo in relazione alle integrazioni richieste dal Provveditorato, è stato inviato alla Soprintendenza territorialmente competente per l'acquisizione dell'autorizzazione ai sensi della citata legge.

La Soprintendenza alle Belle Arti e Paesaggio per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, con sede in Bari, con nota 7254 del 17.11.2015, acquisita al prot. n. 31425 del 25/11/2015, ha autorizzato l'esecuzione delle opere.

Con delibera n. 370 del 30/12/2015 la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo, adeguato nei termini di cui alle prescrizioni del Provveditorato ed al parere della competente Soprintendenza, sottoponendolo al definitivo parere da parte del competente Provveditorato, in osservanza dell'art.3, comma 1, della citata "Convenzione".

Con pec del 16/03/2016 è stato acquisito il parere favorevole rilasciato dal C.T.A. del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise la Puglia e la Basilicata - sede coordinata di Bari. In relazione al suddetto parere e ad alcune precisazioni esposte dal CTA è stato rimodulato il quadro economico di spesa.

Con determina della CUC del Tavoliere n. 108 del 07/04/2016, preso atto della determinazione dirigenziale n.259/13 del 06/04/2016 con la quale per l'espletamento della gara di appalto dei lavori è stata individuata la procedura negoziata di cui all'art.57, comma6 del D. Lgs. 163/2006, si è proceduto all'indizione della gara. La lettera di invito prot. n. 24 del 07/04/2016 è stata inviata alle Ditte via pec in pari data.

Con determinazione del Responsabile del procedimento CUC, ing. Clorindo Izzillo prot. n. 13 del 26/04/2016 è stata costituita la Commissione di gara composta dal Dirigente ing. Clorindo Izzillo, Presidente e dai componenti Dott.ssa Maria Valentino e dott.ssa Maria Dettori.

Con determinazione dirigenziale del Settore Lavori Pubblici n.650/86 del 18/08/2016, riscontrata la regolarità della procedura seguita nell'esperimento di gara e preso atto del verbale della Commissione del 26/04/2016, si è proceduto all'aggiudicazione definitiva a favore della ditta Cadinvest srl (codice fiscale e partita IVA: 01934460716), con sede in Cerignola alla Via Sestriere n.2, per il prezzo di € 322.184,29 al netto del ribasso offerto del 22,500% sulla base d'asta di € 415.721,66, oltre a € 68.112,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, e per un totale complessivo di contratto per lavori pari a € 390.296,59, oltre iva come dovuta.

In relazione al risultato di gara, con la citata determinazione n.650/86 del 18/08/2016 è stato rideterminato il quadro economico, secondo le risultanze in essa riportate.

Tra la citata aggiudicataria e l'Amministrazione è stato stipulato il relativo contratto di appalto repertorio n.185 del 12/10/2016, sottoscritto in modalità digitale e registrato a Cerignola in data 12/10/2016 col n.2673 Serie 1T.

I lavori sono stati consegnati in data 18/10/2016, giusto verbale in atti, e regolarmente iniziati in pari data.

Con determinazione dirigenziale n.194/34 del 27/02/2017, fatta salva l'acquisizione dei prescritti pareri da parte della competente Soprintendenza e del Provveditorato Inter-

regionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise la Puglia e la Basilicata - sede coordinata di Bari, è stata approvata una perizia di variante e suppletiva finalizzata alla risoluzione delle emerse nuove contingenze e criticità, dettagliatamente riportate nella stessa determinazione e negli elaborati di perizia, redatti dal direttore dei lavori, arch. Vincenzo Russo, su autorizzazione del RUP.

Per effetto della suddetta perizia di variante e suppletiva, che prevede prevalentemente lavorazioni diverse imprevedute ed imprevedibili in fase progettuale ed in parte lavori di miglioramento delle caratteristiche costruttive e di finitura, l'importo dei lavori è stato rideterminato in € 396.026,15 al netto del ribasso d'asta del 22,50% (applicato sull'importo computato di € 511.001,48), mentre gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso in € 77.613,03 stabilendo, pertanto, in € 473.639,17 il nuovo importo contrattuale, con l'incremento di € 83.342,58 che trova copertura con la parziale utilizzazione delle economie di gara (voce "imprevisti").

Per la redazione della perizia di variante e suppletiva all'arch. Vincenzo Russo sono stati riconosciuti compensi professionali pari ad € 13.500,00 oltre contributo cnpaia ed IVA, con prelievo delle relativa spesa dalla voce imprevisti del quadro economico di progetto.

La spesa progettuale resta confermata in complessivi € 643.800,00, secondo il nuovo quadro economico analitico di perizia di seguito riportato, finanziata con fondi ministeriali ottenuti per la realizzazione dell'opera:

LAVORI	Come da Precisazioni CTA	Post gara d'appalto	Perizia di variante e suppletiva
importo dei lavori al netto del ribasso del 22,50%	415.721,66	322.184,29	396.026,15
Oneri di sicurezza	68.112,30	68.112,30	77.613,02
TOTALE LAVORI	483.833,96	390.296,59	473.639,17
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Iva sui Lavori (22%)	106.443,47	85.865,25	104.200,62
Spese per pubblicità bando di gara	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Imprevisti (comprensivi di IVA)	8.837,57	122.953,16	
Contributo Anac	225,00	225,00	225,00
Progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	31.368,22	31.368,22	44.868,22
collaudo	3.000,00	3.000,00	3.000,00
CNPAIA AL 4%	1.254,73	1.254,73	2.040,83
Iva AL 22% su spese tecniche e cnpaia al 4%	7.837,05	7.837,05	11.673,56
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	159.966,04	253.503,41	170.160,83
TOTALE QUADRO ECONOMICO	643.800,00	643.800,00	643.800,00

CADINVEST Srl
Ciò stante il progettista e direttore dei lavori, arch. Vincenzo Russo, con nota acquisita in data 07.03.2017 al prot. n.6957, ha trasmesso il 2° stato di avanzamento dei lavori, eseguiti a tutto il 04/03/2017 dalla ditta aggiudicataria, "Cadinvest Srl", per il complessivo importo netto di € 324.195,30 comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 60.991,66, nonché il relativo certificato di pagamento n.2, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, ing. Clorindo Izzillo, con il quale, dedotto l'acconto di cui al 1° SAL e le ritenute di legge, è stato accertato e riconosciuto a favore della predetta Ditta appaltatrice il credito di € 167.816,93, oltre Iva nella misura come dovuta del 22% pari ad € 36.919,72 e, quindi, di complessivi € 204.736,65.

Arch. Russo
Unitamente allo stato di avanzamento il professionista ha altresì trasmesso la parcella inerente gli onorari per la direzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità dei lavori in argomento, maturati con la emissione del detto 2° SAL, dell'importo di € 6.673,36, oltre Cassa previdenziale 4% pari ad € 266,93 ed iva al 22% pari ad € 1.526,86 e, quindi, per un importo complessivo di € 8.467,15, come da relativa parcella pro forma emessa dallo stesso professionista.

Considerata la regolarità degli atti, si ritiene di procedere all'approvazione del 2° stato di avanzamento lavori e relativo certificato di pagamento, nonché della parcella professionale, con contestuale riconoscimento dei crediti di seguito liquidabili per complessivi € 213.203,80 a favore:

- X - dell'impresa "Cadinvest Srl di complessivi € 204.736,65, iva al 22% compresa, a titolo di corrispettivo 2° SAL, che trova capienza al finanziamento assunto per la realizzazione dell'opera ed imputazione al capitolo p. 30596, cod. bilancio 4.02-2.02.01.09.003, a valere per € 43.752,18 sull'impegno 1034-2015 RE 2016 sub 4 e per € 160.984,47 sull'impegno 1035-2014 RE 2016 sub 2;
- X - dell'arch. Vincenzo Russo, dell'importo di € 8.467,15 contributo cnpaia 4% ed iva al 22% compresi, che trovano altresì capienza al finanziamento assunto per la realizzazione dell'opera ed imputazione al capitolo p. 30596, cod. bilancio 4.02-2.02.01.09.003, - impegno n. 1035-2014 - sub 1 RE 2014.

Dato atto che all'intervento è stato attribuito il CUP: J36E12000670001; ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex Art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12 novembre 2010, n.187 convertito con modificazioni nella legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", all'attività inerente l'affidamento dei lavori è stato attribuito il CIG: 66494389D1, mentre a quella relativa alla prestazione professionale di progettazione, coordinamento della sicurezza, D.L., misure e contabilità dei lavori il CIG: Z57130B217.»

Visto la normativa inerente i lavori pubblici;

Ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, si dispone la pubblicazione del presente atto, nella sezione del link "Amministrazione trasparente", sotto sezione "bandi di gara e contratti";

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che : "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 21/03/2016, prot. n. 60/Gab., con il quale si affida all'ing. Clorindo Izzillo, la Dirigenza del Settore comprendente i Servizi Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente e Verde Pubblico;

Visto il decreto del Sindaco del 18/09/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquichio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

- 1) la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di approvare il 2° stato di avanzamento dei lavori per la "Messa in sicurezza e la prevenzione del rischio connesso

alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, nell'Istituto scolastico A. Righi" CUP: J36E12000670001 CIG: 66494389D1, emesso dal Direttore, arch. Vincenzo Russo, importo netto di € 324.195,30 comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 60.991,66, nonché il relativo certificato di pagamento n.2, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, ing. Clorindo Izzillo, con il quale, dedotto l'acconto di cui al 1° SAL e le ritenute di legge, è stato accertato e riconosciuto a favore della predetta Ditta appaltatrice il credito di € 167.816,93, oltre iva nella misura come dovuta del 22% pari ad € 36.919,72 e, quindi, di complessivi € 204.736,65;

3) di approvare la parcella esibita dall'arch. Vincenzo Russo relativa alla prestazione di direzione, contabilità, misura e coordinamento della sicurezza dei lavori in argomento, maturati in relazione all'emissione del 2° SAL, dell'importo di € 6.673,36, oltre Cassa previdenziale 4% pari ad € 266,93 ed iva al 22% pari ad € 1.526,86 e, quindi, di complessivi di € 8.467,15, come da relativa fattura pro forma emessa dallo stesso professionista;

4) di liquidare e pagare gli accertati crediti a favore degli aventi causa di cui in seguito, su disposizione del RUP, che terrà conto delle disponibilità di cui all'erogazione già effettuata in conto finanziamento nonché dell'ulteriore erogazione da effettuarsi da parte del Ministero dell'Interno, finanziatore dell'opera:

- ➔ - impresa Cadinvest SRL di € 204.736,65, iva al 22% compresa, a titolo di corrispettivo 2° SAL - CIG: 66494389D1, come da relativa fattura pro forma emessa dalla stessa Impresa;
- ➔ - professionista Arch. Vincenzo Russo di € 8.467,15, contributo cnpaia 4% ed iva al 22% compresi, a titolo di competenze per la per direzione, coordinamento sicurezza, misura e contabilità dei lavori maturati al 2° SAL - CIG Z57130B217, giusta fattura proforma emessa dal professionista;

5) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2017, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

6) di dare atto che la spesa di complessivi € 213.203,80 trova imputazione all'intervento 4.02-2.02.01.09.003, cap. 30596, a valere quanto ad € 8.467,15 sull'impegno n.1035-2014 sub 1 RE 2014 e ad € 204.736,65 sugli impegni 1034-2015 RE 2016 sub 4 per € 43.752,18 e 1035-2014 RE 2014, sub 2 per € 160.984,47;

7) di liquidare la detta spesa di € 213.203,80, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato

n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, al suddetto capitolo ed impegni, imputandola al bilancio 2017;

8) di dare opportuna comunicazione del presente atto alla competente Struttura del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise la Puglia e la Basilicata - sede coordinata di Bari, nei termini di cui alla citata "Convenzione", ai fini della rendicontazione delle spese;

9) di dare atto che la redazione del presente atto è stata assegnata alla Sig.ra Battaglino Anna, in servizio presso l'Ufficio Lavori Pubblici.

**CITTÀ DI CERIGNOLA**

(Provincia di Foggia)

Piazza della Repubblica N. 1

71042 – Cerignola

Partita Iva e C.F. 00362170714

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA**

Atto N. 316/61

In data 22-03-17

OGGETTO: Delibera CIPE n.6/2012 - Programma straordinario stralcio interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, prevenzione e riduzione rischio connesso alla vulnerabilità elementi anche non strutturali - Istituto ex ITIS Augusto Righi - 2° SAL e relativa parcella professionale - Liquidazioni.

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 213.203,80 (CIG. 66494389D1) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione
43.752,18	04.02-2.02.01.09.003	30596/	2016	314	31-12-2015
160.984,47	04.02-2.02.01.09.003	30596/	2016	315	31-12-2014
8.467,15	04.02-2.02.01.09.003	30596/	2014	316	31-12-2014

*Cerignola, lì 22-03-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA****F.to Buquicchio Dott. Giovanni**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Izzillo Ing. Clorindo

Copia conforme all'originale, **22-03-2017**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **23-03-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **8866** del **22-03-17** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **22-03-17**.

Dal Palazzo di Città, **22-03-2017**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **23-03-17** al **06-04-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **07-04-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201700000535923

Identificativo Pagamento: DET 316/61 2017

Importo: 57320,00 €

Codice Fiscale: 01934460716

Data Inserimento: 13/04/2017 - 15:55

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA
