



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
Provincia di Brindisi

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Legge 5.8.78 n.457 - IV Biennio.
Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento agli alloggi di E.R.P.
nel Comune di Brindisi - Lotto A/1 - Palazziane A-B-C- Largo del Bon e
Piazza Casorati.

COMMITTENTE: PERIZIA DI COMPLETAMENTO.
I.A.C.P. Brindisi

Brindisi, 25/09/2003

IL TECNICO

ELABORATO DI CONTABILITÀ N. 1

L'ASSISTENTE DI CANTIERE
E CONTABILIZZATORE
(Geom. Massimo SPAGNOLO)

Soc. CIRILLO s.r.l.
Via Cirillo, 4
72100 BRINDISI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO					
	Intervento sui prospetti Pal. B Largo Dei Bon civ. 3-4 (Cat 7)					
25/4 317	Montaggio e smontaggio di impalcatura esterna con tubolar ... ani inferiori e il successivo smontaggio e accatastamento. Prospetti *(lung.=60.12+11.50)	2.00	71.62		21.50	3 079.66
	SOMMANO mq.					3 079.66
26/8 N.P.14	Revisione delle superficie interessate al rivestimento te ... , escluso solo l' onere delle impalcature per le facciate. <u>Intradosso sbalzi box piano terra</u>					
	figura n.1		58.90	1.30		76.57
	figura n.2		4.11	0.35		1.44
	figura n.3		3.10	0.10		0.31
	figura n.4		1.00	0.15		0.15
	figura n.5		3.90	0.35		1.37
	figura n. 6		4.36	0.10		0.44
	figura n. 7		3.27	0.10		0.33
	figura n.8		5.80	0.95		5.51
	figura n.9		1.87	0.52		0.97
	figura n.10		5.80	0.95		5.51
	figura n.11		3.23	2.65		8.56
	figura n.12		2.68	2.19		5.87
	figura n.13		3.30	2.84		9.37
	figura n.14		1.92	1.08		2.07
	figura n.15		5.80	0.95		5.51
	figura n.16		1.87	0.52		0.97
	figura n.17		5.80	0.95		5.51
	figura n.18		3.27	2.41		7.88
	figura n.19		2.00	0.52		1.04
	figura n. 20		2.12	2.48		5.26
	figura n. 21		3.22	1.56		5.02
	figura n. 22		6.80	2.30		15.64
	figura n. 23		3.90	0.35		1.37
	figura n.24		4.40	0.04		0.18
	figura n.25		1.00	0.15		0.15
	figura n.26		4.11	0.35		1.44
	figura n.27		3.07	0.04		0.12
	prospetto SUD					
	"1"		3.90		16.63	64.86
	"2"		0.20		16.63	3.33
	"3"		1.00		16.63	16.63
	a detrarre:					
	finestrini	5.00	0.60		0.60	-1.80
	squarci finestrini *(par.ug.=3*5)	15.00	0.60	0.21		1.89
	"4"		0.20		16.63	3.33
	"5"		5.41		16.63	89.97
	prospetto EST		58.90		16.63	979.51 ✓
	a detrarre:					
	finestre	40.00	1.19		1.40	-66.64
	squarci finestre *(par.ug.=2*40)	80.00	0.21		1.40	23.52 ✓
		40.00	1.19	0.21		10.00 ✓
	a detrarre:					
	vuoti balconi	20.00	6.78		2.00	-271.20
	pareti interne balconi *(par.ug.=3*2)	6.00	1.18		3.04	21.52 ✓
		3.00	6.78		3.04	61.83 ✓
	a detrarre:					
	porte *(par.ug.=2*3)	6.00	1.08		2.40	-15.55
	A RIPORTARE					1 089.76
						154 623.24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1 089.76		154 623.24
	(par.ug.=2*3) risvolti marcapiano sul prospetto * (lung.=0.33+10.00+0.33+10.00)	6.00	0.70		2.40	-10.08		
	prospetto NORD	20.00	20.66		0.05	20.66	453,57 (267,79)	
	"1"		3.90		16.63	64.86		
	"2"		0.20		16.63	3.33		
	"3"		1.00		16.63	16.63		
	a detrarre:							
	finestrini	5.00	0.60		0.60	-1.80		
	squarci finestrini *(par.ug.=3*5)	15.00	0.60	0.21		1.89		
	"4"		0.20		16.63	3.33		
	"5"		5.41		16.63	89.97	178,21	
	prospetto OVEST							
	(coibentazione pareti: la stessa è stata realizzata per la superficie con esclusione dei vani scala e balconate tutte chiuse escluso n. 2 al piano primo lato SUD): misurazione effettuata a partire la to ospedale nuovo:		7.18		16.63	119.40		
	a detrarre:							
	finestre	10.00	1.19		1.40	-16.66		
	squarci finestre *(par.ug.=4*2)	8.00	1.40	0.15		1.68		
		4.00	1.19	0.15		0.71		
	(par.ug.=6*2)	12.00	1.40	0.05		0.84		
		6.00	1.19	0.05		0.36		
			14.36		16.63	238.81		
	a detrarre:							
	finestre	20.00	1.19		1.40	-33.32		
	squarci finestre *(par.ug.=6*2)	12.00	1.40	0.15		2.52		
		6.00	1.19	0.15		1.07		
	(par.ug.=10*2)	20.00	1.40	0.05		1.40		
		10.00	1.19	0.05		0.60		
	(par.ug.=2*2)	4.00	1.40	0.12		0.67		
		2.00	1.19	0.12		0.29		
			7.18		16.63	119.40		
	a detrarre:							
	finestre	10.00	1.19		1.40	-16.66		
	squarci finestre *(par.ug.=10*2)	20.00	1.40	0.05		1.40		
		10.00	1.19	0.05		0.60		
	balconi aperti	20.00	1.87		2.93	109.58		
		20.00	3.22		2.93	188.69		
		20.00	0.24		2.93	14.06		
		20.00	0.40		2.93	23.44		
	a detrarre:							
	porta	21.00	1.07		2.30	-51.68		
	Sommano positivi mq.					2 471.14		
	Sommano negativi mq.					-485.39		
	SOMMANO mq.					1 985.75	22.36	44 401.37
27-9 107	Intonaco comune liscio per pareti esterne costituito da u ... uso di bilance, nonchè il ricaccio di cornici e riquadri.							
	Parapetti attico prospetto OVEST interno		28.30		1.15	32.55		
	parapetti attico prospetto OVEST esterno		28.30		1.15	32.55		
	parapetti attico perimetro esterno a partire lato NORD *(lung.=11.16+10.26+60.12+ 10.25+13.16)		104.95		1.15	120.69		
	parapetti attico perimetro interno * (lung.=10.96+9.86+59.72+9.85+12.96)		103.35		1.15	118.85		
	copertura sbalzi box sulla copertura a partire							
	A RIPORTARE					304.64		199 024.61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					304.64		199 024.61
	prospetto NORD lato SUD pareti		1.87		0.50	0.94		
			0.30		0.50	0.15		
			0.97		0.50	0.49		
	(H/peso=0.40+0.50)		8.03		0.90	7.23		
			0.40		0.50	0.20		
	(H/peso=0.40+0.50)		5.42		0.90	4.88		
			0.40		0.50	0.20		
	(H/peso=0.40+0.50)		6.13		0.90	5.52		
			0.40		0.50	0.20		
	(H/peso=0.40+0.50)		2.46		0.90	2.21		
			1.57		0.58	0.91		
			1.00		0.50	0.50		
			3.80		0.50	1.90		
	a detrarre:		0.60		0.50	-0.30		
			1.62		0.50	0.81		
			3.42		0.50	1.71		
			0.40		0.50	0.20		
	(H/peso=0.40+0.71)		1.11		1.11	1.23		
	(H/peso=0.40+0.50)		29.96		0.90	26.96		
			0.40		0.50	0.20		
	(H/peso=0.40+0.50)		2.15		0.90	1.94		
			1.60		0.50	0.80		
			1.20		0.50	0.60		
			3.86		0.50	1.93		
	a detrarre:		0.60		0.50	-0.30		
			1.60		0.50	0.80		
			3.35		0.50	1.68		
			0.40		0.50	0.20		
			1.10		0.40	0.44		
			0.70		0.50	0.35		
	(H/peso=0.40+0.50)		5.46		0.90	4.91		
			0.40		0.50	0.20		
	(H/peso=0.40+0.50)		5.43		0.90	4.89		
			0.40		0.50	0.20		
	(H/peso=0.40+0.50)		5.63		0.90	5.07		
			1.87		0.50	-0.94		
			0.30		0.50	0.15		
			0.97		0.50	0.49		
	(H/peso=0.40+0.50)		28.30		0.90	25.47		
		2.00	1.87		0.50	1.87		
		2.00	0.30		0.50	0.30		
		2.00	0.97		0.50	0.97		
	cornicione copertura fascia perimetrale perimetro *(lung.=11.78+11.78+60.12+ 11.77+13.76)		109.21		0.60	65.53		
			28.30		0.60	16.98		
	intradosso cornicione		60.12		0.55	33.07		
			10.25		0.60	6.15		
			13.76		0.97	13.35		
			28.30		0.97	27.45		
			11.78		0.97	11.43		
			10.26		0.62	6.36		
	prospetto posteriore parapetti esterni balconi *(lung.=0.95+5.80)	20.00	6.75		1.30	175.50		
	Sommano positivi mq.					771.10		
	Sommano negativi mq.					-0.60		
	SOMMANO mq.					770.50	6.46	4 977.43
	A RIPORTARE							204 002.04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							204 002,04
28 / 13 N.P.15	Accurata e completa rimozione di rete in fibra di vetro e ... iuto alle pubbliche scariche del materiale di risulta.							
	Parapetti attico prospetto OVEST interno		28.30		1.15	32.55		
	parapetti attico prospetto OVEST esterno		28.30		1.15	32.55		
	parapetti attico perimetro esterno a partire							
	lato NORD *(lung.=11.16+10.26+60.12+10.25+13.16)		104.95		1.15	120.69		
	parapetti attico perimetro interno *							
	(lung.=10.96+9.86+59.72+9.85+12.96)		103.35		1.15	118.85		
	copertura sbalzi box sulla copertura a partire							
	prospetto NORD lato SUD							
	pareti		1.87		0.50	0.94		
			0.30		0.50	0.15		
			0.97		0.50	0.49		
	(H/peso=0.40+0.50)		8.03		0.90	7.23		
			0.40		0.50	0.20		
	(H/peso=0.40+0.50)		5.42		0.90	4.88		
			0.40		0.50	0.20		
	(H/peso=0.40+0.50)		6.13		0.90	5.52		
			0.40		0.50	0.20		
	(H/peso=0.40+0.50)		2.46		0.90	2.21		
			1.57		0.58	0.91		
			1.00		0.50	0.50		
			3.80		0.50	1.90		
	a detrarre:		0.60		0.50	-0.30		
			1.62		0.50	0.81		
			3.42		0.50	1.71		
			0.40		0.50	0.20		
	(H/peso=0.40+0.71)		1.11		1.11	1.23		
	(H/peso=0.40+0.50)		29.96		0.90	26.96		
			0.40		0.50	0.20		
	(H/peso=0.40+0.50)		2.15		0.90	1.94		
			1.60		0.50	0.80		
			1.20		0.50	0.60		
			3.86		0.50	1.93		
	a detrarre:		0.60		0.50	-0.30		
			1.60		0.50	0.80		
			3.35		0.50	1.68		
			0.40		0.50	0.20		
			1.10		0.40	0.44		
			0.70		0.50	0.35		
	(H/peso=0.40+0.50)		5.46		0.90	4.91		
			0.40		0.50	0.20		
	(H/peso=0.40+0.50)		5.43		0.90	4.89		
			0.40		0.50	0.20		
	(H/peso=0.40+0.50)		5.63		0.90	5.07		
			1.87		0.50	0.94		
			0.30		0.50	0.15		
			0.97		0.50	0.49		
	(H/peso=0.40+0.50)		28.30		0.90	25.47		
		2.00	1.87		0.50	1.87		
		2.00	0.30		0.50	0.30		
		2.00	0.97		0.50	0.97		
	cornicione copertura							
	fascia perimetrale							
	perimetro *(lung.=11.78+11.78+60.12+11.77+13.76)		109.21		0.60	65.53		
			28.30		0.60	16.98		
	intradosso cornicione		60.12		0.55	33.07		
			10.25		0.60	6.15		
			13.76		0.97	13.35		
			28.30		0.97	27.45		
	A RIPORE					577.21		204 002,04


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					577.21		204 002.04
			11.78		0.97	11.43		
			10.26		0.62	6.36		
	prospetto posteriore parapetti esterni balconi *(lung.=0.95+5.80)	20.00	6.75		1.30	175.50		
	Sommano positivi mq.					771.10		
	Sommano negativi mq.					-0.60		
	SOMMANO mq.					770.50	1.55	1 194.28
29 / 15 N.P.16	Fornitura e posa in opera di rete in fibra di vetro con a ... Ps, miscelato con cemento Portland 325 R in rapporto 2:1.							
	Parapetti attico prospetto OVEST interno		28.30		1.15	32.55		
	parapetti attico prospetto OVEST esterno		28.30		1.15	32.55		
	parapetti attico perimetro esterno a partire lato NORD *(lung.=11.16+10.26+60.12+ 10.25+13.16)		104.95		1.15	120.69		
	parapetti attico perimetro interno * (lung.=10.96+9.86+59.72+9.85+12.96)		103.35		1.15	118.85		
	copertura sbalzi box sulla copertura a partire prospetto NORD lato SUD							
	pareti		1.87		0.50	0.94		
			0.30		0.50	0.15		
			0.97		0.50	0.49		
	(H/peso=0.40+0.50)		8.03		0.90	7.23		
	(H/peso=0.40+0.50)		0.40		0.50	0.20		
	(H/peso=0.40+0.50)		5.42		0.90	4.88		
	(H/peso=0.40+0.50)		0.40		0.50	0.20		
	(H/peso=0.40+0.50)		6.13		0.90	5.52		
	(H/peso=0.40+0.50)		0.40		0.50	0.20		
	(H/peso=0.40+0.50)		2.46		0.90	2.21		
			1.57		0.58	0.91		
			1.00		0.50	0.50		
			3.80		0.50	1.90		
	a detrarre:		0.60		0.50	-0.30		
			1.62		0.50	0.81		
			3.42		0.50	1.71		
			0.40		0.50	0.20		
	(H/peso=0.40+0.71)		1.11		1.11	1.23		
	(H/peso=0.40+0.50)		29.96		0.90	26.96		
			0.40		0.50	0.20		
	(H/peso=0.40+0.50)		2.15		0.90	1.94		
			1.60		0.50	0.80		
			1.20		0.50	0.60		
			3.86		0.50	1.93		
	a detrarre:		0.60		0.50	-0.30		
			1.60		0.50	0.80		
			3.35		0.50	1.68		
			0.40		0.50	0.20		
			1.10		0.40	0.44		
			0.70		0.50	0.35		
	(H/peso=0.40+0.50)		5.46		0.90	4.91		
	(H/peso=0.40+0.50)		0.40		0.50	0.20		
	(H/peso=0.40+0.50)		5.43		0.90	4.89		
	(H/peso=0.40+0.50)		0.40		0.50	0.20		
	(H/peso=0.40+0.50)		5.63		0.90	5.07		
			1.87		0.50	0.94		
			0.30		0.50	0.15		
			0.97		0.50	0.49		
	(H/peso=0.40+0.50)		28.30		0.90	25.47		
		2.00	1.87		0.50	1.87		
	A RIPORTARE					413.41		205 196.32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					413.41		205 196.32
		2.00	0.30		0.50	0.30		
		2.00	0.97		0.50	0.97		
	cornicione copertura							
	fascia perimetrale							
	perimetro *(lung.=11.78+11.78+60.12+11.77+13.76)		109.21		0.60	65.53		
			28.30		0.60	16.98		
	intradosso cornicione		60.12		0.55	33.07		
			10.25		0.60	6.15		
			13.76		0.97	13.35		
			28.30		0.97	27.45		
			11.78		0.97	11.43		
			10.26		0.62	6.36		
	prospetto posteriore parapetti esterni balconi *(lung.=0.95+5.80)	20.00	6.75		1.30	175.50		
	Sommano positivi mq.					771.10		
	Sommano negativi mq.					-0.60		
	SOMMANO mq.					770.50	1.55	1 194.28
30 / 19 20/a	Stonacatura totale di pareti, per qualsiasi tipo e spesso ... e ogni altro onere misurata nella superficie effettiva.							
	Intradosso sbalzi box copertura (misurazione effettuata a partire lato NORD)							
	intradosso *(lung.=6.03+5.43+5.46+1.10)		18.02	0.40		7.21		
	frontale *(lung.=6.03+6.23+5.72+0.70+0.40)		19.08		0.20	3.82		
	intradosso *(lung.=1.60+2.85+2.56+1.11)		8.12	0.40		3.25		
	frontale *(lung.=1.40+2.85+21.96+0.71+0.40)		27.32		0.20	5.46		
	intradosso *(lung.=1.57+2.86+6.13+5.42+8.03)		24.01	0.40		9.60		
	frontale *(lung.=1.17+2.86+6.53+6.22+8.43)		25.21		0.20	5.04		
	intradosso		28.30	0.40		11.32		
	frontale		28.30		0.20	5.66		
	cornicione perimetrale copertura							
	intradosso		60.12	0.55		33.07		
			10.25	0.60		6.15		
			13.76	0.97		13.35		
			28.30	0.97		27.45		
			11.78	0.97		11.43		
			10.26	0.62		6.36		
	frontino *(lung.=11.78+11.78+60.12+11.77+13.76)		109.21		0.60	65.53		
			28.30		0.60	16.98		
	SOMMANO mq.					231.68	2.22	514.33
31 / 21 307b	Ripristino di strutture in c.a. ammalorate (travi, pilast ... tta regola d'arte. b) per superfici inferiori ai mq. 1,00.							
	Cornicione copertura							
	fascia perimetrale *(lung.=11.78+11.78+60.12+11.77+13.76)*(H/peso=0.60+0.30)		109.21		0.90	98.29		
	SOMMANO mq.					98.29	19.37	1 903.88
	A RIPIORTARE							208 808.81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							208 808.81
32 / 24 102	Chiusura del giunto di dilatazione mediante la fornitura ... iali per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Prospetto principale *(lung.=16.63+0.55+ 0.60+0.10+1.30) box copertura *(lung.=2.06+0.40+0.50) retro prospetto *(lung.=16.63+0.97+0.60+ 0.10) box copertura *(lung.=2.06+0.40+0.50)		19.18 2.96 18.30 2.96			19.18 2.96 18.30 2.96		
	SOMMARIO ml.					43.40	10.23	443.98
33 / 28 275	Tinteggiatura con pitture lavabili di resina sintetica em ... gni onere e magistero ed i ponteggi per qualsiasi altezza. Copertura box vani scala pareti a partire prospetto NORD lato SUD		0.40 1.87 0.30 0.97 7.63 (H/peso=0.40+0.50) 8.03 0.40 5.42 (H/peso=0.40+0.50) 5.42 0.40 (H/peso=0.40+0.50) 6.13 0.40 (H/peso=0.40+0.50) 2.46 1.57 1.57 1.00 3.80 a detrarre 1.62 3.42 1.11 0.40 (H/peso=0.40+0.71) 1.11 (H/peso=0.40+0.50) 21.96 0.40 2.85 (H/peso=0.40+0.50) 2.15 1.60 1.60 1.20 a detrarre 3.86 0.60 1.60 3.35 0.40 1.10 1.10 0.70 (H/peso=0.40+0.50) 5.46 0.40 (H/peso=0.40+0.50) 5.43		2.06 2.56 1.25 2.56 2.06 0.90 0.50 2.06 0.90 0.50 2.06 0.90 0.50 2.06 0.58 0.50 3.00 0.50 2.56 1.56 2.06 0.50 1.11 2.06 0.50 2.06 0.90 0.50 2.06 0.90 2.06 0.60 0.50 2.56 2.56 0.50 2.06 0.40 0.50 2.06 0.90 0.50 2.06 0.90 0.50 2.06	0.82 4.79 0.38 2.48 15.72 7.23 0.20 11.17 4.88 0.20 11.80 5.52 0.20 5.89 2.21 3.23 0.91 0.50 11.40 -0.30 4.15 5.34 2.29 0.20 1.23 45.24 19.76 0.20 5.87 1.94 3.30 0.96 0.60 11.58 -0.30 4.10 8.58 0.20 2.27 0.44 0.35 11.25 4.91 0.20 11.19 4.89		
	A RIPORTARE					239.97		209 252.79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					239.97		209 252.79
			0.40		0.50	0.20		
			5.63		2.06	11.60		
	(H/peso=0.40+0.50)		5.63		0.90	5.07		
			0.40		2.06	0.82		
			1.87		2.56	4.79		
			0.30		1.26	0.38		
			0.97		2.56	2.48		
	prospetto interno		28.30		2.06	58.30		
	(H/peso=0.40+0.50)		28.30		0.90	25.47		
		2.00	0.40		2.06	1.65		
		2.00	1.87		2.56	9.57		
		2.00	0.30		1.26	0.76		
		2.00	0.97		2.56	4.97		
	a detrarre:							
	porte ingresso terrazza	4.00	1.00		2.10	8.40		
	finestrini	19.00	0.79		0.48	-7.20		
	squarci finestrini *(par.ug.=2*19)	38.00	0.79		0.12	3.60		
	(par.ug.=2*19)	38.00	0.48		0.12	2.19		
	<u>muretti parapetto</u>							
	prospetto OVEST esterno		28.30		1.15	32.55		
	mappetta *(lung.=0.05+0.10+0.30+0.10+0.05)		0.60		28.30	16.98		
	perimetro esterno a partire lato NORD *							
	(lung.=11.16+10.26+60.12+10.25+13.1)		104.89		1.15	120.62		
	perimetro interno *(lung.=10.96+9.86+59.72+9.85+12.96)		103.35		1.15	118.85		
	mappetta *(lung.=(104.95+103.35)/2)*(H/peso=0.05+0.10+0.30+0.10+0.05)		104.15		0.60	62.49		
	fascia perimetrale cornicione							
	perimetro *(lung.=11.78+11.78+60.12+11.77+13.76)		109.21		0.60	65.53		
			28.30		0.60	16.98		
	<u>intradosso cornicione</u>		60.12	0.55		33.07		
			10.25	0.60		6.15		
			13.76	0.97		13.35		
			28.30	0.97		27.45		
			11.78	0.97		11.43		
			10.26	0.62		6.36		
	<u>parapetti interni balconi aperti</u>	3.00	6.78		1.02	20.75		
	<u>intradosso balconi aperti</u>	3.00	6.78		1.18	24.00		
	parapetti interni balconi aperti							
	→ prospetto posteriore *(lung.=5.63+0.74)	20.00	6.37		1.02	129.95		
	intradosso balconi	20.00	5.80		1.14	132.24		
	a detrarre							
	pilastrini	20.00	0.30		0.30	-1.80		
	Sommano positivi mq.					1 219.57		
	Sommano negativi mq.					-9.60		
	SOMMANO mq.					1 209.97	4.39	5 311.77
34 / 31 125	Rivestimento esterno impermeabilizzante eseguito su murat ... urato nella superficie effettiva con esclusione dei vuoti.							
	Prospetto posteriore parapetti esterni balconi *(lung.=0.95+5.80)	20.00	6.75		1.30	175.50		
	prospetto posteriore vano scala		3.13		22.49	70.39		
	interno balconi piazza Casorati				216.00	216.00		
	SOMMANO mq.					461.89	6.46	2 983.81
	A RIPORTARE							217 548.37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							217 548.37
35 / 34 168	Fornitura e posa in opera di terminali di ghisa o in acci ... interno di cm. 10 con estremità inferiore diritta o curva: Prospetto principale prospetto posteriore					4.00 4.00		
	SOMMANO cad.					8.00	9.71	77.68
36 / 37 190	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad ... ezzi speciali, nonché l'onere delle eventuali impalcature. Nuovi pluviali prospetto principale *(lung.=0.50+16.63+ 1.30+6.80) prospetto posteriore *(lung.=0.50+16.63+ 0.80) box copertura *(lung.=0.50+2.06)	2.00 2.00 2.00	25.23 17.93 2.56			50.46 35.86 5.12		
	SOMMANO ml.					91.44	12.91	1 180.49
37 / 39 N.P.13	Fornitura e posa in opera di profilato in acciaio inox su ... tero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Incidenza sostituzione = 25% cornicione superiore *(lung.=11.78+11.78+ 60.12+11.77+13.76+28.30) balconi prospetto anteriore *(par.ug.=0.25*3) balconi prospetto posteriore *(par.ug.=0.25* 18)*(lung.=0.95+5.80) piano terra *(lung.=0.35+3.90+0.20+1.00+ 0.20+4.11+1.30+58.90+1.30+4.11+0.20+ 1.00+0.20+3.90+0.35) (par.ug.=0.25*4)*(lung.=0.68+5.80)	0.25 0.75 4.50 0.25 1.00	137.51 6.78 6.75 81.02 6.48			34.38 5.09 30.38 20.26 6.48		
	SOMMANO ml.					96.59	7.75	748.57
	A RIPORTARE							219 555.11

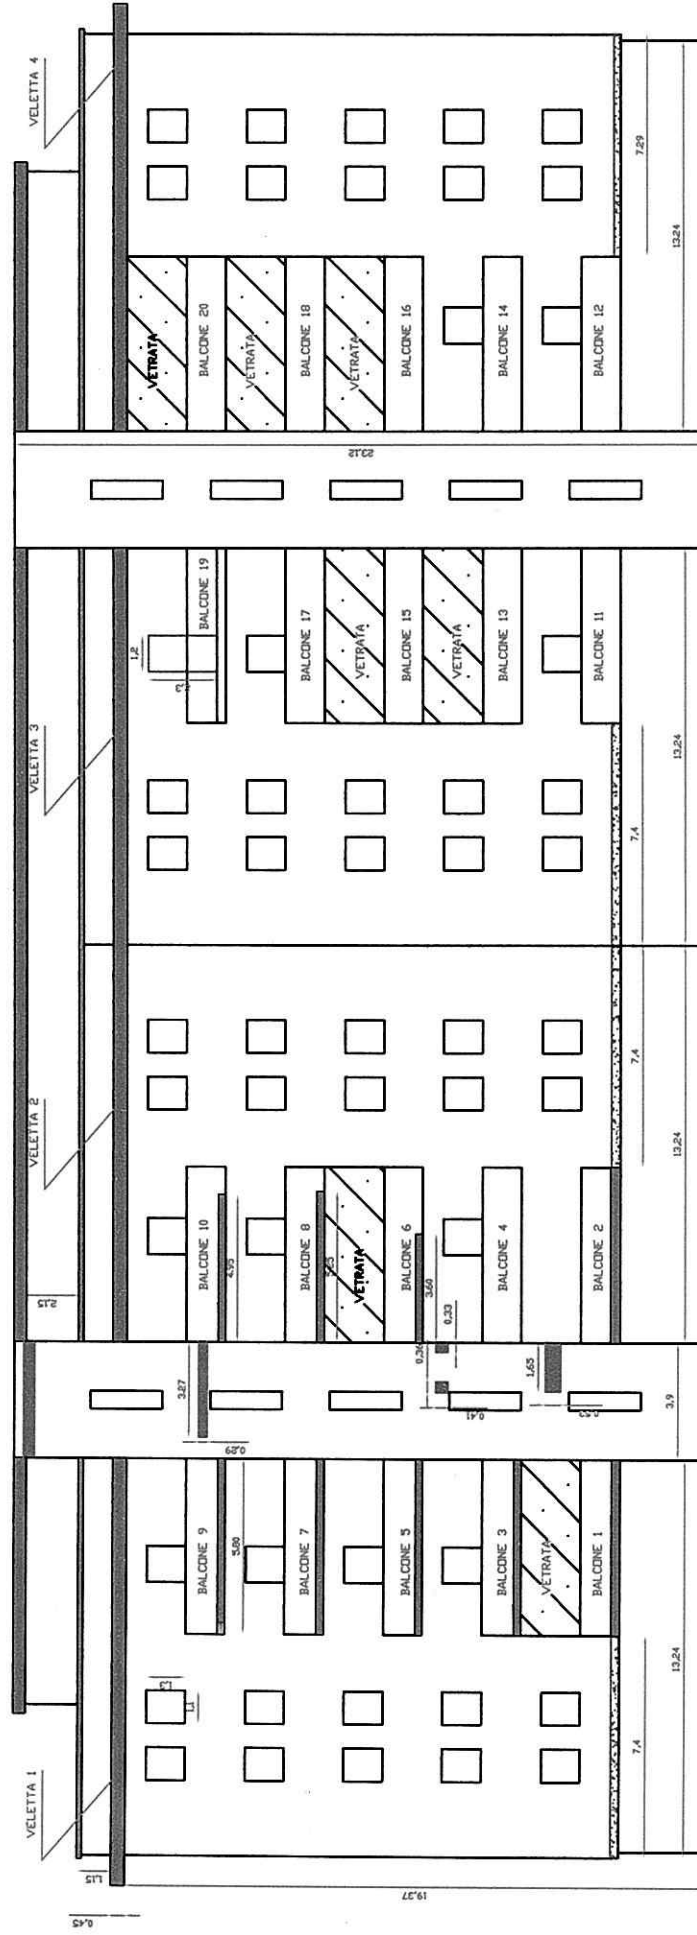


PALAZZINA A

PALAZZINA B

RETROPROSPETTO


1) #4A BORTO B. CONTABILITA'


TESTATA A
VIA ATTANASIO

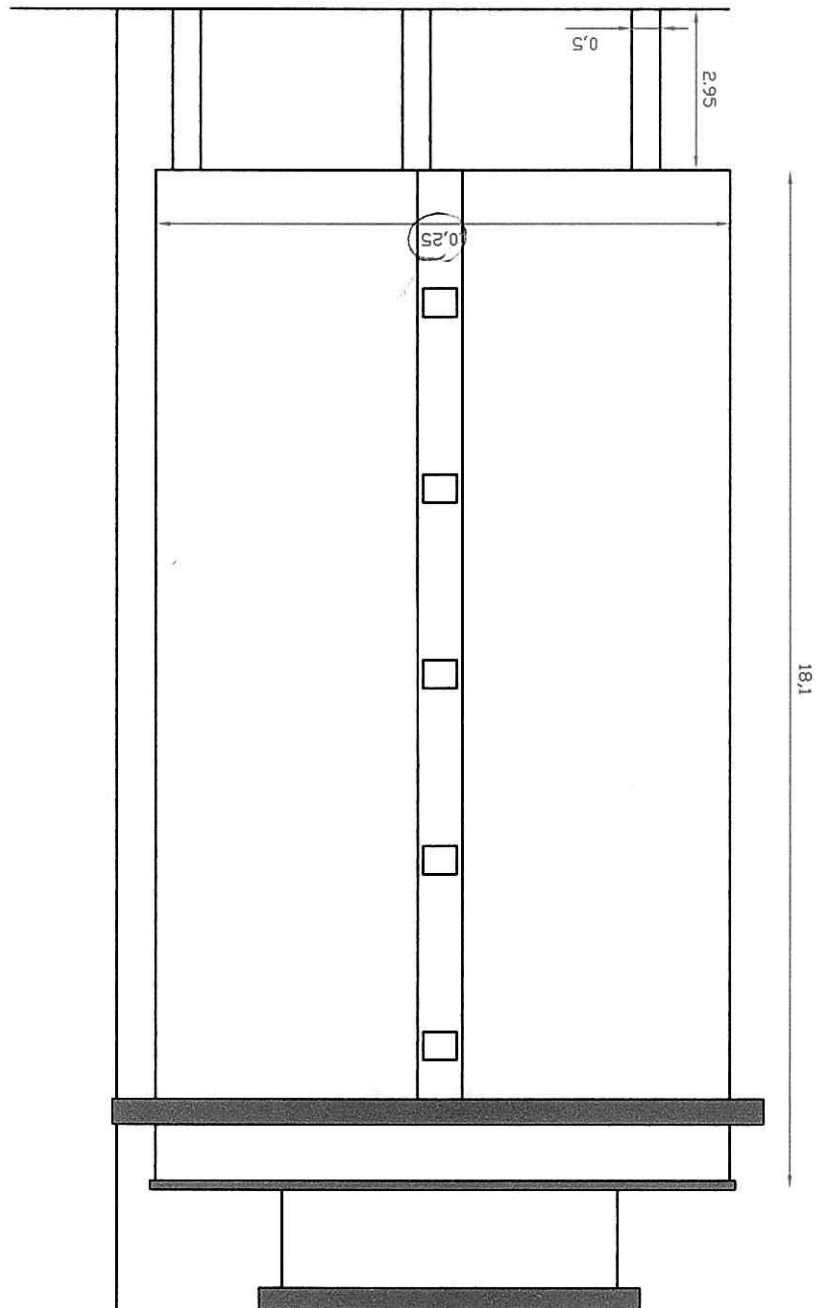

4.2

TESTATA B

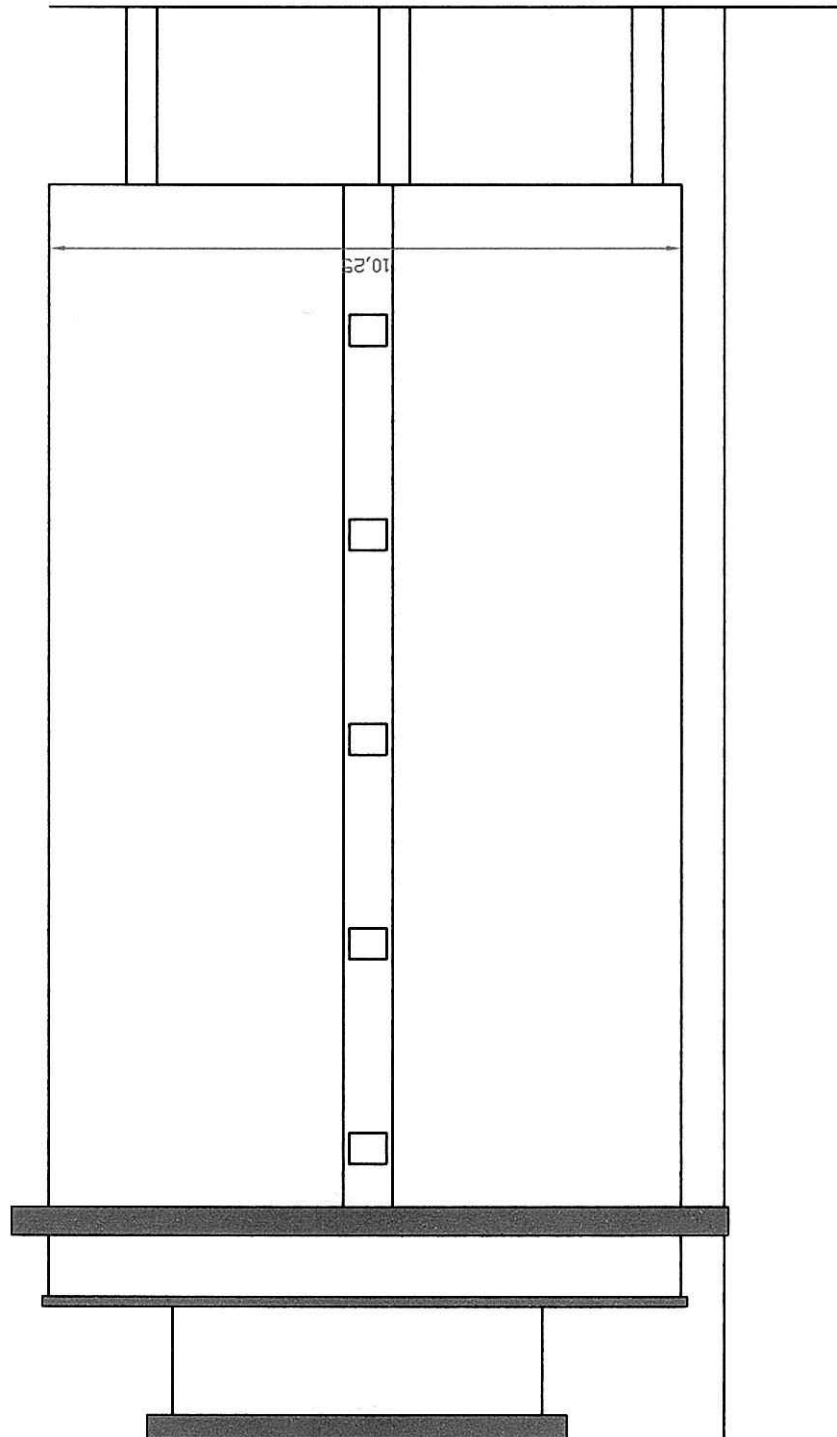


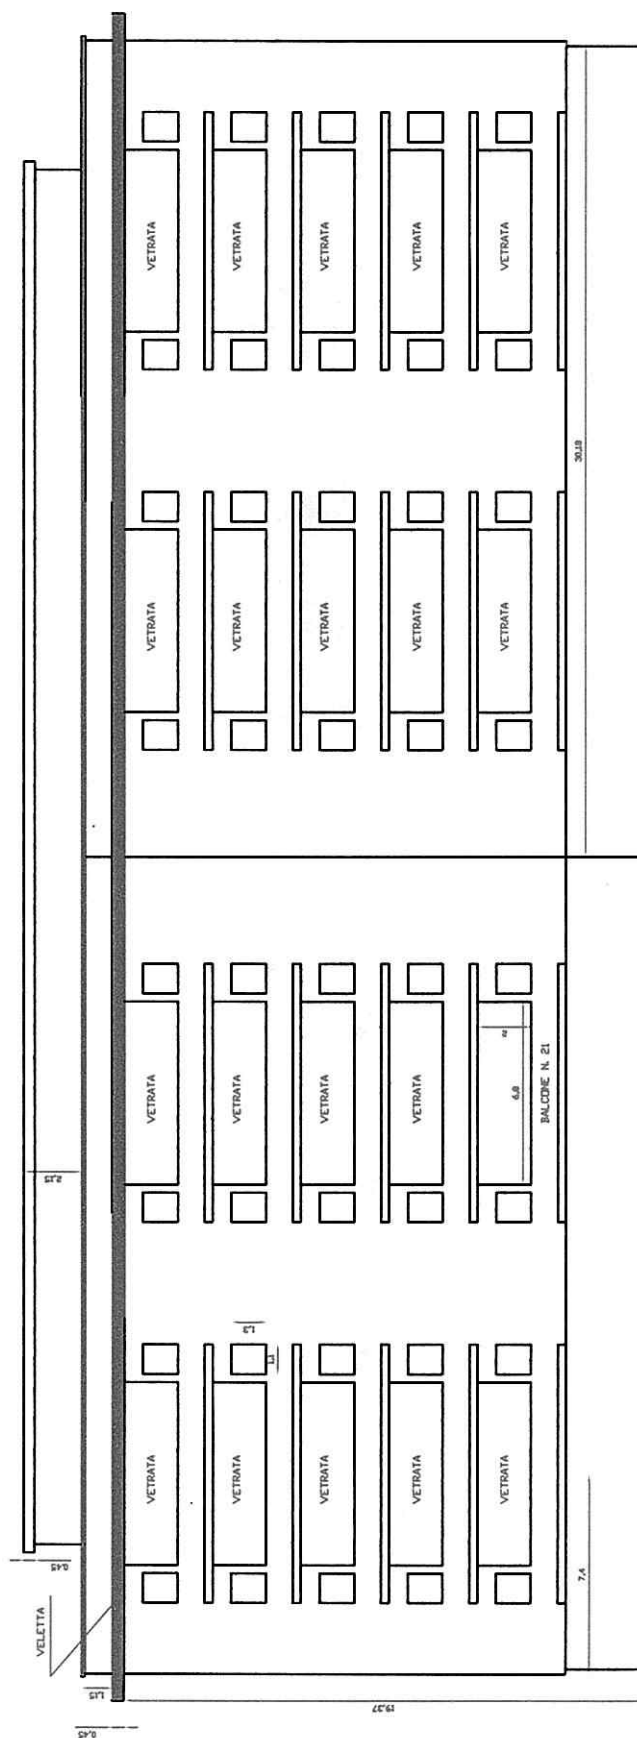

PALAZZINA B


PALAZZINA A

PROSPETTO PRINCIPALE
(LARGO DEL BON)

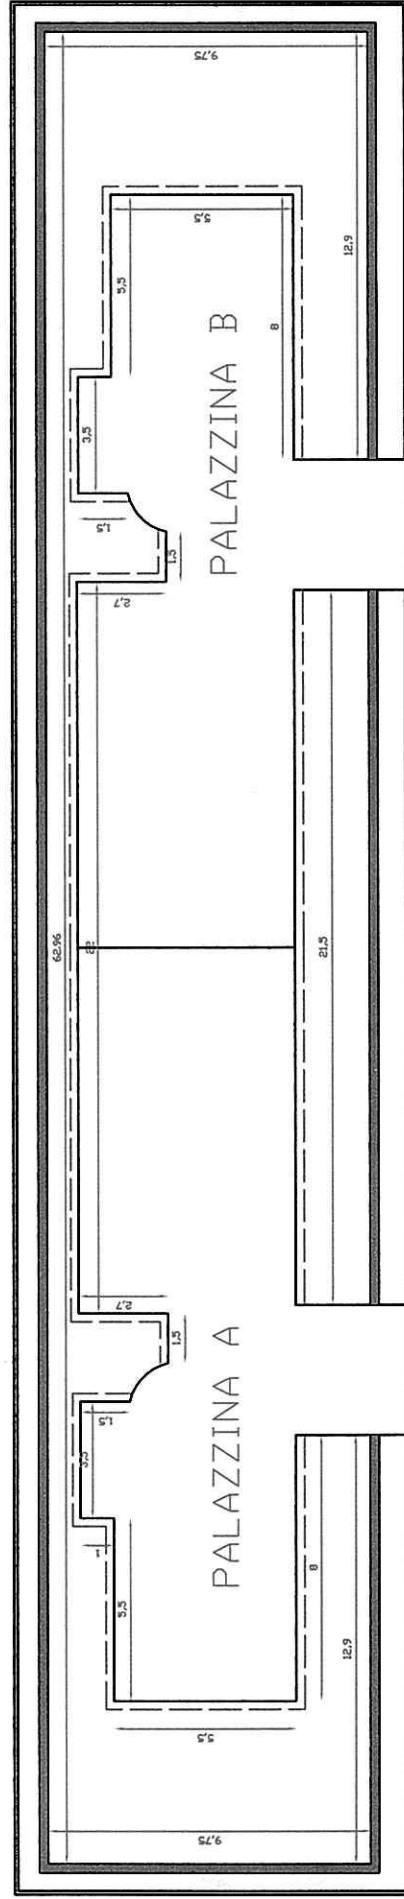

LASTRICO SOLARE

MORD

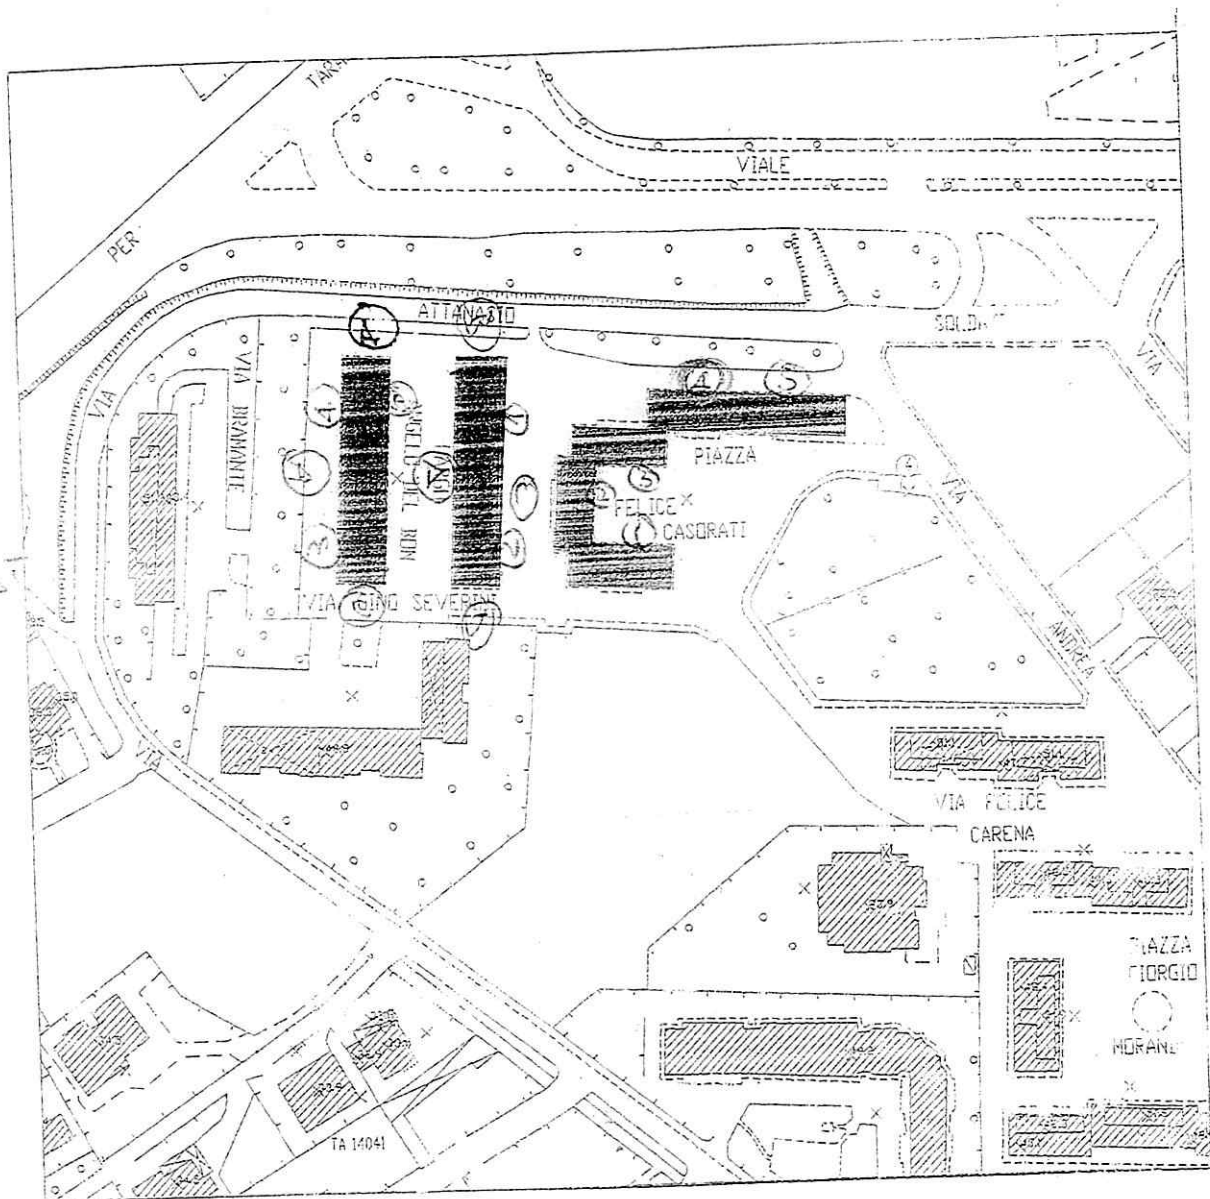

SUB
