

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

LEGGE REGIONALE n°20 DEL 30.12.2005 art. 13
DELIBERA REGIONALE n° 1084 del 18.07.2006

LAVORI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO I.A.C.P.
NEL COMUNE DI SAN DONACI (BR)
LOTTI 2° E 3° - LARGO STANCA E VIA STURDA'

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTISTA :

Dott. Ing. Giuseppe DE ANGELIS

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO :

Dott. Ing. Mario QUARTA

**COORDINATORE SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE:**

Geom. Rocco CAFORIO

COLLABORAZIONE TECNICA:

Geom.. Ferdinando DEL PRETE

Geom. Vincenzo TONDO

DATA :

SCALA :

ARCHIVIO :

VITALE FRANCESCO
Via S. ...
72013 CECILE NEAPOLICA (BR)
Cod. Fisc. ... 57D30 C42AJ
Part. IVA 01895960748

CRONOPROGRAMMA

Istituto Autonomo Case Popolari

Provincia di Brindisi

CRONOPROGRAMMA

OGGETTO: Lavori di recupero del patrimonio edilizio IACP nel Comune di San Donaci (Br) - lotti 2° e 3° - largo Stanca e via Sturdà.

COMMITTENTE: I.A.C.P. Brindisi

Brindisi, 17/07/2008

Il Tecnico
(geom. Rocco CAFORIO)

VITALE FRANCESCO
Via San'Antonio 10
72016 CAPOLEONE (BR)
Cod. Fisc. 01695960748
Part. IVA 01695960748

ID	Nome attività	Durata	Importo	ottobre 2008															
				06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	allestimento cantiere lotto 2° palazziana 1	7 g	0.00																
2	montaggio di impalcatura	7 g	15 213.60																
3	demolizione e spicconatura di intonaci	14 g	11 897.59																
4	risanamento di strutture in cemento armato	7 g	18 697.52																
5	Rifacimento di intonaci	28 g	52 088.96																
6	smontaggio vecchi e fornitura con posa in opera nuovi pluviali	7 g	1 364.40																
7	rifacimento completo di impermeabilizzazione terrazzo	14 g	23 008.22																
8	rifacimento di impianto di illuminazione scale	7 g	767.00																
9	tinteggiatura vani scala	14 g	1 964.28																
10	rimozioni di infissi e vetri	7 g	411.05																
11	fornitura di monoblocchi in alluminio e vetri	7 g	2 018.13																
12	smontaggio di impalcatura	7 g	0.00																
13	montaggio impalcatura lotto 2° palazzina 2	7 g	14 754.60																
14	demolizione e spicconatura di intonaci	14 g	11 720.82																
15	risanamento strutture in c.a.	7 g	18 574.51																
16	rifacimento di facciate	28 g	51 275.00																
17	smontaggio vecchi pluviali e f. e p.o. di nuovi	7 g	1 364.40																
18	rifacimento completo di impermeabilizzazione terrazzo	14 g	23 008.24																
19	rifacimento impianto di illuminazione scale	7 g	767.00																
20	tinteggiatura vani scala	14 g	1 964.28																
21	rimozioni di infissi e vetri	7 g	142.35																
22	f. e p. o. di monoblocchi in alluminio e vetri	7 g	2 018.13																
23	smontaggio di impalcatura	7 g	0.00																
24	montaggio impalcatura lotto 3°	7 g	14 754.60																
25	demolizione e spicconatura intonaci	14 g	11 720.82																
26	Risanamento strutture in c.a.	7 g	18 697.52																
27	rifacimento di facciate	28 g	51 315.00																
28	smontaggio vecchi pluviali e fornitura e posa di nuovi	7 g	1 364.40																
29	rifacimento completo di impermeabilizzazione terrazzo	14 g	28 223.44																
30	rifacimento impianto di illuminazione scale	7 g	767.00																
31	tinteggiatura vani scala	14 g	1 964.28																
32	rimozioni di infissi e vetri	7 g	417.35																
33	fornitura e posa in opera di monoblocchi in alluminio e vetri	7 g	2 015.65																
34	smontaggio di impalcature e smobilizzo cantiere	7 g	0.00																

VITALE FRANCESCO
 7201600121 - Sani Auletta s.n.
 Cod. Fisc. VT 0121000087
 Part. IVA 016005960748

ottobre 2008

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

— Previsione
— Esecuzione

430 000
420 000
410 000
400 000
390 000
380 000
370 000
360 000
350 000
340 000
330 000
320 000
310 000
300 000
290 000
280 000
270 000
260 000
250 000
240 000
230 000
220 000
210 000
200 000
190 000
180 000
170 000
160 000
150 000
140 000
130 000
120 000
110 000
100 000
90 000
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0


VITALE FRANCESCO
Via San'Alfonsio s.n.
72013 CEGLE (BR)
Cod. Fisc. VITEVNC 57D30 C424J
Part. IVA 01695960748


ottobre 2008										novembre 2008										dicembre 2008																																		
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13

VITALE FRANCESCO
72013 CANTÙ (VA) S.p.A.
CANTÙ (VA) ITALIA
0332 860160

ottobre 2008										novembre 2008										dicembre 2008																																		
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13

VITALE FRANCESCO
7200
SANTO SPIRITO (BR)
11/12/2008

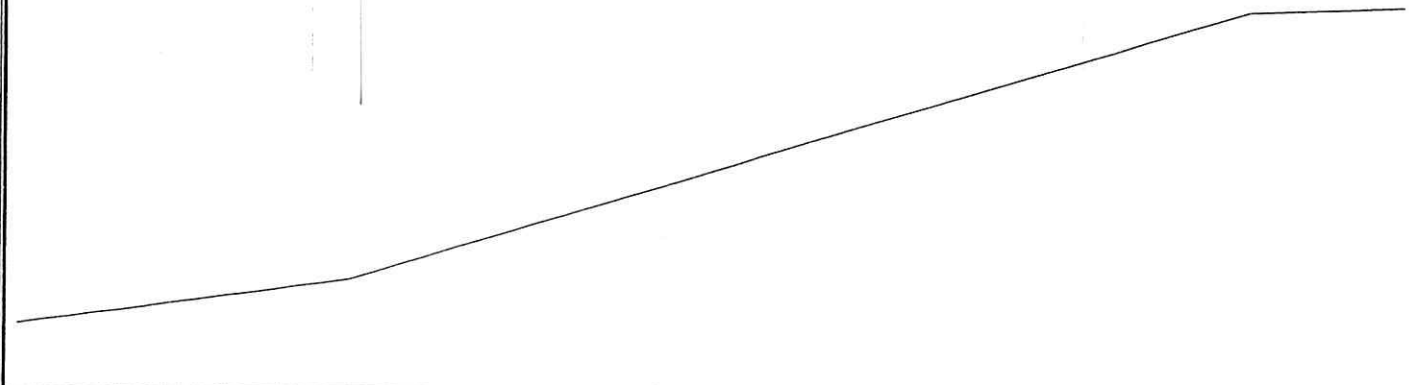

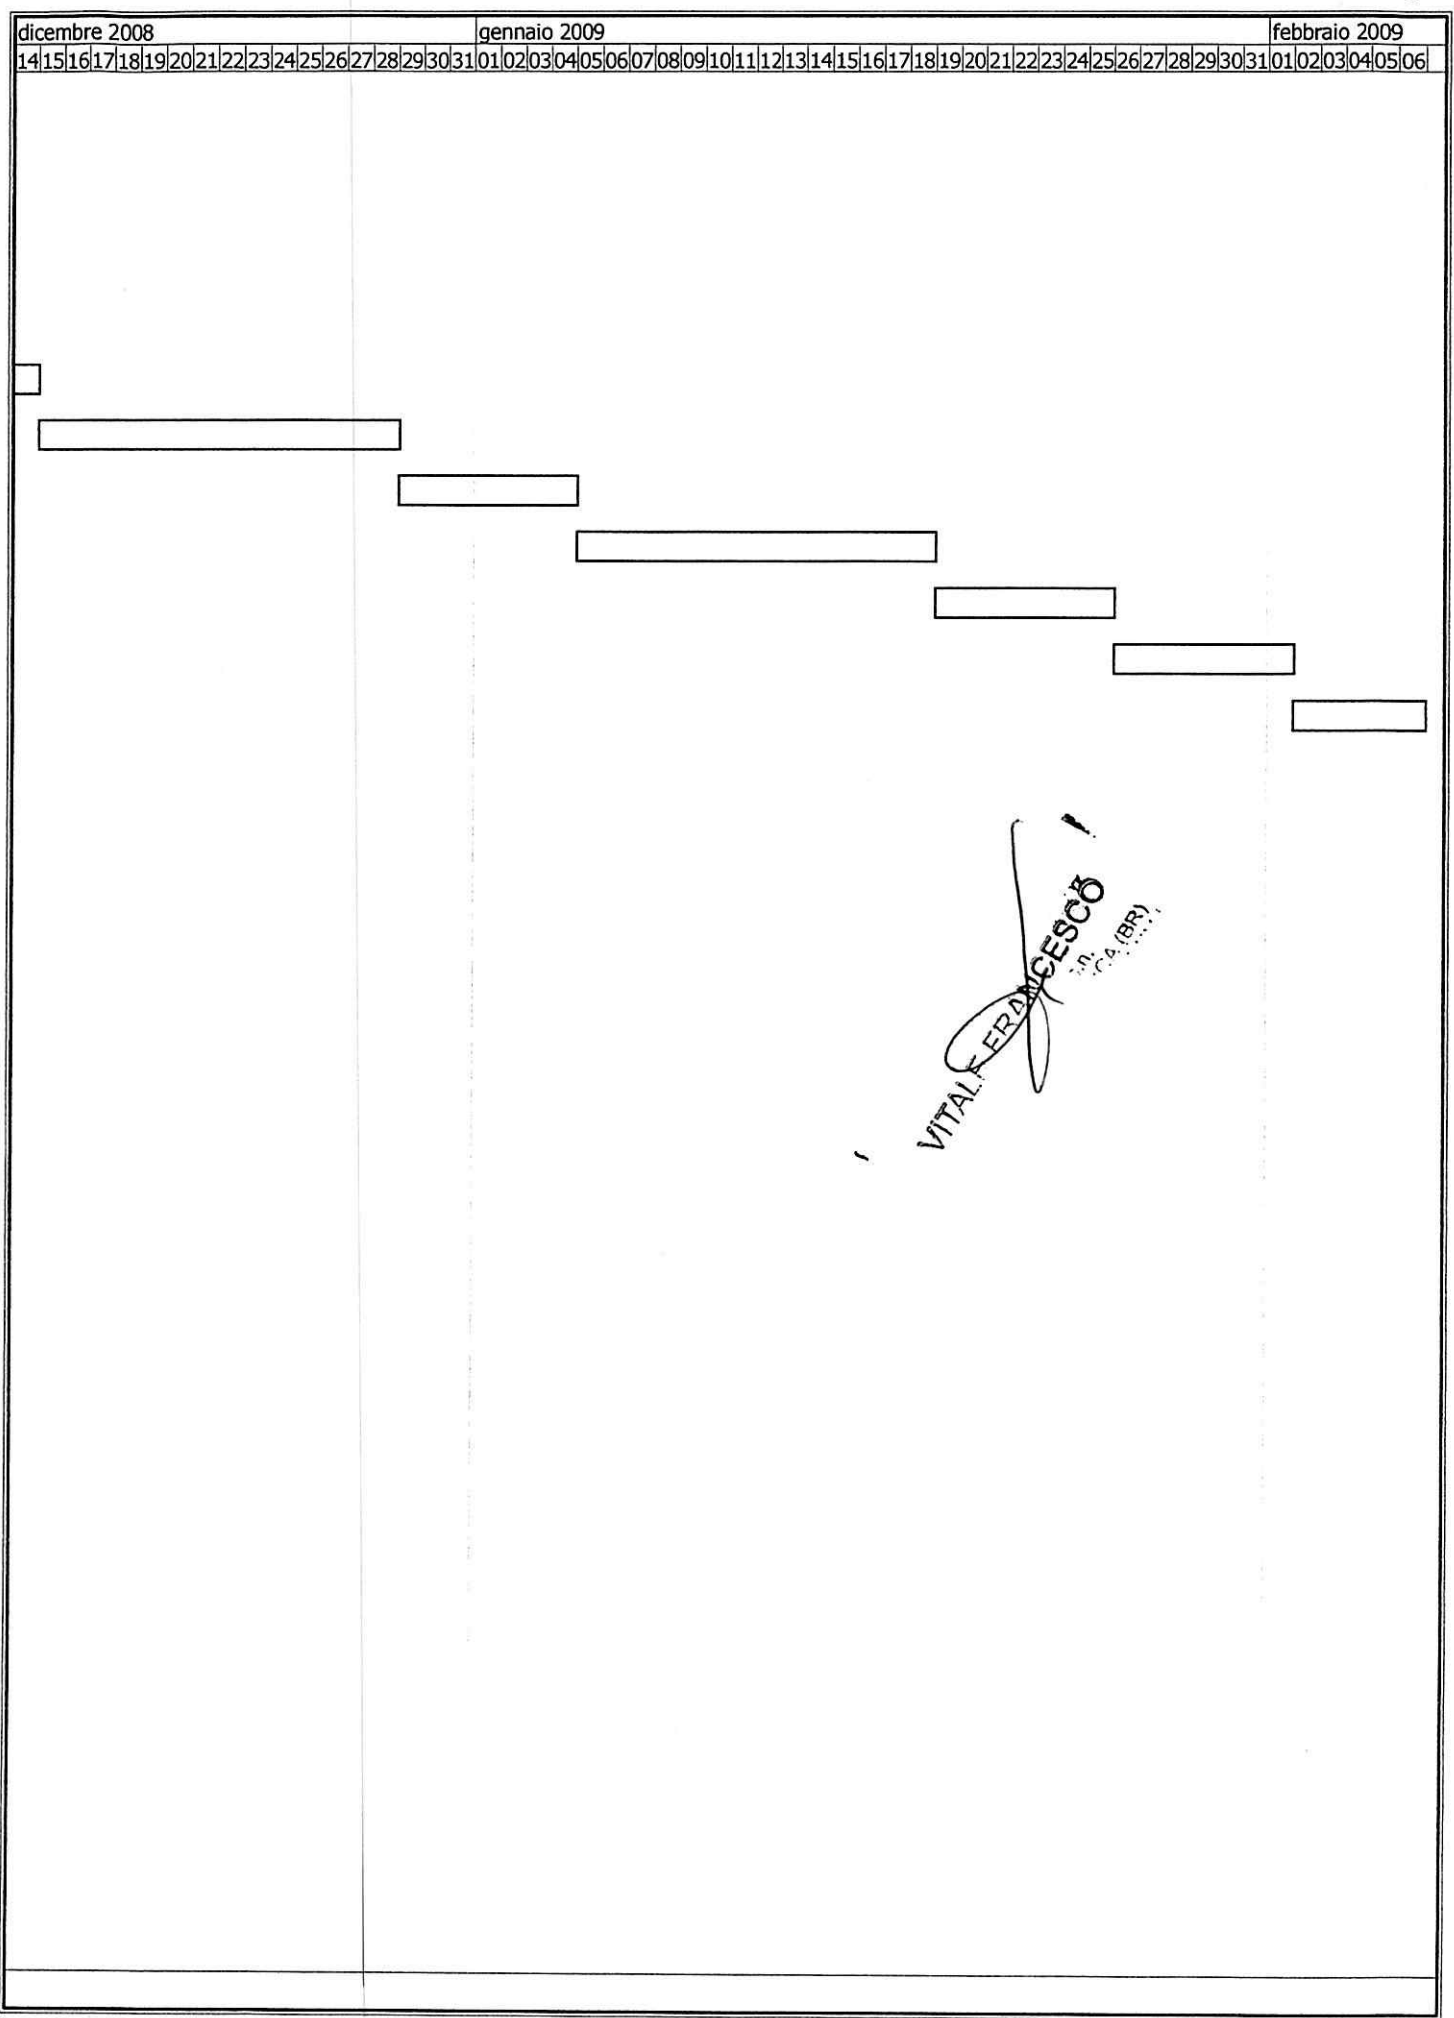

COMMITTENTE: I.A.C.P. Brindisi

dicembre 2008										gennaio 2009										febbraio 2009																																		
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06


VITALE FRANCESCO
 27/01/2009
 I.A.C.P. Brindisi (BR)

febbraio 2009

marzo 2009


aprile

07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

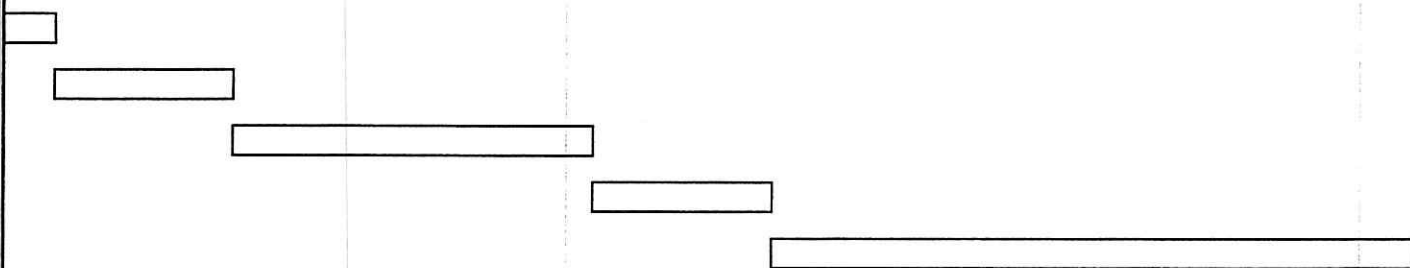

VITACEDRANCESCO

03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

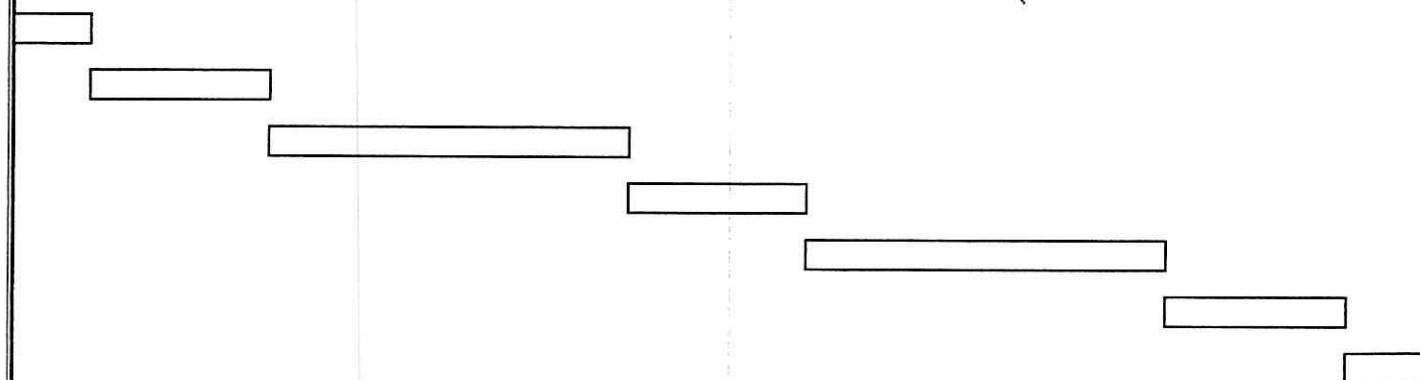

VITALE FRANCESCO
Via ... S.n.
... S.p.A. (BR)
... C.A. 24
... 46

aprile 2009

maggio 2009

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


VITALE FRANCESCO
Via San' Andrea s.n.
72019 Crotone (CS) Italia
Com. Fraz. V. S. Andrea
Tel. 0969 748748
Fax 0969 748748

COMMITTENTE: I.A.C.P. Brindisi

28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

VITALE FRANCESCO
Via S. ...
72021 ...

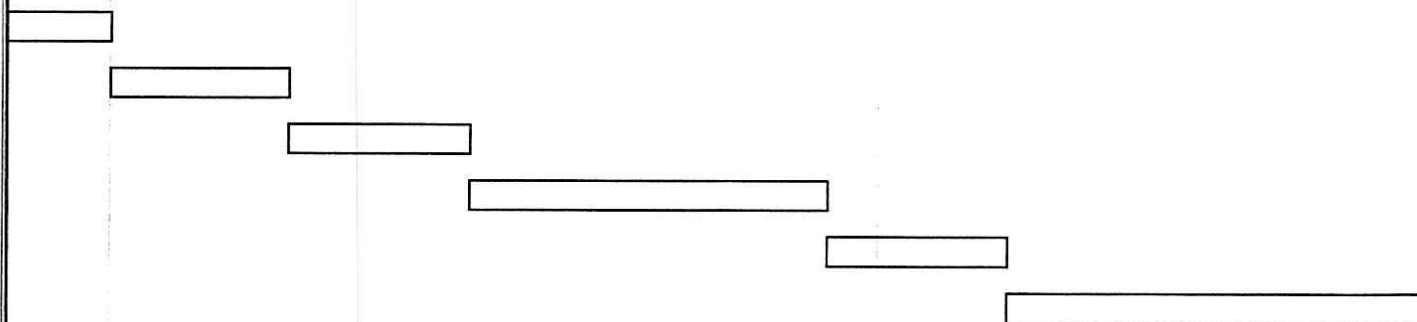


COMMITTENTE: I.A.C.P. Brindisi


maggio 2009										giugno 2009										luglio 2009																																		
28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

VITALE FRANCESCO
72013 Via S. Maria
Cod. Fisc. 02740000748
P. IVA 02740000748
CA (BR)
C424

luglio 2009										agosto 2009																						settembre 2009																						
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14

VITALE FRANCESCO
Via Adriaurora s.n.
72013 Ceglie del Campo (BR)
Cod. Fisc. VITALE FRANCESCO 04240
Part IVA 06903600748

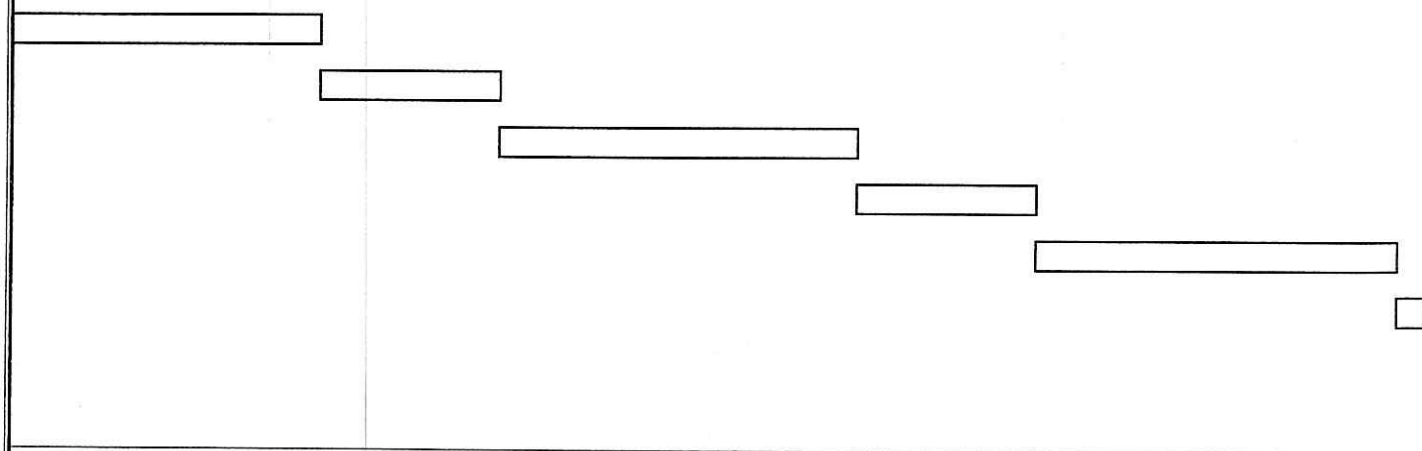

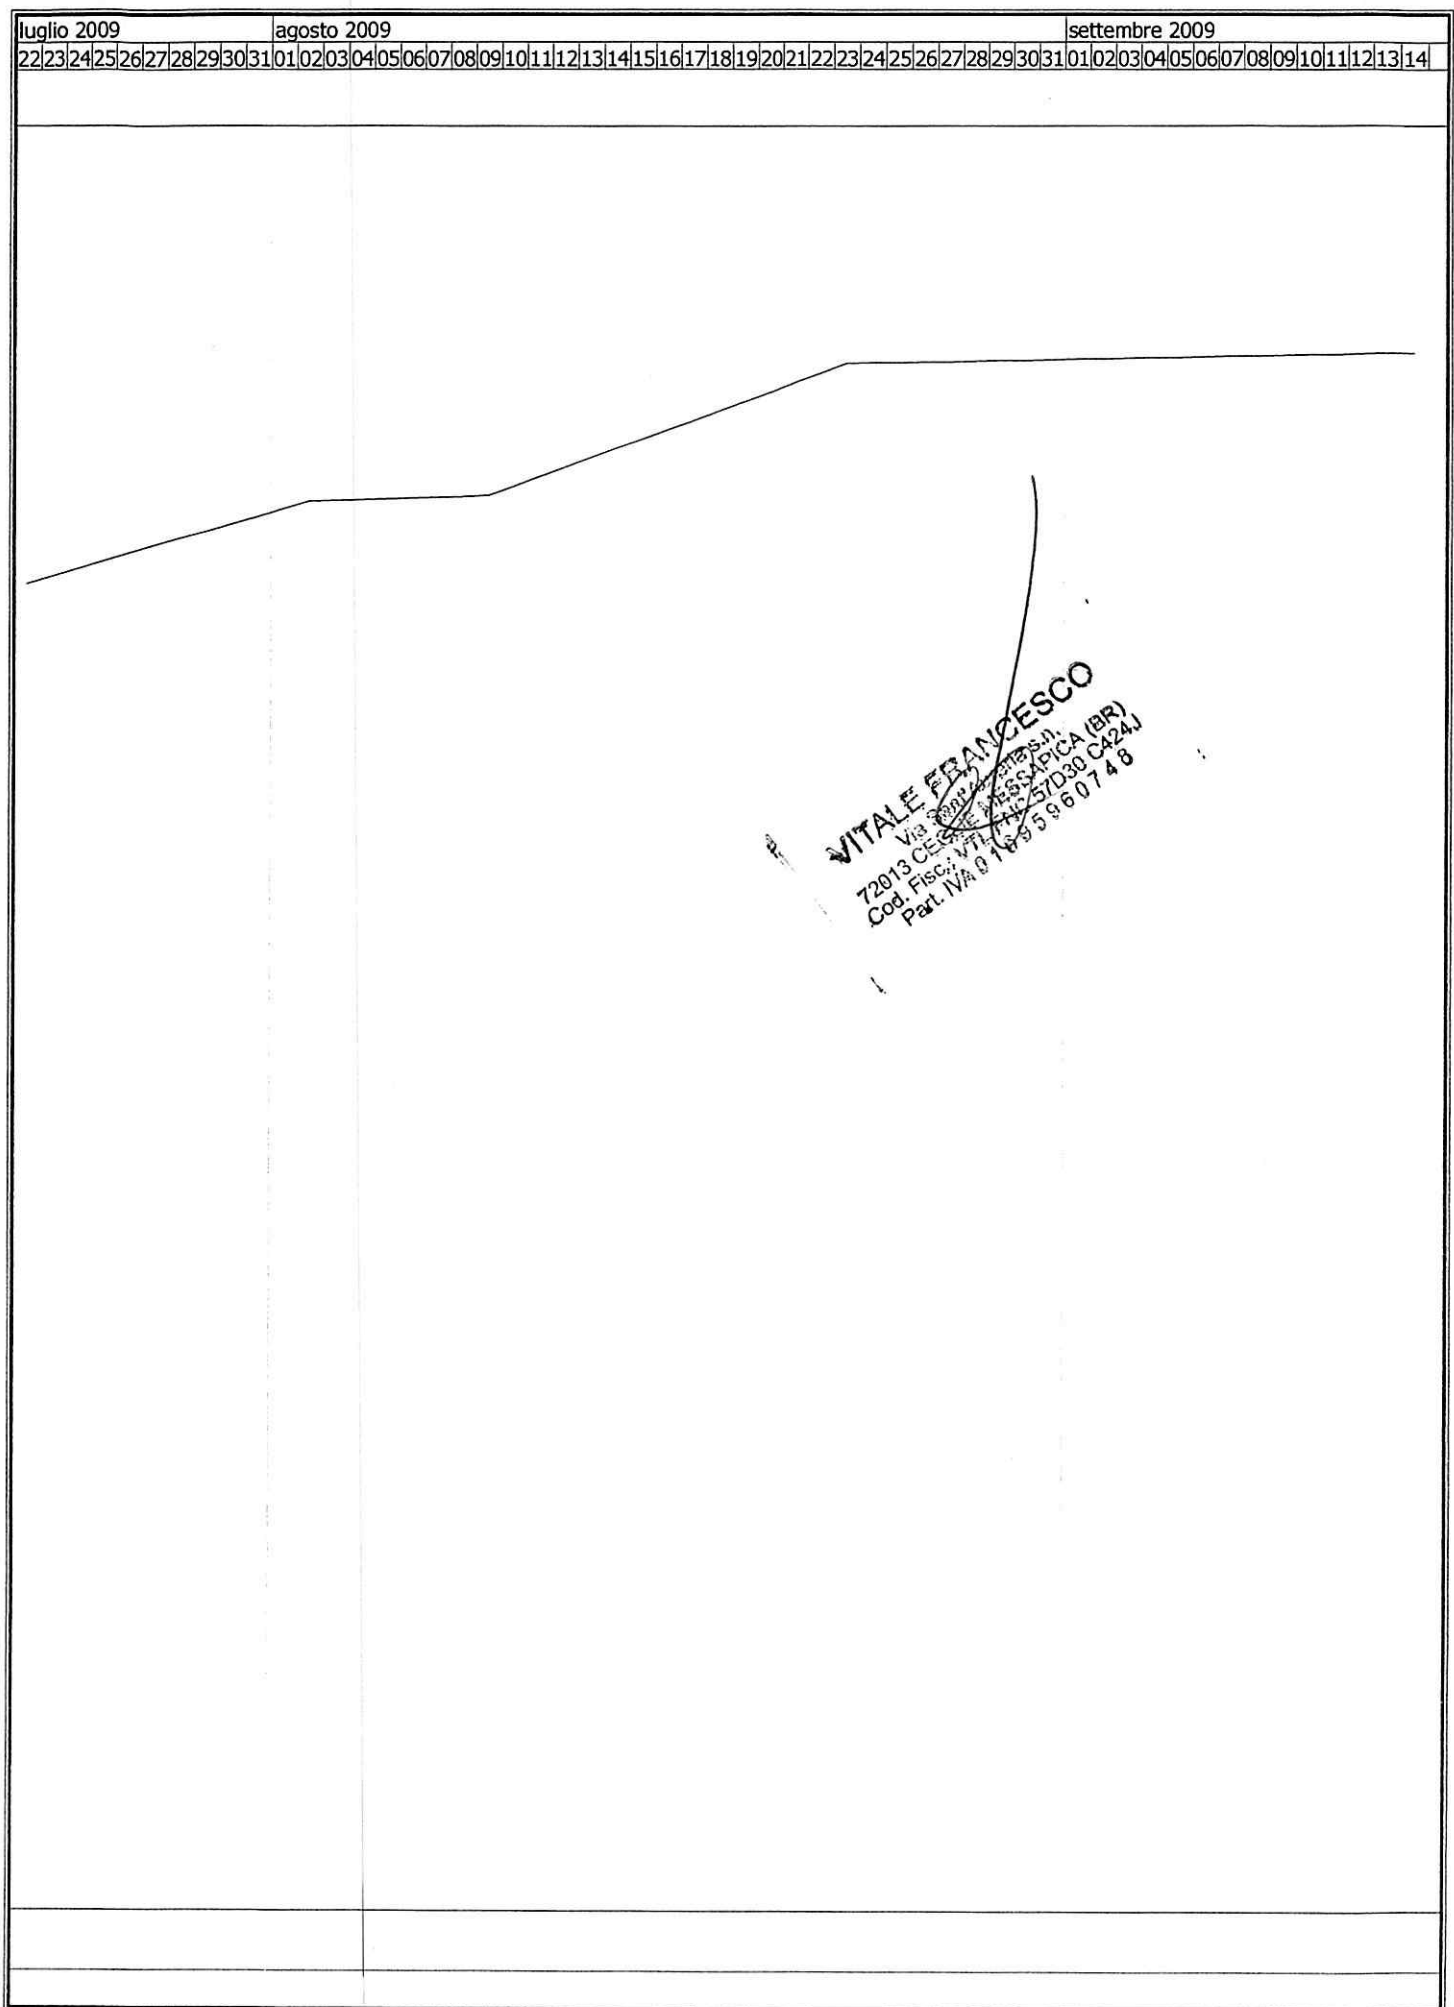

VITALE FRANCESCO
Via S. Maria delle Grazie, 1
72013 Ceglie Messapica (BR)
Cod. Fisc. 01695960748
Part. IVA 01695960748

VITALE FRANCESCO
 Via S. Maria della S. M.
 72013 CISTERNINO (BR)
 Cod. Fisc. 01554160184
 P. IVA 01554160184

Istituto Autonomo Case Popolari

Provincia di Brindisi

Tabella Attività

VITALE FRANCESCO
Via San'Andrea s.n.
72013 Ceglie Messapica (BR)
Cod. Fisc. VTL FMC 57D30 C424J
Part. IVA 01695960748

OGGETTO: Lavori di recupero del patrimonio edilizio IACP nel Comune di San Donaci (Br) - lotti 2° e 3° - largo Stanca e via Sturdà.

COMMITTENTE: I.A.C.P. Brindisi

Brindisi, 17/07/2008

Il Tecnico
(geom. Rocco CAFORIO)

ATTIVITA'	PREVISTO			Inizio	Fine	GIORNI	
	lire	euro	(%)			Lav.	Tot.
allestimento cantiere lotto 2° palazzina 1	0.00	0.00	0.00	06/10/2008	12/10/2008	7	7
montaggio di impalcatura	15 213.60	7.86	3.96	13/10/2008	19/10/2008	7	7
demolizione e spicconatura di intonaci	11 897.59	6.14	3.10	20/10/2008	02/11/2008	14	14
risanamento di strutture in cemento armato	18 697.52	9.66	4.87	03/11/2008	09/11/2008	7	7
Rifacimento di intonaci	52 088.96	26.90	13.56	10/11/2008	07/12/2008	28	28
smontaggio vecchi e fornitura con posa in opera nuovi pluviali	1 364.40	0.70	0.36	08/12/2008	14/12/2008	7	7
rifacimento completo di impermeabilizzazione terrazzo	23 008.22	11.88	5.99	15/12/2008	28/12/2008	14	14
rifacimento di impianto di illuminazione scale	767.00	0.40	0.20	29/12/2008	04/01/2009	7	7
tinteggiatura vani scala	1 964.28	1.01	0.51	05/01/2009	18/01/2009	14	14
rimozioni di infissi e vetri	411.05	0.21	0.11	19/01/2009	25/01/2009	7	7
fornitura di monoblocchi in alluminio e vetri	2 018.13	1.04	0.53	26/01/2009	01/02/2009	7	7
smontaggio di impalcatura	0.00	0.00	0.00	02/02/2009	08/02/2009	7	7
montaggio impalcatura lotto 2° palazzina 2	14 754.60	7.62	3.84	09/02/2009	15/02/2009	7	7
demolizione e spicconatura di intonaci	720.82	6.05	3.05	16/02/2009	01/03/2009	14	14
risanamento strutture in c.a.	574.51	9.59	4.83	02/03/2009	08/03/2009	7	7
rifacimento di facciate	51 275.00	26.48	13.34	09/03/2009	05/04/2009	28	28
smontaggio vecchi pluviali e f. e p.o. di nuovi	1 364.40	0.70	0.36	06/04/2009	12/04/2009	7	7
rifacimento completo di impermeabilizzazione terrazzo	23 008.24	11.88	5.99	13/04/2009	26/04/2009	14	14
rifacimento impianto di illuminazione scale	767.00	0.40	0.20	27/04/2009	03/05/2009	7	7
tinteggiatura vani scala	1 964.28	1.01	0.51	04/05/2009	17/05/2009	14	14
rimozioni di infissi e vetri	142.35	0.07	0.04	18/05/2009	24/05/2009	7	7
f. e p. o. di monoblocchi in alluminio e vetri	2 018.13	1.04	0.53	25/05/2009	31/05/2009	7	7
smontaggio di impalcatura	0.00	0.00	0.00	01/06/2009	07/06/2009	7	7
montaggio impalcatura lotto 3°	14 754.60	7.62	3.84	08/06/2009	14/06/2009	7	7
demolizione e spicconatura intonaci	11 720.82	6.05	3.05	15/06/2009	28/06/2009	14	14
Risanamento strutture in c.a.	18 697.52	9.66	4.87	29/06/2009	05/07/2009	7	7
rifacimento di facciate	51 315.00	26.50	13.35	06/07/2009	02/08/2009	28	28
smontaggio vecchi pluviali e fornitura e posa di nuovi	1 364.40	0.70	0.36	03/08/2009	09/08/2009	7	7
rifacimento completo di impermeabilizzazione terrazzo	28 223.44	14.58	7.34	10/08/2009	23/08/2009	14	14
rifacimento impianto di illuminazione scale	767.00	0.40	0.20	24/08/2009	30/08/2009	7	7
tinteggiatura vani scala	1 964.28	1.01	0.51	31/08/2009	13/09/2009	14	14
rimozioni di infissi e vetri	417.35	0.22	0.11	14/09/2009	20/09/2009	7	7
fornitura e posa in opera di monoblocchi in alluminio e vetri	2 015.65	1.04	0.52	21/09/2009	27/09/2009	7	7

VITALE FRANCESCO
 Via Santa Maria s.n.
 72013 Ceglie Messapica (BR)
 Cod. Fisc.: VTL PNC 57D30 C4243
 Part. IVA 01095960748

ATTIVITA'	PREVISTO			Inizio	Fine	GIORNI	
	lire	euro	(%)			Lav.	Tot.
smontaggio di impalcature e smobilizzo cantiere	0.00	0.00	0.00	28/09/2009	04/10/2009	7	7
Brindisi, 17/07/2008							
il Tecnico geom. Rocco CAFORIO							

VITALE FRANCESCO
 Via S. ... s.n.
 72013 CECILE (BR)
 Cod. Fisc. ... 0424J
 ... 8

Istituto Autonomo Case Popolari

Provincia di Brindisi

Tabella Date e Importi

FRANCESCO
Via San... s.n.
A (BR)
C424J
72912
Cod

OGGETTO: Lavori di recupero del patrimonio edilizio IACP nel Comune di San Donaci (Br) - lotti 2° e 3° - largo Stanca e via Sturdà.

COMMITTENTE: I.A.C.P. Brindisi

Brindisi, 17/07/2008

Il Tecnico
(geom. Rocco CAFORIO)

DATA	IMPORTI PREVISTI				
	Parziale lire	Parziale euro	Progressivo lire	Progressivo euro	(%)
13/10/2008	2 173.37	1.12	2 173.37	1.12	0.57
14/10/2008	2 173.37	1.12	4 346.74	2.24	1.13
15/10/2008	2 173.37	1.12	6 520.11	3.37	1.70
16/10/2008	2 173.37	1.12	8 693.49	4.49	2.26
17/10/2008	2 173.37	1.12	10 866.86	5.61	2.83
18/10/2008	2 173.37	1.12	13 040.23	6.73	3.39
19/10/2008	2 173.37	1.12	15 213.60	7.86	3.96
20/10/2008	849.83	0.44	16 063.43	8.30	4.18
21/10/2008	849.83	0.44	16 913.26	8.73	4.40
22/10/2008	849.83	0.44	17 763.08	9.17	4.62
23/10/2008	849.83	0.44	18 612.91	9.61	4.84
24/10/2008	849.83	0.44	19 462.74	10.05	5.06
25/10/2008	849.83	0.44	20 312.57	10.49	5.29
26/10/2008	849.83	0.44	21 162.39	10.93	5.51
27/10/2008	849.83	0.44	22 012.22	11.37	5.73
28/10/2008	849.83	0.44	22 862.05	11.81	5.95
29/10/2008	849.83	0.44	23 711.88	12.25	6.17
30/10/2008	849.83	0.44	24 561.71	12.69	6.39
31/10/2008	849.83	0.44	25 411.53	13.12	6.61
01/11/2008	849.83	0.44	26 261.36	13.56	6.83
02/11/2008	849.83	0.44	27 111.19	14.00	7.06
03/11/2008	2 671.07	1.38	29 782.26	15.38	7.75
04/11/2008	2 671.07	1.38	32 453.34	16.76	8.45
05/11/2008	2 671.07	1.38	35 124.41	18.14	9.14
06/11/2008	2 671.07	1.38	37 795.49	19.52	9.84
07/11/2008	2 671.07	1.38	40 466.56	20.90	10.53
08/11/2008	2 671.07	1.38	43 137.64	22.28	11.23
09/11/2008	2 671.07	1.38	45 808.71	23.66	11.92
10/11/2008	1 860.32	0.96	47 669.03	24.62	12.41
11/11/2008	1 860.32	0.96	49 529.35	25.58	12.89
12/11/2008	1 860.32	0.96	51 389.67	26.54	13.37
13/11/2008	1 860.32	0.96	53 249.99	27.50	13.86
14/11/2008	1 860.32	0.96	55 110.31	28.46	14.34
15/11/2008	1 860.32	0.96	56 970.63	29.42	14.83
16/11/2008	1 860.32	0.96	58 830.95	30.38	15.31
17/11/2008	1 860.32	0.96	60 691.27	31.34	15.79
18/11/2008	1 860.32	0.96	62 551.59	32.31	16.28
19/11/2008	1 860.32	0.96	64 411.91	33.27	16.76
20/11/2008	1 860.32	0.96	66 272.23	34.23	17.25
21/11/2008	1 860.32	0.96	68 132.55	35.19	17.73
22/11/2008	1 860.32	0.96	69 992.87	36.15	18.21
23/11/2008	1 860.32	0.96	71 853.19	37.11	18.70
24/11/2008	1 860.32	0.96	73 713.51	38.07	19.18
25/11/2008	1 860.32	0.96	75 573.83	39.03	19.67
26/11/2008	1 860.32	0.96	77 434.15	39.99	20.15
27/11/2008	1 860.32	0.96	79 294.47	40.95	20.64
28/11/2008	1 860.32	0.96	81 154.79	41.91	21.12
29/11/2008	1 860.32	0.96	83 015.11	42.87	21.60
30/11/2008	1 860.32	0.96	84 875.43	43.83	22.09
01/12/2008	1 860.32	0.96	86 735.75	44.80	22.57
02/12/2008	1 860.32	0.96	88 596.07	45.76	23.06
03/12/2008	1 860.32	0.96	90 456.39	46.72	23.54
04/12/2008	1 860.32	0.96	92 316.71	47.68	24.02
05/12/2008	1 860.32	0.96	94 177.03	48.64	24.51
06/12/2008	1 860.32	0.96	96 037.35	49.60	24.99
07/12/2008	1 860.32	0.96	97 897.67	50.56	25.48
08/12/2008	194.91	0.10	98 092.58	50.66	25.53
09/12/2008	194.91	0.10	98 287.50	50.76	25.58
10/12/2008	194.91	0.10	98 482.41	50.86	25.63
11/12/2008	194.91	0.10	98 677.33	50.96	25.68
12/12/2008	194.91	0.10	98 872.24	51.06	25.73
13/12/2008	194.91	0.10	99 067.16	51.16	25.78
14/12/2008	194.91	0.10	99 262.07	51.26	25.83
15/12/2008	1 643.44	0.85	100 905.51	52.11	26.26
16/12/2008	1 643.44	0.85	102 548.96	52.96	26.69

VITALE FRANCESCO
 Via S. ...
 72013 CE ...
 Cod. Fisc. ...

DATA	IMPORTI PREVISTI				
	Parziale lire	Parziale euro	Progressivo lire	Progressivo euro	(%)
17/12/2008	1 643.44	0.85	104 192.40	53.81	27.12
18/12/2008	1 643.44	0.85	105 835.85	54.66	27.54
19/12/2008	1 643.44	0.85	107 479.29	55.51	27.97
20/12/2008	1 643.44	0.85	109 122.74	56.36	28.40
21/12/2008	1 643.44	0.85	110 766.18	57.21	28.83
22/12/2008	1 643.44	0.85	112 409.62	58.05	29.25
23/12/2008	1 643.44	0.85	114 053.07	58.90	29.68
24/12/2008	1 643.44	0.85	115 696.51	59.75	30.11
25/12/2008	1 643.44	0.85	117 339.96	60.60	30.54
26/12/2008	1 643.44	0.85	118 983.40	61.45	30.96
27/12/2008	1 643.44	0.85	120 626.85	62.30	31.39
28/12/2008	1 643.44	0.85	122 270.29	63.15	31.82
29/12/2008	109.57	0.06	122 379.86	63.20	31.85
30/12/2008	109.57	0.06	122 489.43	63.26	31.88
31/12/2008	109.57	0.06	122 599.00	63.32	31.91
01/01/2009	109.57	0.06	122 708.58	63.37	31.93
02/01/2009	109.57	0.06	122 818.15	63.43	31.96
03/01/2009	109.57	0.06	122 927.72	63.49	31.99
04/01/2009	109.57	0.06	123 037.29	63.54	32.02
05/01/2009	140.31	0.07	123 177.60	63.62	32.06
06/01/2009	140.31	0.07	123 317.90	63.69	32.09
07/01/2009	140.31	0.07	123 458.21	63.76	32.13
08/01/2009	140.31	0.07	123 598.51	63.83	32.17
09/01/2009	140.31	0.07	123 738.82	63.91	32.20
10/01/2009	140.31	0.07	123 879.12	63.98	32.24
11/01/2009	140.31	0.07	124 019.43	64.05	32.27
12/01/2009	140.31	0.07	124 159.74	64.12	32.31
13/01/2009	140.31	0.07	124 300.04	64.20	32.35
14/01/2009	140.31	0.07	124 440.35	64.27	32.38
15/01/2009	140.31	0.07	124 580.65	64.34	32.42
16/01/2009	140.31	0.07	124 720.96	64.41	32.46
17/01/2009	140.31	0.07	124 861.26	64.49	32.49
18/01/2009	140.31	0.07	125 001.57	64.56	32.53
19/01/2009	58.72	0.03	125 060.29	64.59	32.55
20/01/2009	58.72	0.03	125 119.01	64.62	32.56
21/01/2009	58.72	0.03	125 177.73	64.65	32.58
22/01/2009	58.72	0.03	125 236.46	64.68	32.59
23/01/2009	58.72	0.03	125 295.18	64.71	32.61
24/01/2009	58.72	0.03	125 353.90	64.74	32.62
25/01/2009	58.72	0.03	125 412.62	64.77	32.64
26/01/2009	288.30	0.15	125 700.92	64.92	32.71
27/01/2009	288.30	0.15	125 989.23	65.07	32.79
28/01/2009	288.30	0.15	126 277.53	65.22	32.86
29/01/2009	288.30	0.15	126 565.84	65.37	32.94
30/01/2009	288.30	0.15	126 854.14	65.51	33.01
31/01/2009	288.30	0.15	127 142.45	65.66	33.09
01/02/2009	288.30	0.15	127 430.75	65.81	33.16
09/02/2009	2 107.80	1.09	129 538.55	66.90	33.71
10/02/2009	2 107.80	1.09	131 646.35	67.99	34.26
11/02/2009	2 107.80	1.09	133 754.15	69.08	34.81
12/02/2009	2 107.80	1.09	135 861.95	70.17	35.36
13/02/2009	2 107.80	1.09	137 969.75	71.26	35.91
14/02/2009	2 107.80	1.09	140 077.55	72.34	36.45
15/02/2009	2 107.80	1.09	142 185.35	73.43	37.00
16/02/2009	837.20	0.43	143 022.55	73.86	37.22
17/02/2009	837.20	0.43	143 859.75	74.30	37.44
18/02/2009	837.20	0.43	144 696.95	74.73	37.66
19/02/2009	837.20	0.43	145 534.16	75.16	37.87
20/02/2009	837.20	0.43	146 371.36	75.59	38.09
21/02/2009	837.20	0.43	147 208.56	76.03	38.31
22/02/2009	837.20	0.43	148 045.76	76.46	38.53
23/02/2009	837.20	0.43	148 882.96	76.89	38.75
24/02/2009	837.20	0.43	149 720.16	77.32	38.96
25/02/2009	837.20	0.43	150 557.36	77.76	39.18
26/02/2009	837.20	0.43	151 394.57	78.19	39.40

VITALE FRANCESCO
 Via Sant'Andrea s.n.
 72013 Ceglie Messapica (BR)
 Cod. Fisc. VTLFRN 07120 C424J
 Part. IVA 07670748

DATA	IMPORTI PREVISTI				
	Parziale lire	Parziale euro	Progressivo lire	Progressivo euro	(%)
27/02/2009	837.20	0.43	152 231.77	78.62	39.62
28/02/2009	837.20	0.43	153 068.97	79.05	39.83
01/03/2009	837.20	0.43	153 906.17	79.49	40.05
02/03/2009	2 653.50	1.37	156 559.67	80.86	40.74
03/03/2009	2 653.50	1.37	159 213.17	82.23	41.43
04/03/2009	2 653.50	1.37	161 866.67	83.60	42.12
05/03/2009	2 653.50	1.37	164 520.18	84.97	42.81
06/03/2009	2 653.50	1.37	167 173.68	86.34	43.51
07/03/2009	2 653.50	1.37	169 827.18	87.71	44.20
08/03/2009	2 653.50	1.37	172 480.68	89.08	44.89
09/03/2009	1 831.25	0.95	174 311.93	90.02	45.36
10/03/2009	1 831.25	0.95	176 143.18	90.97	45.84
11/03/2009	1 831.25	0.95	177 974.43	91.92	46.32
12/03/2009	1 831.25	0.95	179 805.68	92.86	46.79
13/03/2009	1 831.25	0.95	181 636.93	93.81	47.27
14/03/2009	1 831.25	0.95	183 468.18	94.75	47.75
15/03/2009	1 831.25	0.95	185 299.43	95.70	48.22
16/03/2009	1 831.25	0.95	187 130.68	96.64	48.70
17/03/2009	1 831.25	0.95	188 961.93	97.59	49.18
18/03/2009	1 831.25	0.95	190 793.18	98.54	49.65
19/03/2009	1 831.25	0.95	192 624.43	99.48	50.13
20/03/2009	1 831.25	0.95	194 455.68	100.43	50.61
21/03/2009	1 831.25	0.95	196 286.93	101.37	51.08
22/03/2009	1 831.25	0.95	198 118.18	102.32	51.56
23/03/2009	1 831.25	0.95	199 949.43	103.27	52.03
24/03/2009	1 831.25	0.95	201 780.68	104.21	52.51
25/03/2009	1 831.25	0.95	203 611.93	105.16	52.99
26/03/2009	1 831.25	0.95	205 443.18	106.10	53.46
27/03/2009	1 831.25	0.95	207 274.43	107.05	53.94
28/03/2009	1 831.25	0.95	209 105.68	107.99	54.42
29/03/2009	1 831.25	0.95	210 936.93	108.94	54.89
30/03/2009	1 831.25	0.95	212 768.18	109.89	55.37
31/03/2009	1 831.25	0.95	214 599.43	110.83	55.85
01/04/2009	1 831.25	0.95	216 430.68	111.78	56.32
02/04/2009	1 831.25	0.95	218 261.93	112.72	56.80
03/04/2009	1 831.25	0.95	220 093.18	113.67	57.28
04/04/2009	1 831.25	0.95	221 924.43	114.61	57.75
05/04/2009	1 831.25	0.95	223 755.68	115.56	58.23
06/04/2009	194.91	0.10	223 950.59	115.66	58.28
07/04/2009	194.91	0.10	224 145.51	115.76	58.33
08/04/2009	194.91	0.10	224 340.42	115.86	58.38
09/04/2009	194.91	0.10	224 535.34	115.96	58.43
10/04/2009	194.91	0.10	224 730.25	116.06	58.48
11/04/2009	194.91	0.10	224 925.17	116.16	58.53
12/04/2009	194.91	0.10	225 120.08	116.26	58.59
13/04/2009	1 643.45	0.85	226 763.53	117.11	59.01
14/04/2009	1 643.45	0.85	228 406.97	117.96	59.44
15/04/2009	1 643.45	0.85	230 050.42	118.81	59.87
16/04/2009	1 643.45	0.85	231 693.86	119.66	60.30
17/04/2009	1 643.45	0.85	233 337.31	120.51	60.72
18/04/2009	1 643.45	0.85	234 980.75	121.36	61.15
19/04/2009	1 643.45	0.85	236 624.20	122.21	61.58
20/04/2009	1 643.45	0.85	238 267.65	123.05	62.01
21/04/2009	1 643.45	0.85	239 911.09	123.90	62.43
22/04/2009	1 643.45	0.85	241 554.54	124.75	62.86
23/04/2009	1 643.45	0.85	243 197.98	125.60	63.29
24/04/2009	1 643.45	0.85	244 841.43	126.45	63.72
25/04/2009	1 643.45	0.85	246 484.87	127.30	64.15
26/04/2009	1 643.45	0.85	248 128.32	128.15	64.57
27/04/2009	109.57	0.06	248 237.89	128.20	64.60
28/04/2009	109.57	0.06	248 347.46	128.26	64.63
29/04/2009	109.57	0.06	248 457.03	128.32	64.66
30/04/2009	109.57	0.06	248 566.61	128.37	64.69
01/05/2009	109.57	0.06	248 676.18	128.43	64.72
02/05/2009	109.57	0.06	248 785.75	128.49	64.74

VITALE FRANCESCO
 Via Sant'Antonio s.n.
 72013 CEGLIE (SSAPICA (BR))
 Cod. Fisc. 01715050748
 Part. IVA 01695960748

DATA	IMPORTI PREVISTI				
	Parziale lire	Parziale euro	Progressivo lire	Progressivo euro	(%)
03/05/2009	109.57	0.06	248 895.32	128.54	64.77
04/05/2009	140.31	0.07	249 035.63	128.62	64.81
05/05/2009	140.31	0.07	249 175.93	128.69	64.85
06/05/2009	140.31	0.07	249 316.24	128.76	64.88
07/05/2009	140.31	0.07	249 456.54	128.83	64.92
08/05/2009	140.31	0.07	249 596.85	128.91	64.96
09/05/2009	140.31	0.07	249 737.15	128.98	64.99
10/05/2009	140.31	0.07	249 877.46	129.05	65.03
11/05/2009	140.31	0.07	250 017.77	129.12	65.06
12/05/2009	140.31	0.07	250 158.07	129.20	65.10
13/05/2009	140.31	0.07	250 298.38	129.27	65.14
14/05/2009	140.31	0.07	250 438.68	129.34	65.17
15/05/2009	140.31	0.07	250 578.99	129.41	65.21
16/05/2009	140.31	0.07	250 719.29	129.49	65.25
17/05/2009	140.31	0.07	250 859.60	129.56	65.28
18/05/2009	20.34	0.01	250 879.94	129.57	65.29
19/05/2009	20.34	0.01	250 900.27	129.58	65.29
20/05/2009	20.34	0.01	250 920.61	129.59	65.30
21/05/2009	20.34	0.01	250 940.94	129.60	65.30
22/05/2009	20.34	0.01	250 961.28	129.61	65.31
23/05/2009	20.34	0.01	250 981.61	129.62	65.32
24/05/2009	20.34	0.01	251 001.95	129.63	65.32
25/05/2009	288.30	0.15	251 290.25	129.78	65.40
26/05/2009	288.30	0.15	251 578.56	129.93	65.47
27/05/2009	288.30	0.15	251 866.86	130.08	65.55
28/05/2009	288.30	0.15	252 155.17	130.23	65.62
29/05/2009	288.30	0.15	252 443.47	130.38	65.70
30/05/2009	288.30	0.15	252 731.78	130.53	65.77
31/05/2009	288.30	0.15	253 020.08	130.67	65.85
08/06/2009	2 107.80	1.09	255 127.88	131.76	66.39
09/06/2009	2 107.80	1.09	257 235.68	132.85	66.94
10/06/2009	2 107.80	1.09	259 343.48	133.94	67.49
11/06/2009	2 107.80	1.09	261 451.28	135.03	68.04
12/06/2009	2 107.80	1.09	263 559.08	136.12	68.59
13/06/2009	2 107.80	1.09	265 666.88	137.21	69.14
14/06/2009	2 107.80	1.09	267 774.68	138.29	69.69
15/06/2009	837.20	0.43	268 611.88	138.73	69.90
16/06/2009	837.20	0.43	269 449.08	139.16	70.12
17/06/2009	837.20	0.43	270 286.28	139.59	70.34
18/06/2009	837.20	0.43	271 123.49	140.02	70.56
19/06/2009	837.20	0.43	271 960.69	140.46	70.78
20/06/2009	837.20	0.43	272 797.89	140.89	70.99
21/06/2009	837.20	0.43	273 635.09	141.32	71.21
22/06/2009	837.20	0.43	274 472.29	141.75	71.43
23/06/2009	837.20	0.43	275 309.49	142.19	71.65
24/06/2009	837.20	0.43	276 146.69	142.62	71.86
25/06/2009	837.20	0.43	276 983.90	143.05	72.08
26/06/2009	837.20	0.43	277 821.10	143.48	72.30
27/06/2009	837.20	0.43	278 658.30	143.92	72.52
28/06/2009	837.20	0.43	279 495.50	144.35	72.74
29/06/2009	2 671.07	1.38	282 166.57	145.73	73.43
30/06/2009	2 671.07	1.38	284 837.65	147.11	74.13
01/07/2009	2 671.07	1.38	287 508.72	148.49	74.82
02/07/2009	2 671.07	1.38	290 179.80	149.87	75.52
03/07/2009	2 671.07	1.38	292 850.87	151.24	76.21
04/07/2009	2 671.07	1.38	295 521.95	152.62	76.91
05/07/2009	2 671.07	1.38	298 193.02	154.00	77.60
06/07/2009	1 832.68	0.95	300 025.70	154.95	78.08
07/07/2009	1 832.68	0.95	301 858.38	155.90	78.56
08/07/2009	1 832.68	0.95	303 691.06	156.84	79.03
09/07/2009	1 832.68	0.95	305 523.73	157.79	79.51
10/07/2009	1 832.68	0.95	307 356.41	158.74	79.99
11/07/2009	1 832.68	0.95	309 189.09	159.68	80.46
12/07/2009	1 832.68	0.95	311 021.77	160.63	80.94
13/07/2009	1 832.68	0.95	312 854.45	161.58	81.42

VITALE FRANCESCO
 Via ...
 72013 ...
 Cod. ... C424J

DATA	IMPORTI PREVISTI				
	Parziale lire	Parziale euro	Progressivo lire	Progressivo euro	(%)
14/07/2009	1 832.68	0.95	314 687.13	162.52	81.89
15/07/2009	1 832.68	0.95	316 519.81	163.47	82.37
16/07/2009	1 832.68	0.95	318 352.48	164.42	82.85
17/07/2009	1 832.68	0.95	320 185.16	165.36	83.33
18/07/2009	1 832.68	0.95	322 017.84	166.31	83.80
19/07/2009	1 832.68	0.95	323 850.52	167.25	84.28
20/07/2009	1 832.68	0.95	325 683.20	168.20	84.76
21/07/2009	1 832.68	0.95	327 515.88	169.15	85.23
22/07/2009	1 832.68	0.95	329 348.56	170.09	85.71
23/07/2009	1 832.68	0.95	331 181.23	171.04	86.19
24/07/2009	1 832.68	0.95	333 013.91	171.99	86.66
25/07/2009	1 832.68	0.95	334 846.59	172.93	87.14
26/07/2009	1 832.68	0.95	336 679.27	173.88	87.62
27/07/2009	1 832.68	0.95	338 511.95	174.83	88.09
28/07/2009	1 832.68	0.95	340 344.63	175.77	88.57
29/07/2009	1 832.68	0.95	342 177.31	176.72	89.05
30/07/2009	1 832.68	0.95	344 009.98	177.67	89.53
31/07/2009	1 832.68	0.95	345 842.66	178.61	90.00
01/08/2009	1 832.68	0.95	347 675.34	179.56	90.48
02/08/2009	1 832.68	0.95	349 508.02	180.51	90.96
03/08/2009	194.91	0.10	349 702.93	180.61	91.01
04/08/2009	194.91	0.10	349 897.85	180.71	91.06
05/08/2009	194.91	0.10	350 092.76	180.81	91.11
06/08/2009	194.91	0.10	350 287.68	180.91	91.16
07/08/2009	194.91	0.10	350 482.59	181.01	91.21
08/08/2009	194.91	0.10	350 677.51	181.11	91.26
09/08/2009	194.91	0.10	350 872.42	181.21	91.31
10/08/2009	2 015.96	1.04	352 888.38	182.25	91.84
11/08/2009	2 015.96	1.04	354 904.34	183.29	92.36
12/08/2009	2 015.96	1.04	356 920.30	184.33	92.89
13/08/2009	2 015.96	1.04	358 936.26	185.38	93.41
14/08/2009	2 015.96	1.04	360 952.22	186.42	93.93
15/08/2009	2 015.96	1.04	362 968.18	187.46	94.46
16/08/2009	2 015.96	1.04	364 984.14	188.50	94.98
17/08/2009	2 015.96	1.04	367 000.10	189.54	95.51
18/08/2009	2 015.96	1.04	369 016.06	190.58	96.03
19/08/2009	2 015.96	1.04	371 032.02	191.62	96.56
20/08/2009	2 015.96	1.04	373 047.98	192.66	97.08
21/08/2009	2 015.96	1.04	375 063.94	193.70	97.61
22/08/2009	2 015.96	1.04	377 079.90	194.75	98.13
23/08/2009	2 015.96	1.04	379 095.86	195.79	98.66
24/08/2009	109.57	0.06	379 205.43	195.84	98.68
25/08/2009	109.57	0.06	379 315.00	195.90	98.71
26/08/2009	109.57	0.06	379 424.57	195.96	98.74
27/08/2009	109.57	0.06	379 534.15	196.01	98.77
28/08/2009	109.57	0.06	379 643.72	196.07	98.80
29/08/2009	109.57	0.06	379 753.29	196.13	98.83
30/08/2009	109.57	0.06	379 862.86	196.18	98.86
31/08/2009	140.31	0.07	380 003.17	196.26	98.89
01/09/2009	140.31	0.07	380 143.47	196.33	98.93
02/09/2009	140.31	0.07	380 283.78	196.40	98.97
03/09/2009	140.31	0.07	380 424.08	196.47	99.00
04/09/2009	140.31	0.07	380 564.39	196.55	99.04
05/09/2009	140.31	0.07	380 704.69	196.62	99.07
06/09/2009	140.31	0.07	380 845.00	196.69	99.11
07/09/2009	140.31	0.07	380 985.31	196.76	99.15
08/09/2009	140.31	0.07	381 125.61	196.83	99.18
09/09/2009	140.31	0.07	381 265.92	196.91	99.22
10/09/2009	140.31	0.07	381 406.22	196.98	99.26
11/09/2009	140.31	0.07	381 546.53	197.05	99.29
12/09/2009	140.31	0.07	381 686.83	197.12	99.33
13/09/2009	140.31	0.07	381 827.14	197.20	99.37
14/09/2009	59.62	0.03	381 886.76	197.23	99.38
15/09/2009	59.62	0.03	381 946.38	197.26	99.40
16/09/2009	59.62	0.03	382 006.00	197.29	99.41

VITALE FRANCESCO
Via S. ...
72013 ...
Cod. Fisc. ...
P. ...

VITALE FRANCESCO
72000
COL. FRODO BAGGINS

COMMITTENTE: I.A.C.P. Brindisi
TABELLA DATE ED IMPORTI

Istituto Autonomo Case Popolari

Provincia di Brindisi

RELAZIONE CRONOPROGRAMMA

OGGETTO: Lavori di recupero del patrimonio edilizio IACP nel Comune di San Donaci (Br) - lotti 2° e 3° - largo Stanca e via Sturdà.

COMMITTENTE: I.A.C.P. Brindisi

VITALE FRANCESCO
17/07/2008
07.1300748

Brindisi, 17/07/2008

Il Tecnico
(geom. Rocco CAFORIO)

Istituto Autonomo Case Popolari

Provincia di Brindisi

OGGETTO: Lavori di recupero del patrimonio edilizio IACP nel Comune di San Donaci (Br) - lotti 2° e 3° - largo Stanca e via Sturdà.

COMMITTENTE: I.A.C.P. Brindisi

RELAZIONE

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera h) dell'articolo 35 del D.P.R. 554/99 quale documento del progetto esecutivo da allegare al contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 110 dello stesso D.P.R. 554/99, è stato redatto ai sensi dell'art.42 del ripetuto D.P.R. 554/99.

VITALE FRANCESCO
720-3
Cod. Fisc. V.
P. IVA

Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati è risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari **365** giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attività, definita con riferimento ad una produttività di progetto ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonché della chiusura dei cantieri per festività.

Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni: Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

Tabella Climatico Ambientale:

condizione	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	media
Favorevole	90	90	90	90	90	90	90	45	90	90	90	45	82.5
Normale	15	15	75	90	90	90	90	45	90	90	75	15	65
Sfavorevole	15	15	45	90	90	90	90	45	90	75	45	15	58.75

Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sarà l'effettiva data d'inizio dei lavori, si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come percentuale media di riduzione sulle attività lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento temporale analogo di ogni attività, indipendentemente dalla successione temporale.

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si è a conoscenza della data d'inizio dei lavori, l'impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, che nell'arco dell'anno avrà diversi tipi di incidenza sulla produttività che potranno essere di diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto.

Produzione mensile

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che l'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione mensile media tale da poter realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di lire 28'928.11 euro 14.94 ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di lire 37'626.74 euro 19.43.

L'impresa che dovrà eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovrà stilare prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato cronoprogramma.

Brindisi, 24/07/2008

Il Tecnico
(geom. Rocco CAFORIO)

VITALE FRANCESCO

DESCRIZIONE	VALORE
Tipologia Documento Comune Provincia Oggetto Committente Tecnico Impresa Luogo Data Importo per l'emissione dei SAL	Cronoprogramma Istituto Autonomo Case Popolari Provincia di Brindisi Lavori di recupero del patrimonio edilizio IACP nel Comune di San Donaci (Br) - lotti 2° e 3° - largo Stanca e via Sturdà. I.A.C.P. Brindisi geom. Rocco CAFORIO Brindisi 17/07/2008 40'000.00

VITALE FRANCESCO
Via
72013 (BR)
Cod CA24J
... .. 060748

